
Université de Reims Champagne-Ardenne

IUT Reims | Châlons Charleville — Institut Universitaire de Technologie



Buddy System

# COMPTE RENDU D'AVANCEMENT DU PROJET DE SITE WEB BUDDY SYSTEM


**AUTEURS :**

MATTEO GODART
AYOUB SEGHIR
SACHA DEUTSCHE
IYED BOUZENADA
YACINE MOUNSI


NOVEMBRE 2025

# Compte Rendu du Projet Buddy System

—

# Organisation SCRUM et Déroulement des 5 Sprints

**Projet Buddy System — Université de Reims Champagne-Ardenne**

**Membres de l'équipe :**
Ayoub SEGHIR  Iyed BOUZENADA  Matteo GODART
Yacine MOUNSI  Sacha DEUTSCHE

**Date :** Novembre 2025

## Table des matières

**Introduction** **3**

**Sprint 1 : Gestion du compte utilisateur** **4**

**Sprint 2 : Relations entre utilisateurs** **22**

**Sprint 3 : Messagerie et signalement** **36**

**Sprint 4 : Événements et participations** **51**

**Sprint 5 : Administration & rôles avancés** **66**

**Bilan général du projet** **78**

**Annexes** **80**

# Introduction

Le projet *Buddy System* a pour objectif de faciliter la mise en relation **entre étudiants internationaux et étudiants locaux** au sein de l'université.

Le diagramme des cas d'utilisation ci-dessous présente l'ensemble des fonctionnalités principales du système et sert de base à la structuration des différents sprints du projet.

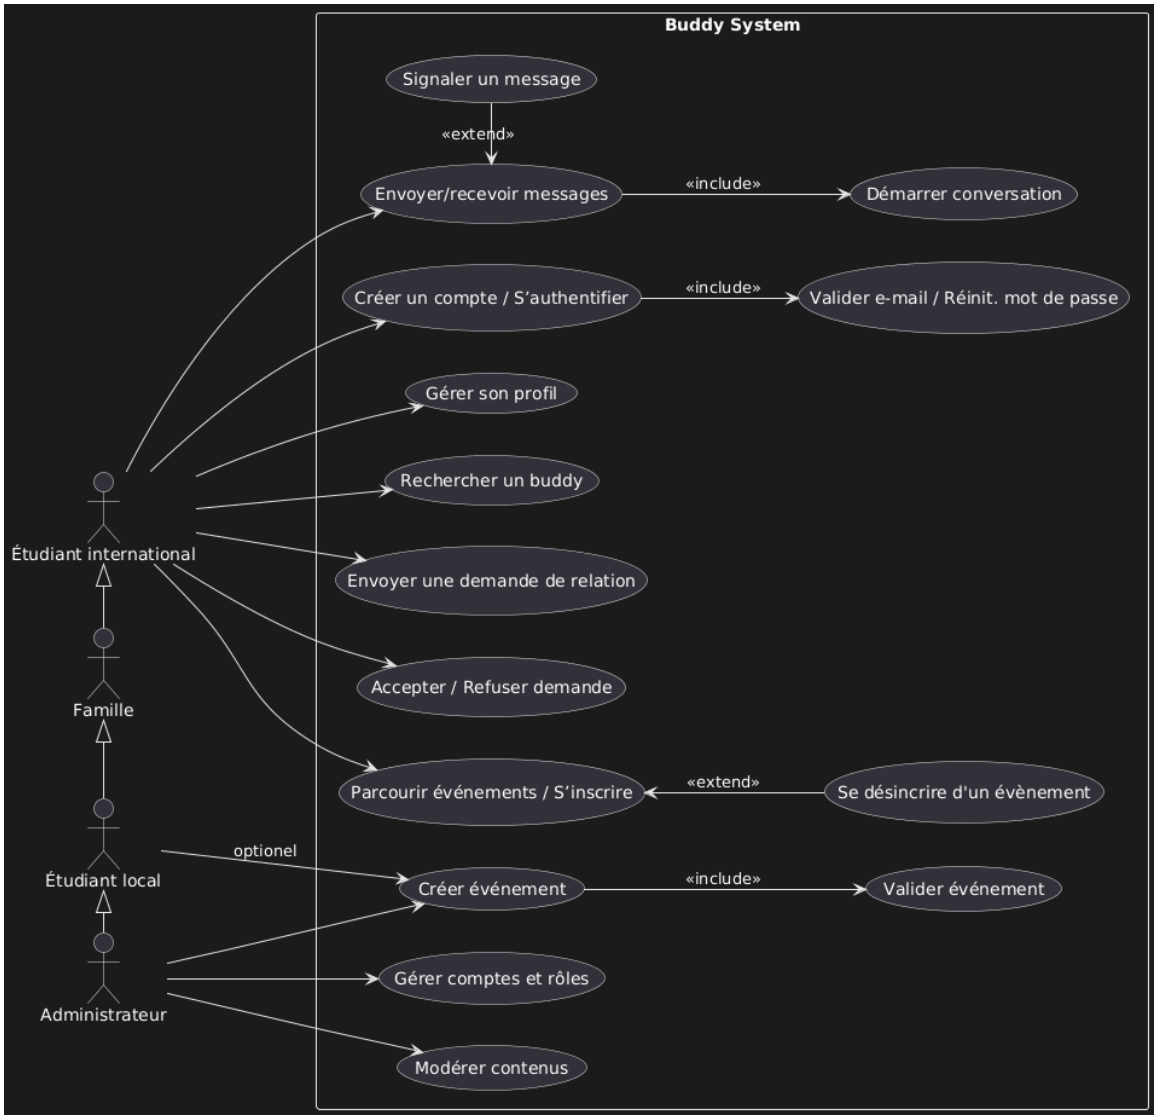



Diagramme de cas d'utilisation

Avant le démarrage des développements, l'équipe a mis en place les outils de collaboration suivant :

— un dépôt Git centralisé pour versionner le code et faciliter l'intégration continue ;

— un serveur Discord dédié pour assurer la communication et le partage rapide de ressources ;

Ces outils ont permis une bonne coordination dès le lancement du premier sprint.


# Sprint 1 : Gestion du compte utilisateur

## Objectif

Ce sprint avait pour objectif d'implémenter les fonctionnalités essentielles liées aux cas d'utilisation *Se connecter*, *Créer un compte* et *Gérer son profil*, en posant les bases techniques du système (modélisation des données et premières IHM).

## Planification

La planification du Sprint 1 a été réalisée dans *MS Planner* à travers un ensemble de tâches structurées selon les activités principales du sprint, comme illustré dans la capture ci-dessous.

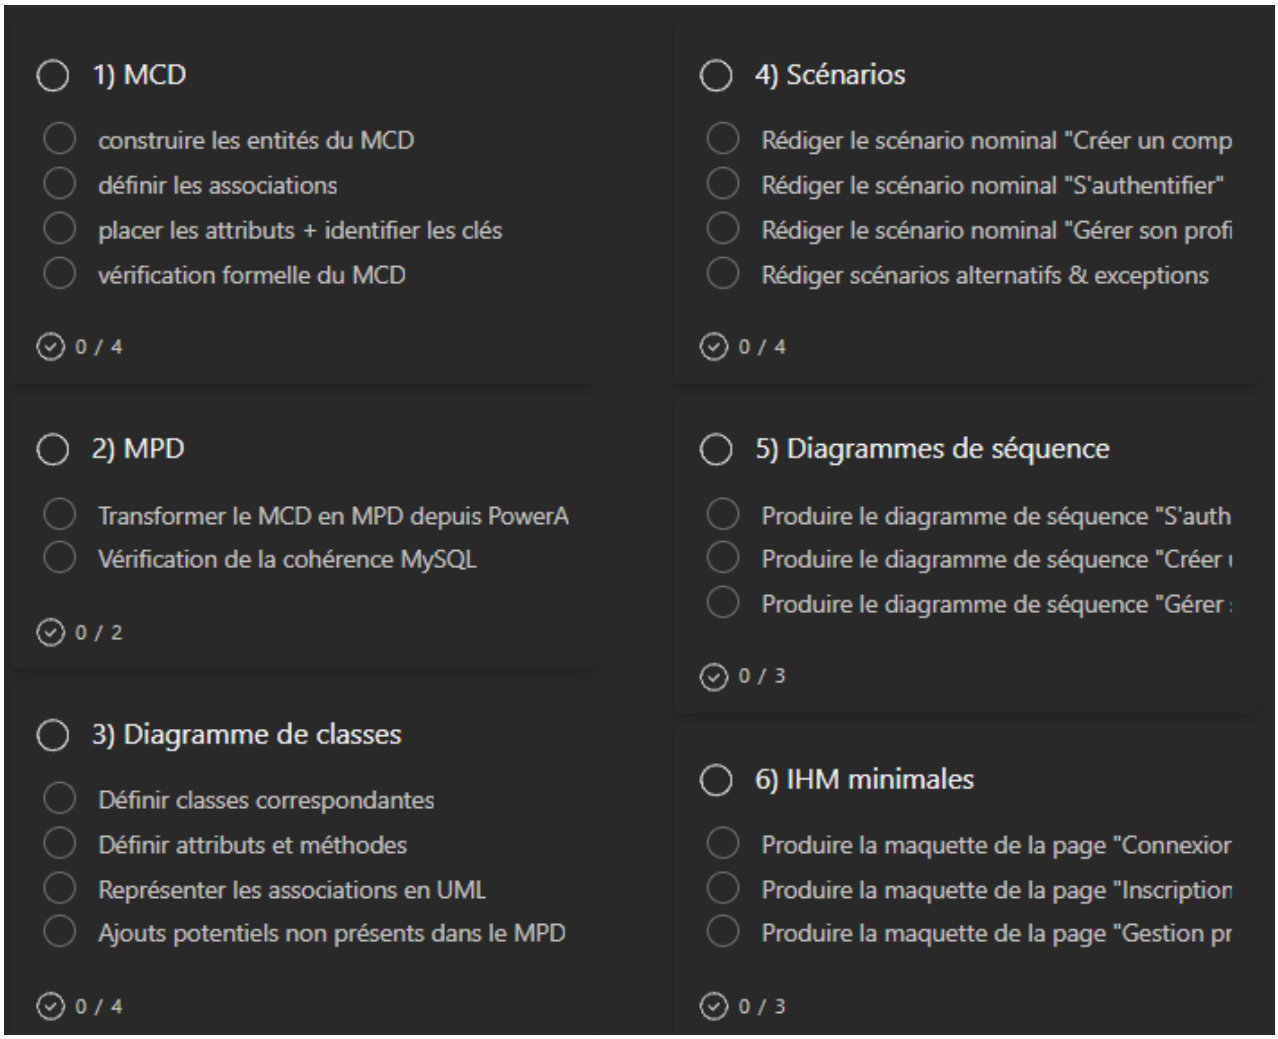


Planification initiale des tâches du Sprint 1 dans MS Planner.

## Mêlée 1

La première mêlée s'est tenue juste après la planification afin de lancer le Sprint 1 dans de bonnes conditions. L'objectif était d'attribuer clairement les tâches aux membres de l'équipe, de valider l'ordre de réalisation et de s'assurer que chacun dispose d'une première action concrète pour la journée suivante.

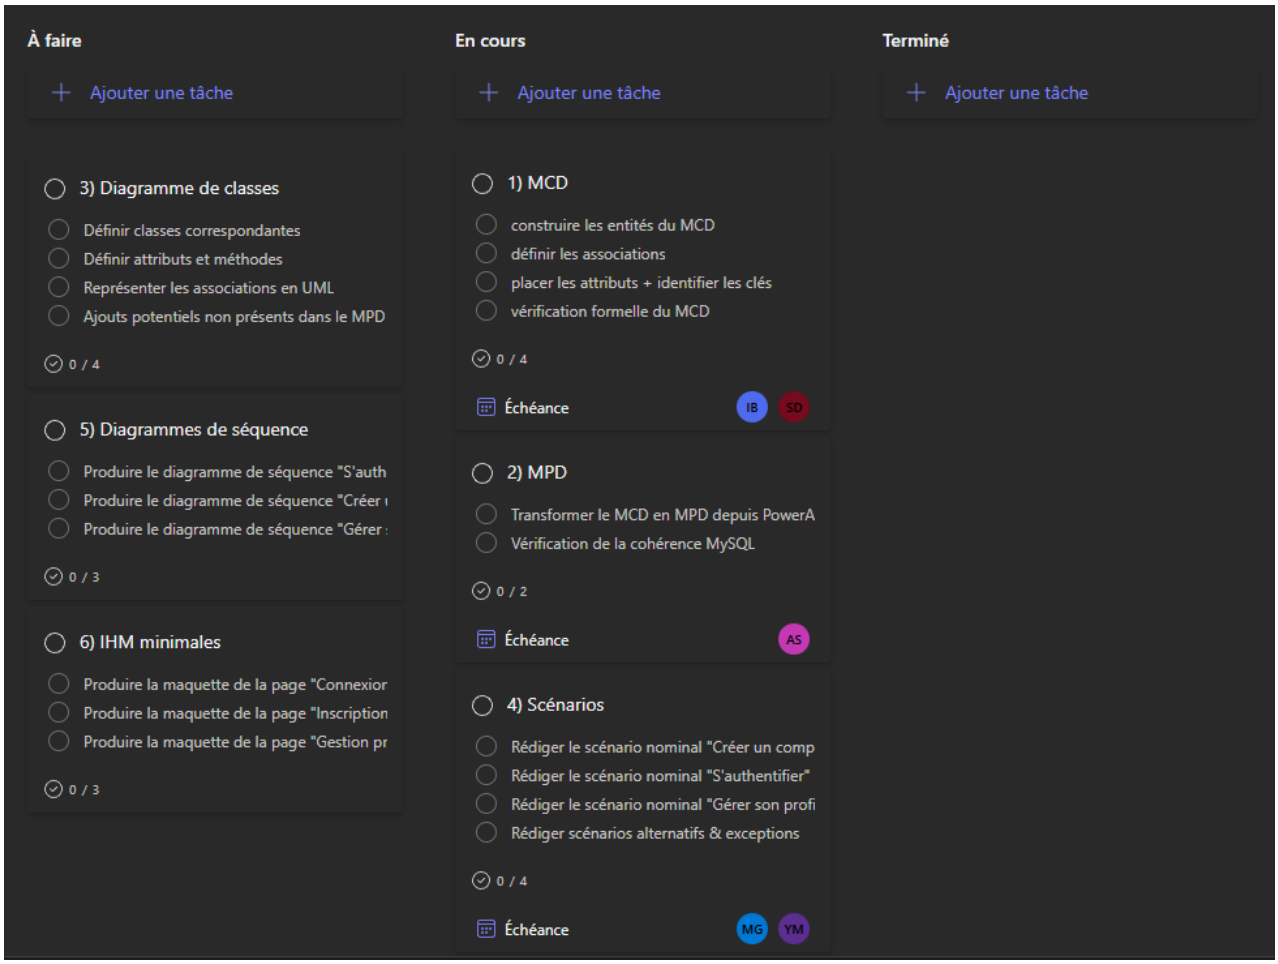



**Figure 1** – État du tableau Kanban après la mêlée 1

## Mêlée 2

Cette seconde mêlée a permis de faire un point d'avancement sur les tâches du Sprint 1 et d'ajuster la répartition du travail en fonction des éléments déjà réalisés.

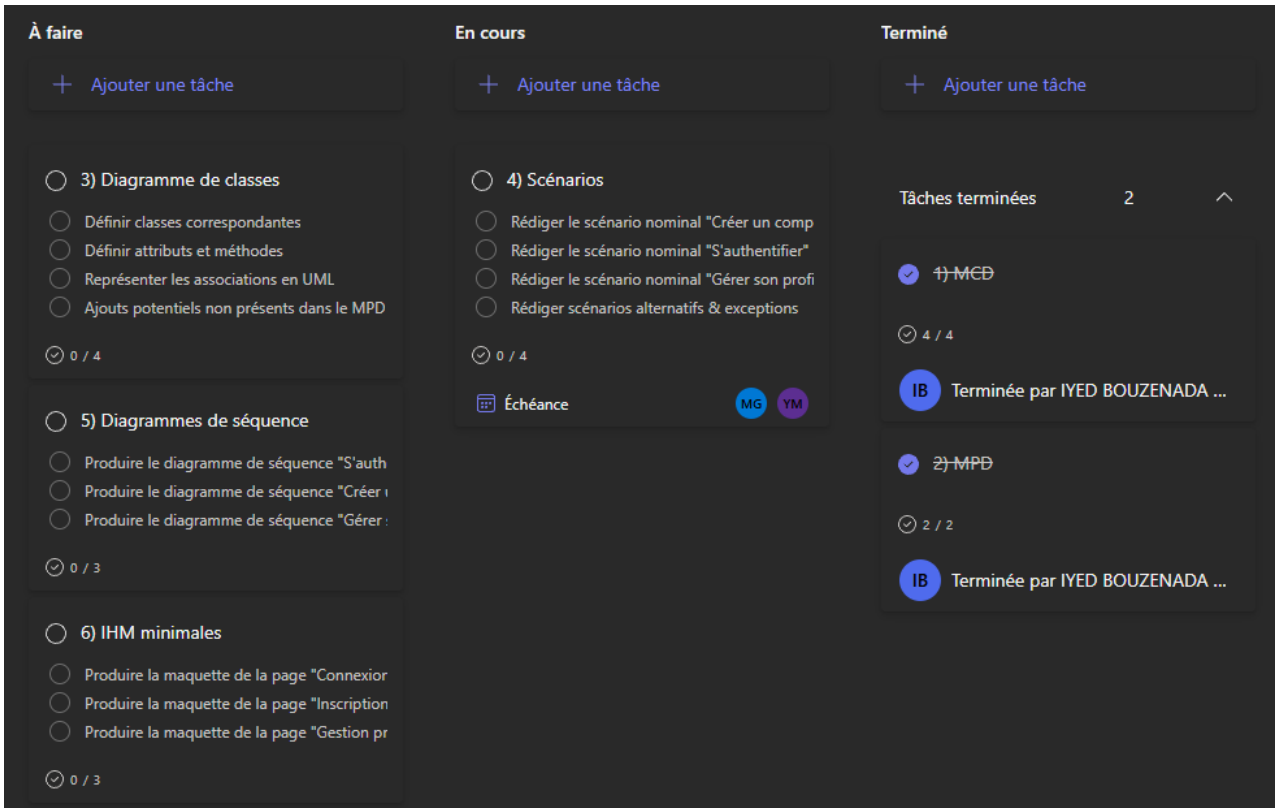



**Figure 2** – État du tableau Kanban avant la mêlée 2

Pour ce qui est des scénarios, ils ont déjà été bien amorcés, mais leur finalisation nécessite la production du diagramme de classes.

**Livrables complétés au moment de cette deuxième mêlée :**

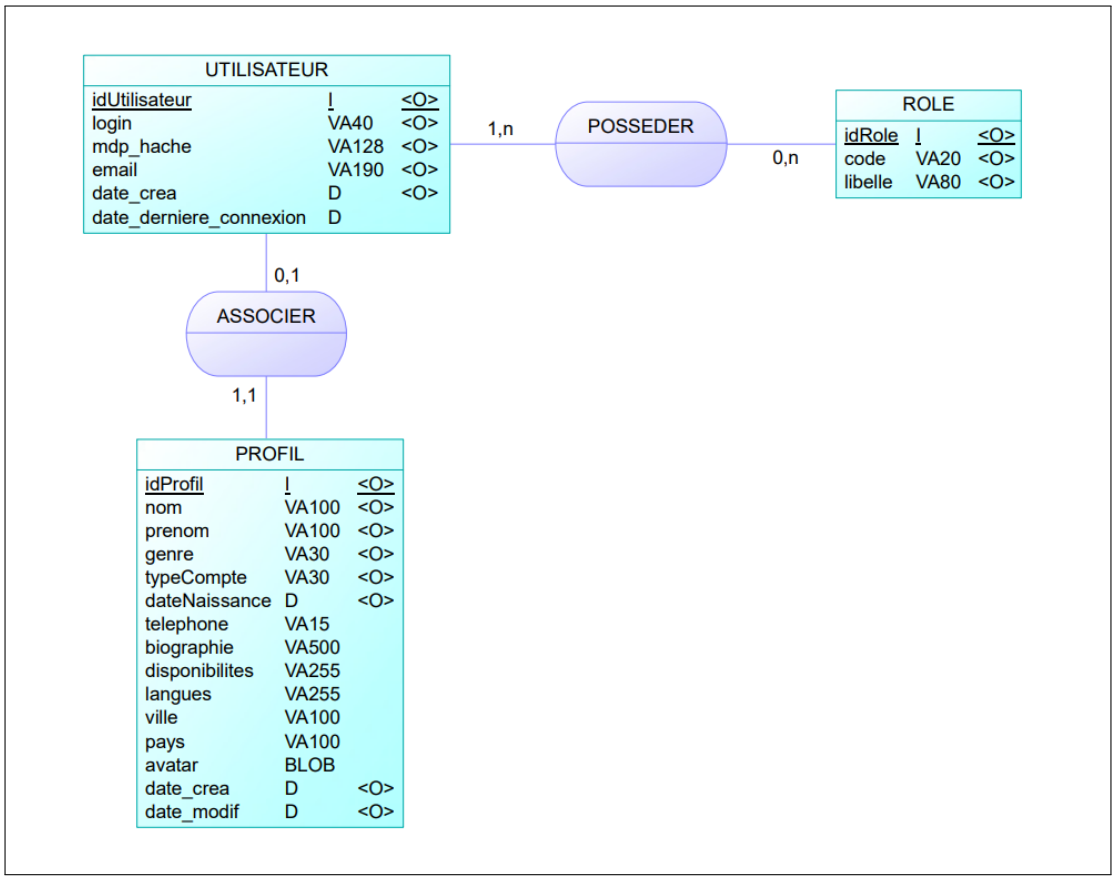



**Figure 3** – Première version du MCD.

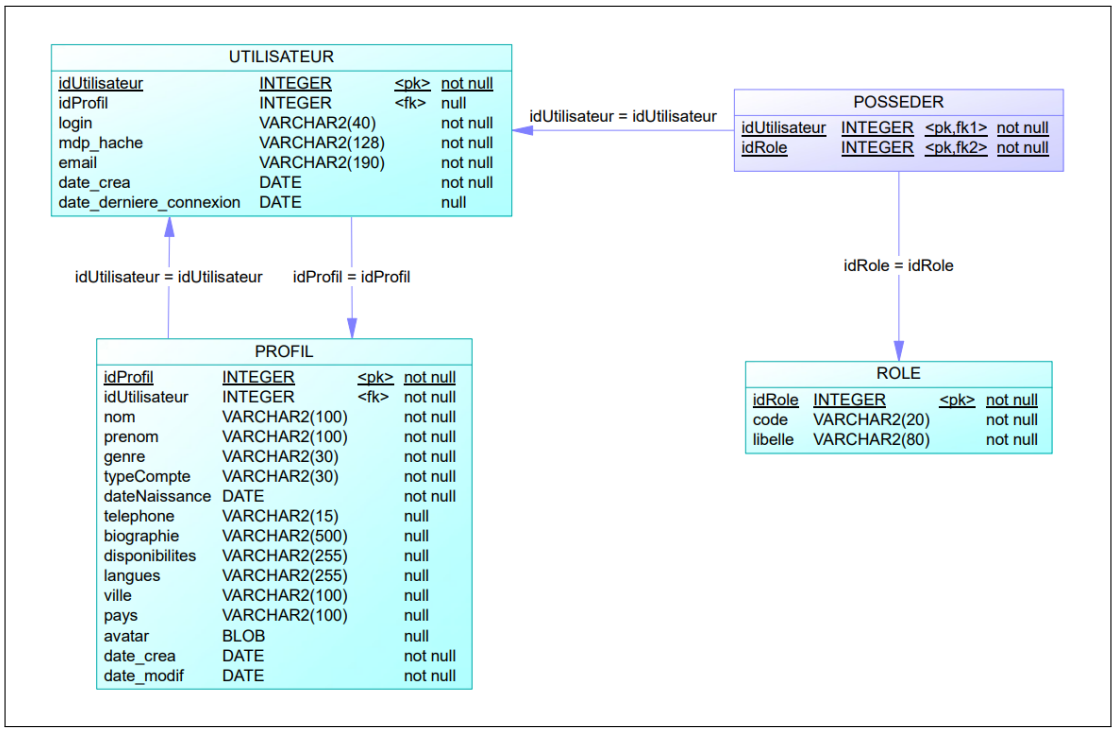



**Figure 4** – Première version du MPD.

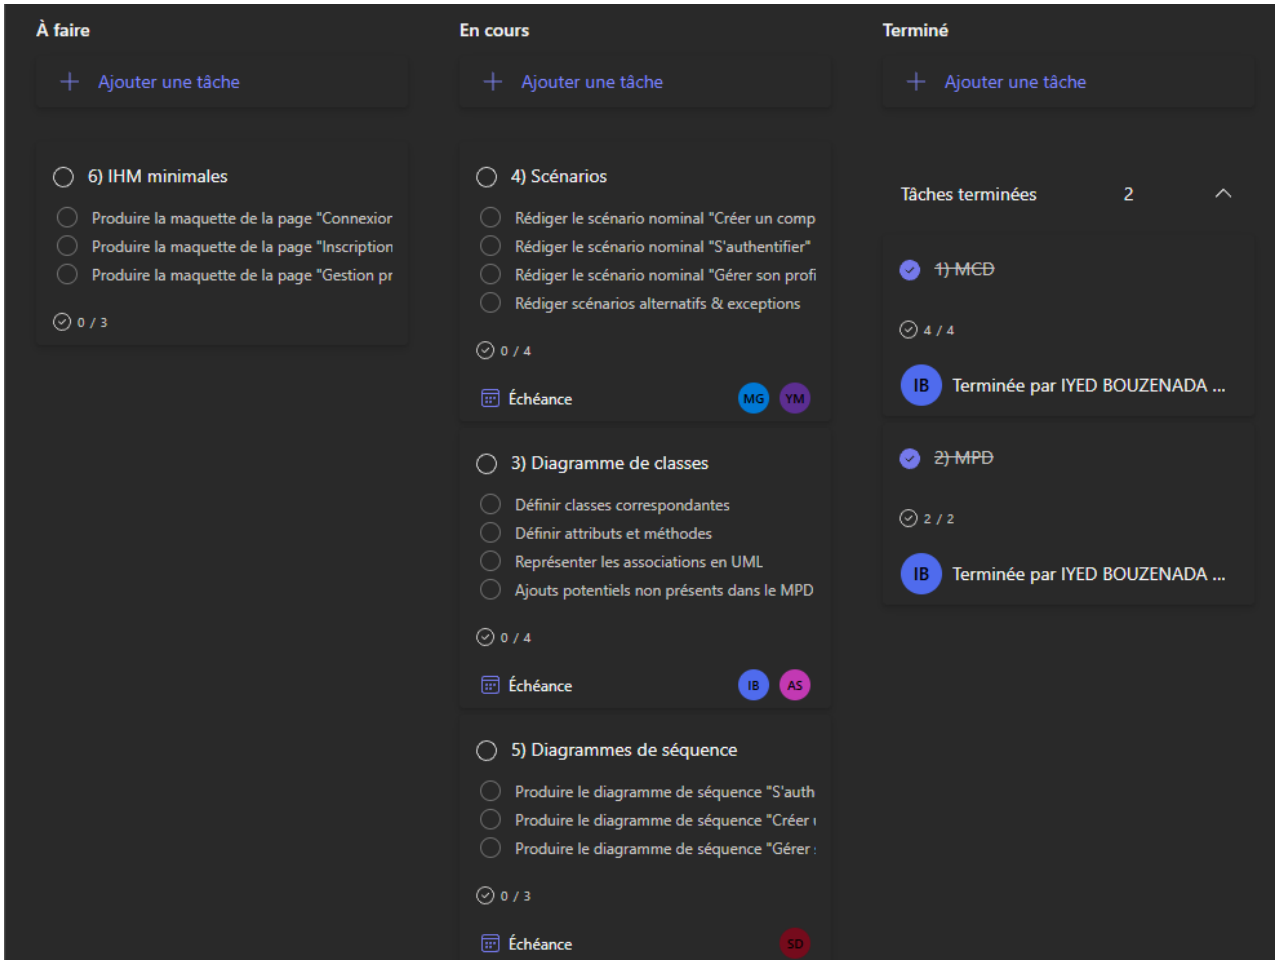



**Figure 5** – État du tableau Kanban après la mêlée 2

## Mêlée 3

Cette troisième mêlée a permis de faire un nouveau point d'avancement sur le Sprint 1 et de vérifier la cohérence entre les tâches terminées et celles encore en cours.

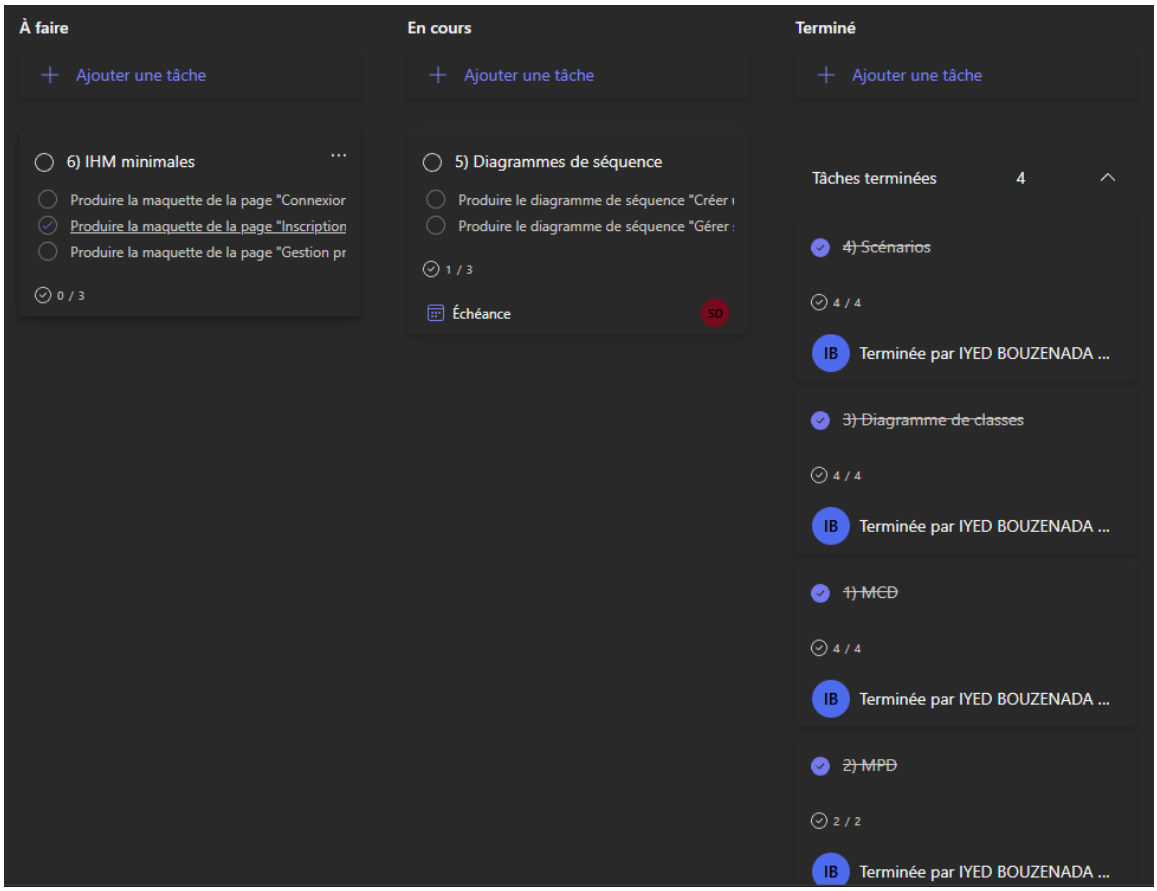



**Figure 6** – État du tableau Kanban avant la mêlée 3

Concernant les diagrammes de séquence, seul le premier ("S'authentifier") a été finalisé pour le moment ; les deux autres sont encore en attente.

**Livrables complétés au moment de cette troisième mêlée :**

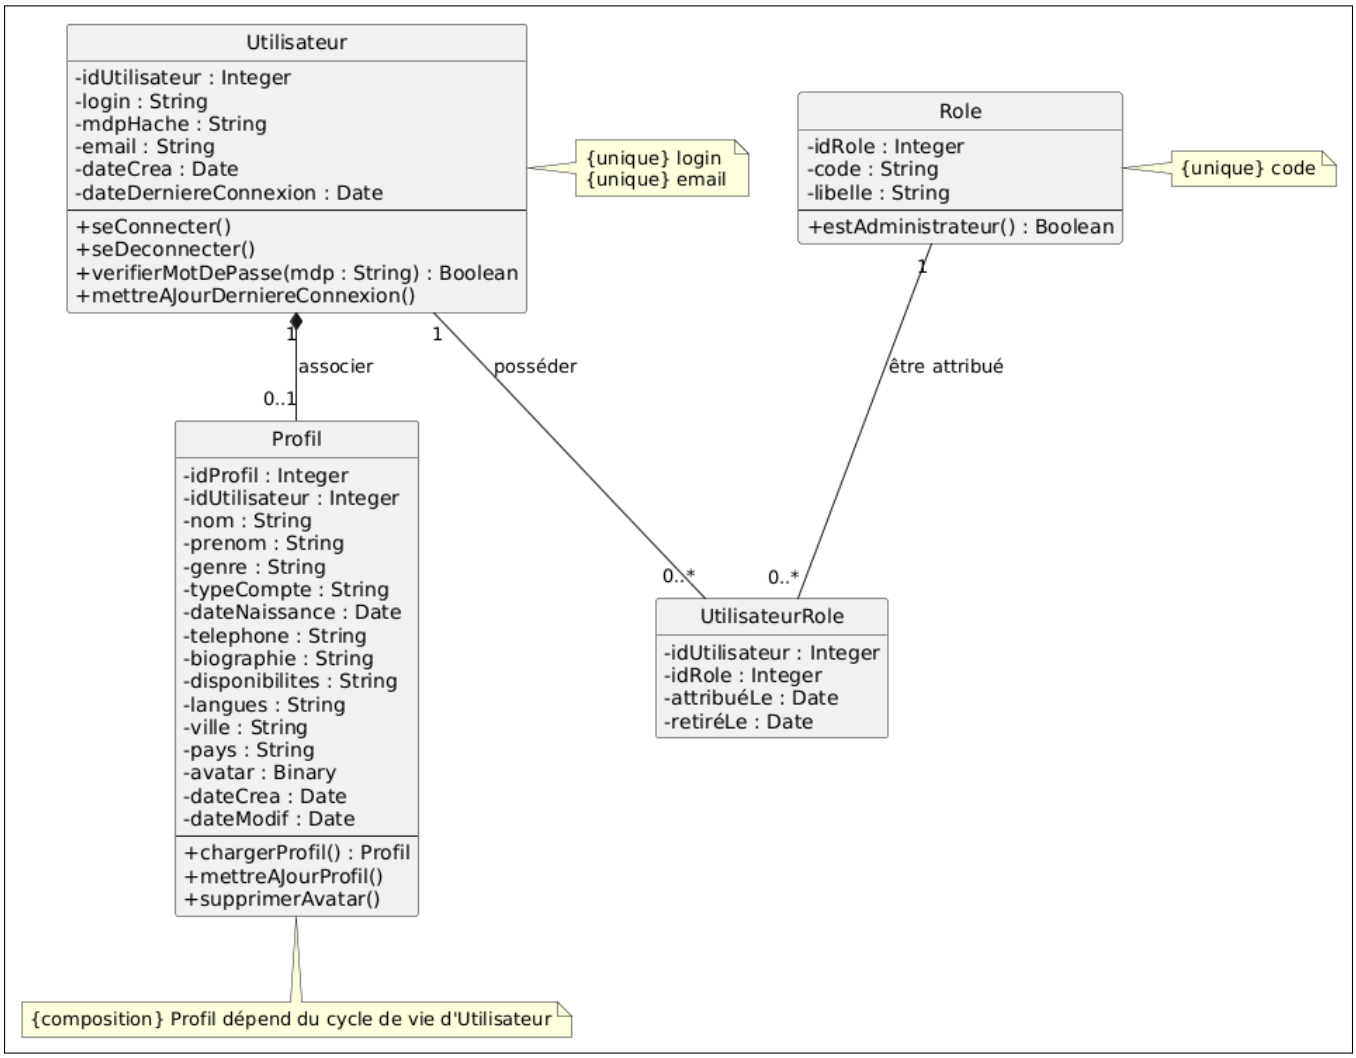



**Figure 7** – Diagramme de classes

**Table 1** – Scénario nominal — *S'authentifier*

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre la page de connexion. |
| 2 | Il saisit son identifiant (login ou e-mail) et son mot de passe. |
| 3 | Il clique sur « Se connecter ». |
| 4 | Le système recherche un compte utilisateur correspondant. |
| 5 | Le système demande au compte trouvé de **verifierMotDePasse**(mdp). |
| 6 | Si la vérification est conforme, la session utilisateur est créée. |
| 7 | Le système appelle **mettreAJourDerniereConnexion**() sur le compte. |
| 8 | Le système affiche « Connexion réussie » et redirige l'utilisateur vers son tableau de bord. |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — *S'authentifier*

| Étape | Action |
|---|---|
| 5a | Aucun compte ne correspond : le système affiche « Identifiants incorrects ». |
| 6a | **verifierMotDePasse**(mdp) renvoie faux : le système affiche « Identifiants incorrects ». |
| 7a | Aucune session n'est créée ; l'utilisateur reste sur la page de connexion. |

**Table 3** – Scénario d'exception — *S'authentifier*

| Étape | Action |
|---|---|
| 4a | Les données sont temporairement indisponibles : le système affiche « Erreur serveur, veuillez réessayer plus tard ». |

**Figure 8** – Scénarios — *S'authentifier*

**Table 1** – Scénario nominal — *Créer un compte*

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre la page d'inscription. |
| 2 | Il saisit les informations requises (login, e-mail, mot de passe, prénom/nom, etc.). |
| 3 | Il clique sur « Créer mon compte ». |
| 4 | Le système vérifie que le **login** et l'**e-mail** ne sont pas déjà utilisés. |
| 5 | Le système enregistre un **compte Utilisateur** avec un mot de passe sécurisé. |
| 6 | Le système crée le **Profil** associé au compte (informations minimales) et initialise les dates. |
| 7 | Le système attribue le rôle par défaut au compte (via la relation *UtilisateurRole*). |
| 8 | Le système confirme la création et redirige l'utilisateur vers la page de connexion. |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — *Créer un compte*

| Étape | Action |
|---|---|
| 4a | Le **login** est déjà utilisé : le système affiche « Login indisponible ». |
| 4b | L'**e-mail** est déjà utilisé : le système affiche « E-mail déjà associé à un compte ». |
| 4c | Des champs obligatoires sont manquants ou invalides : le système affiche les erreurs. |

**Table 3** – Scénario d'exception — *Créer un compte*

| Étape | Action |
|---|---|
| 5e | Les données sont temporairement indisponibles : le système affiche « Erreur serveur, veuillez réessayer plus tard ». |

**Figure 9** – Scénarios — *Créer un compte*

**Table 1** – Scénario nominal — *Gérer son profil*

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre la page « Mon profil ». |
| 2 | Le système charge les informations actuelles du profil **(chargerProfil() )**. |
| 3 | L'utilisateur modifie les champs souhaités (nom, prénom, téléphone, biographie, disponibilités, langues, ville, pays), et éventuellement un nouvel avatar. |
| 4 | L'utilisateur clique sur « Enregistrer ». |
| 5 | Le système vérifie la présence et la validité des champs obligatoires. |
| 6 | Si un nouvel avatar est fourni, le système supprime l'ancien avatar **(supprimerAvatar() )** puis enregistre le nouvel avatar. |
| 7 | Le système met à jour le profil **(mettreAJourProfil() )** avec les nouvelles valeurs. |
| 8 | Le système confirme la mise à jour et affiche le profil actualisé. |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — *Gérer son profil*

| Étape | Action |
|---|---|
| 5a | Des champs obligatoires sont manquants ou invalides : le système affiche « Formulaire invalide ». |
| 6a | L'avatar fourni est trop volumineux ou non autorisé : le système affiche « Avatar invalide » et conserve l'ancien avatar. |
| 6b | Aucun nouvel avatar n'est fourni : le système conserve l'avatar existant. |
| 7a | Aucune modification détectée : le système affiche « Aucun changement enregistré ». |

**Table 3** – Scénario d'exception — *Gérer son profil*

| Étape | Action |
|---|---|
| 2a | Les données sont temporairement indisponibles : le système affiche « Erreur serveur, veuillez réessayer plus tard ». |

**Figure 10** – Scénarios — *Gérer son profil*

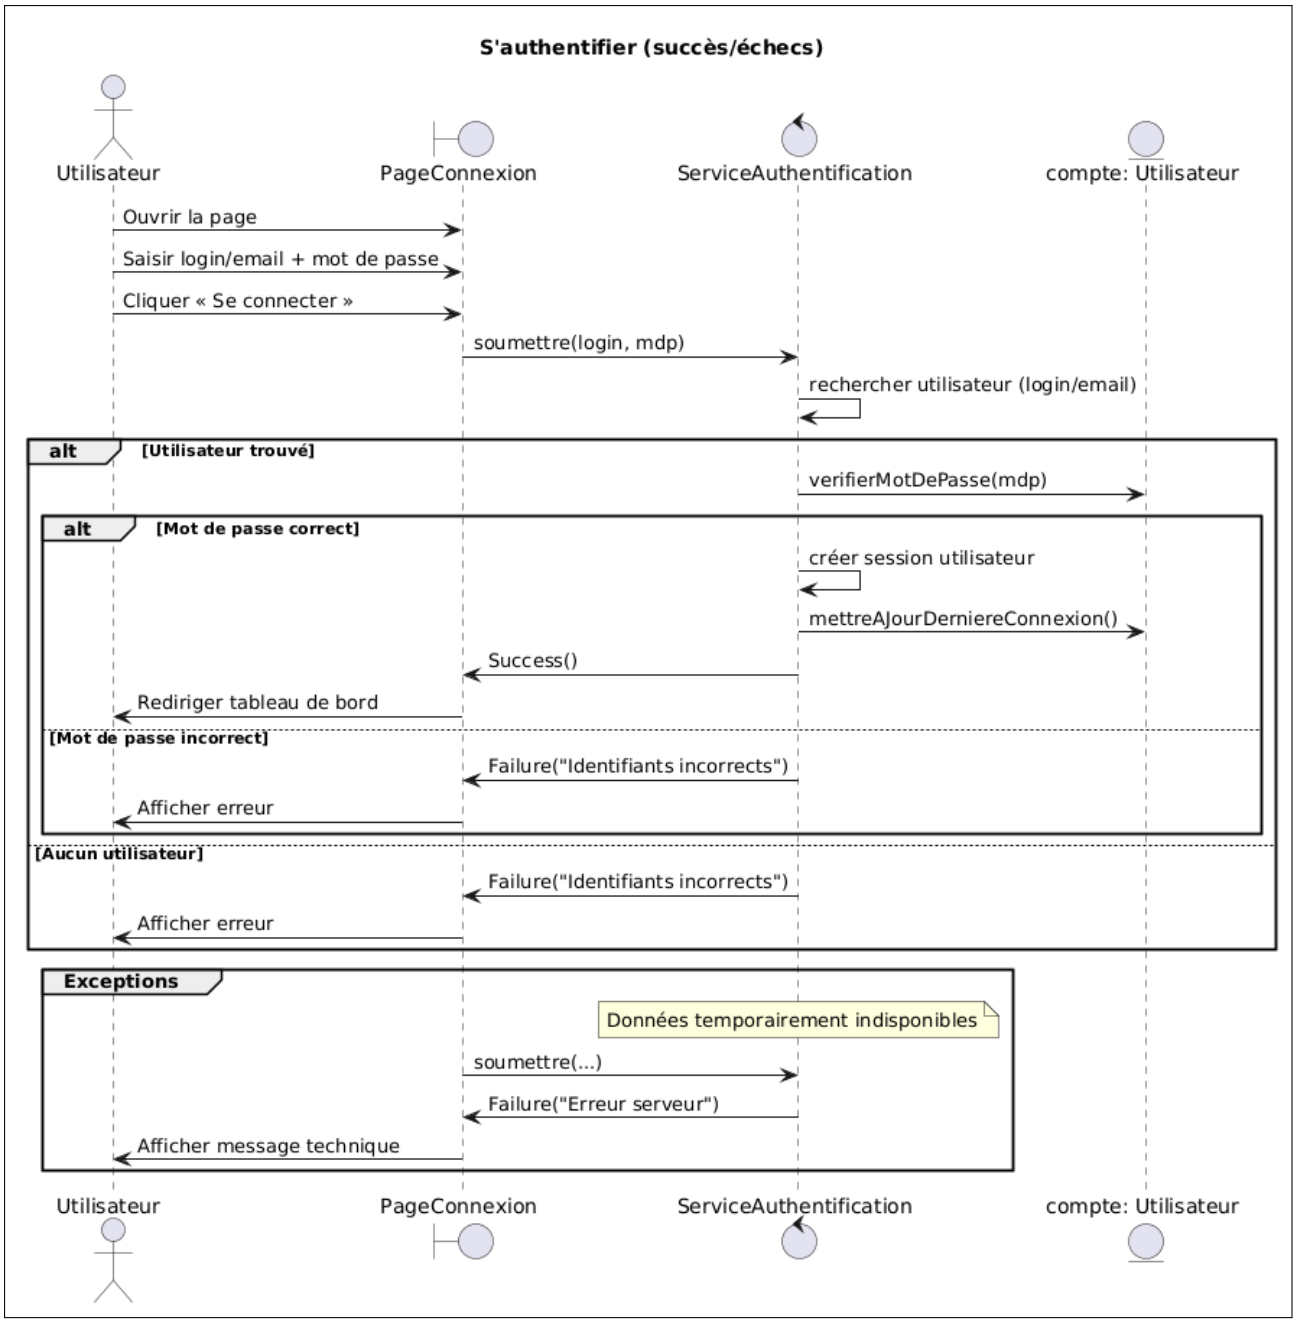



**Figure 11** – Diagramme de Séquence — *S'authentifier*

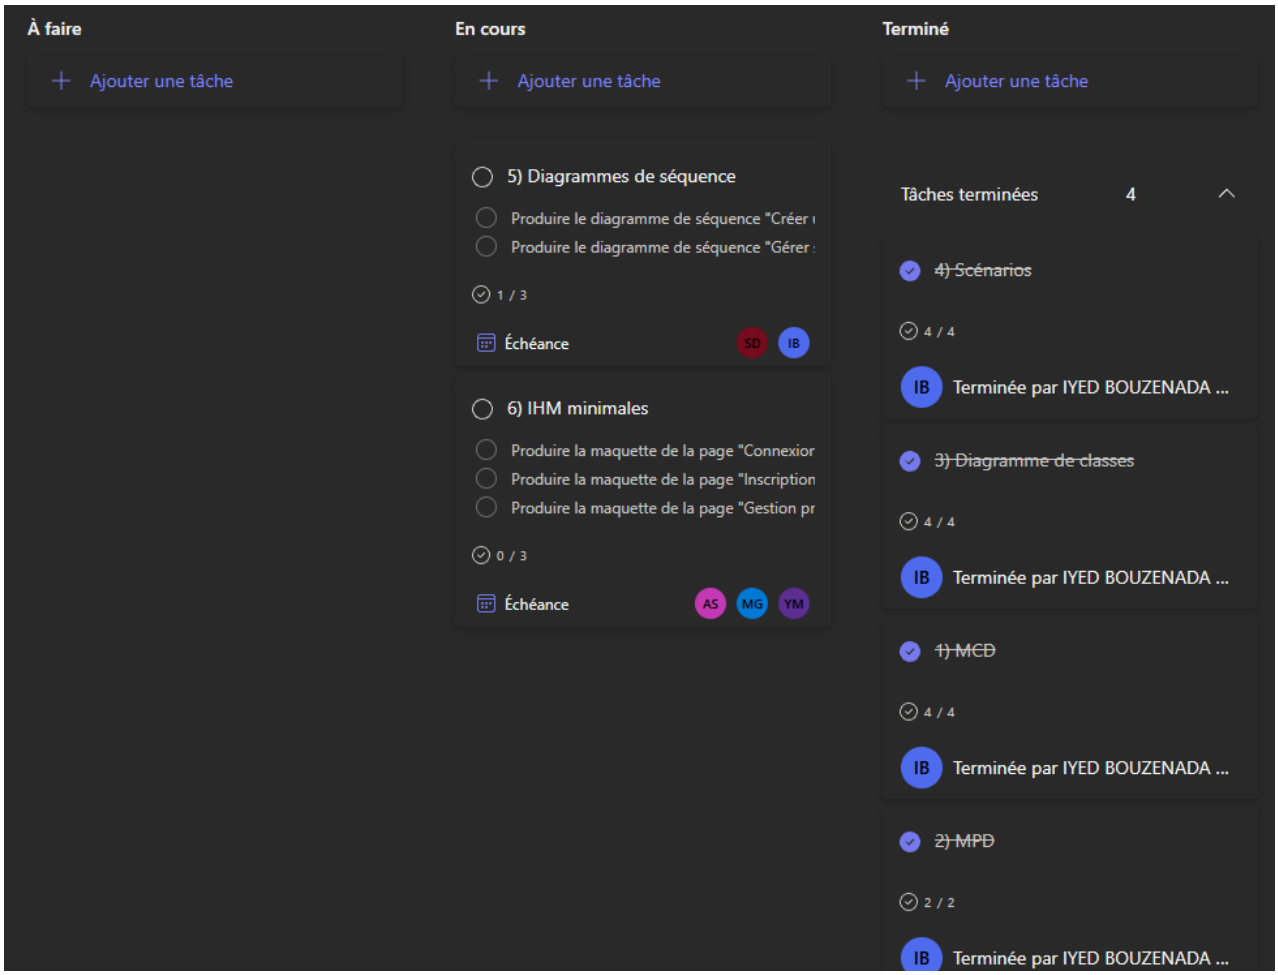



**Figure 12** – État du tableau Kanban après la mêlée 3

La charge de travail a été réorganisée de façon à ce que chaque sous-tâche soit attribuée clairement à un membre de l'équipe.

## Mêlée 4

À ce stade, l'ensemble des tâches du Sprint 1 apparaît comme complété, et tous les livrables prévus ont été produits.

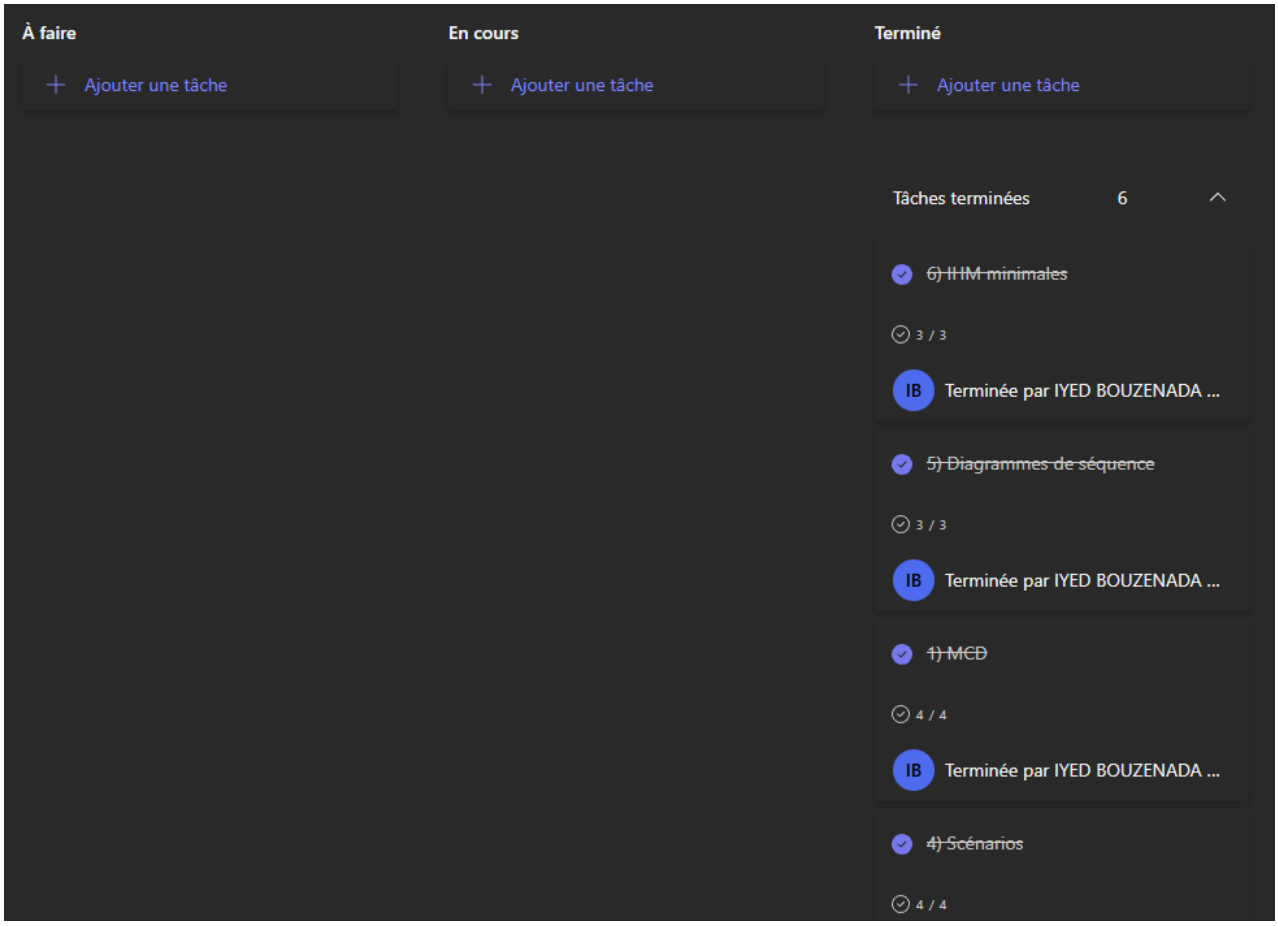



**Figure 13** – État du tableau Kanban avant la mêlée 4

**Livrables complétés au moment de cette quatrième mêlée :**

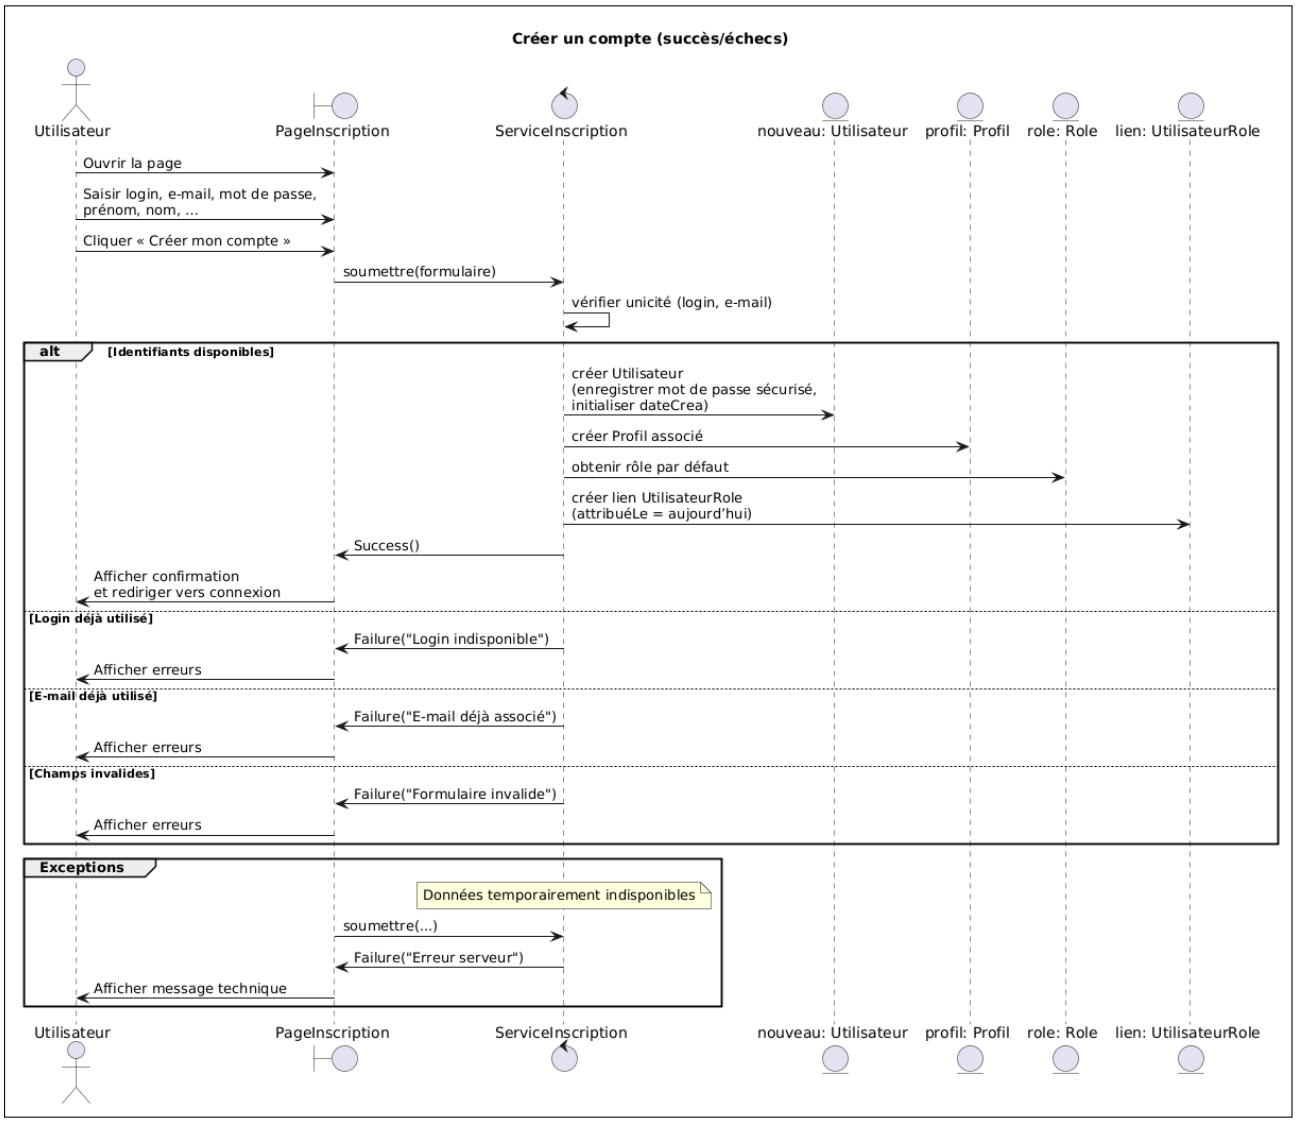



**Figure 14** – Diagramme de Séquence — *Créer un compte*

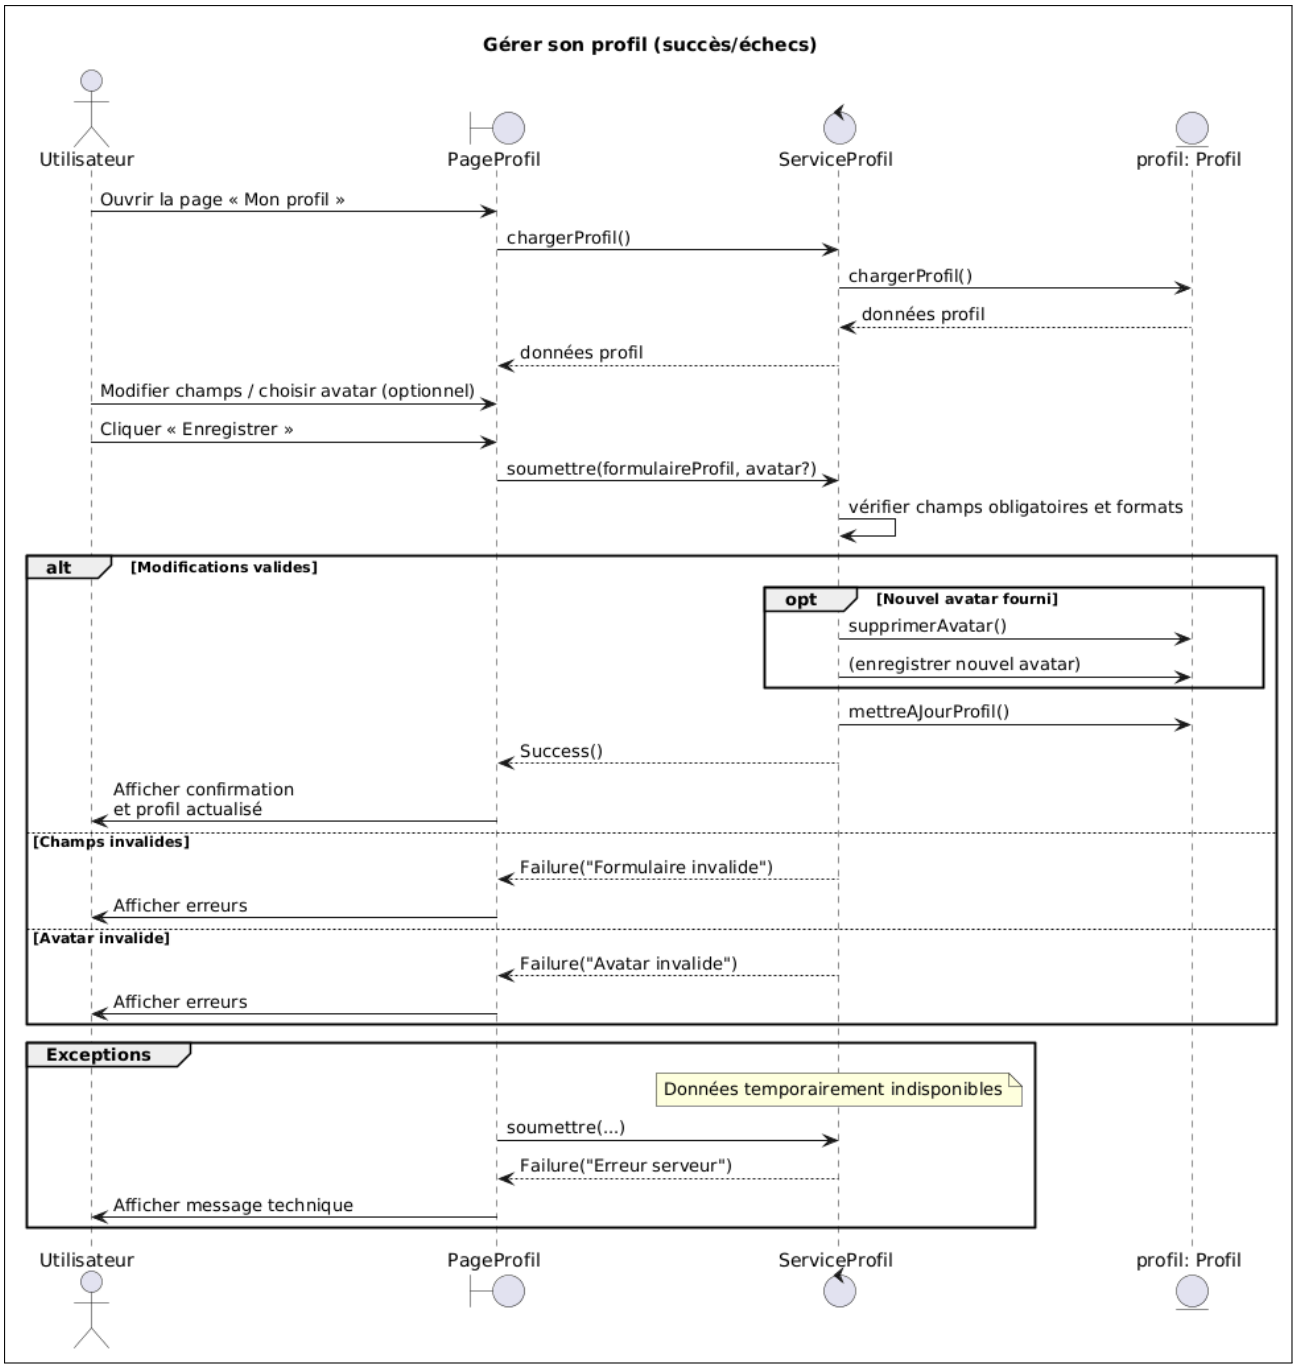



**Figure 15** – Diagramme de Séquence — *Gérer son profil*

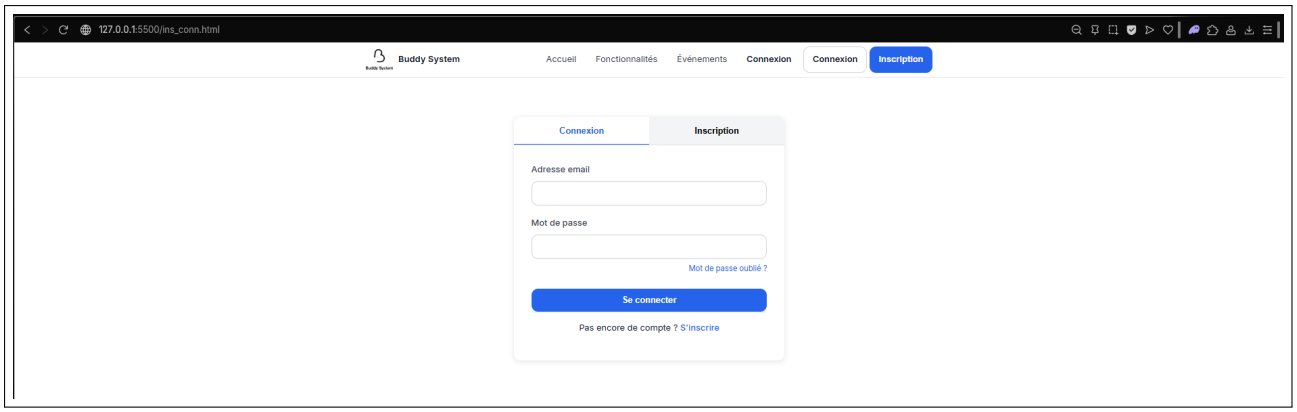



**Figure 16** – Maquette — *Page Connexion*

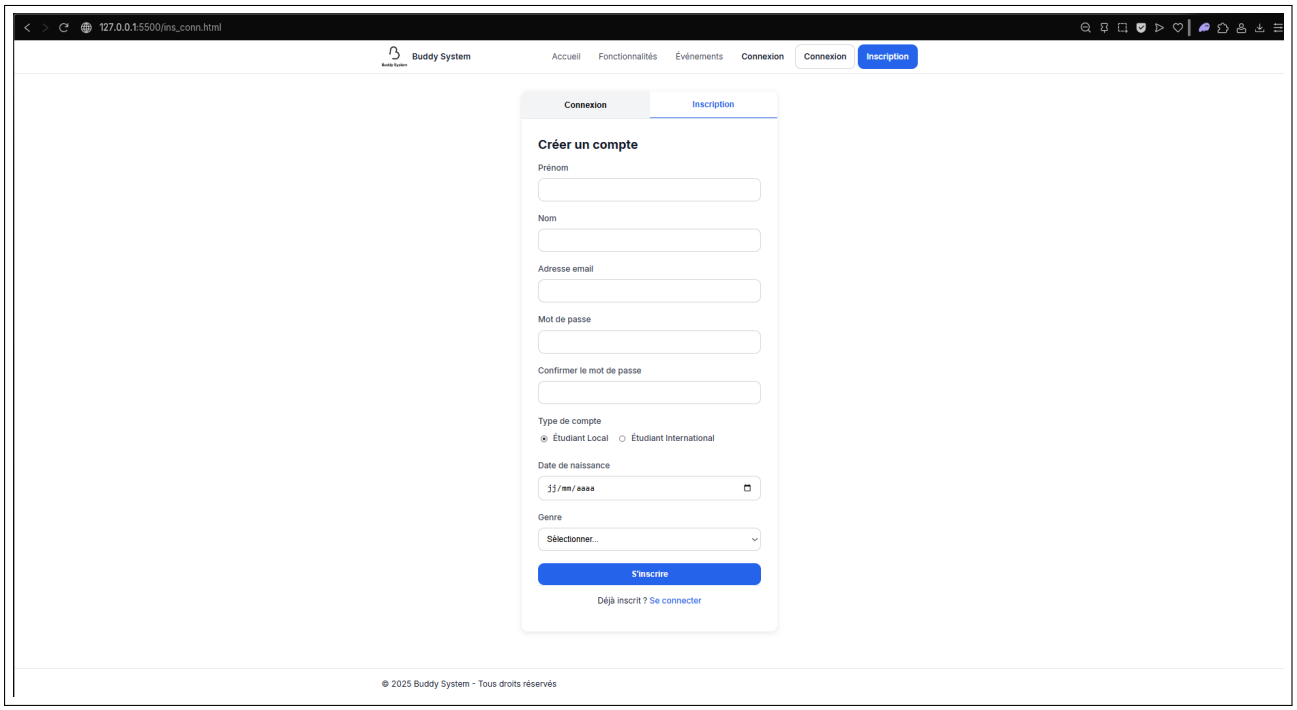



**Figure 17** – Maquette — *Page Inscription*

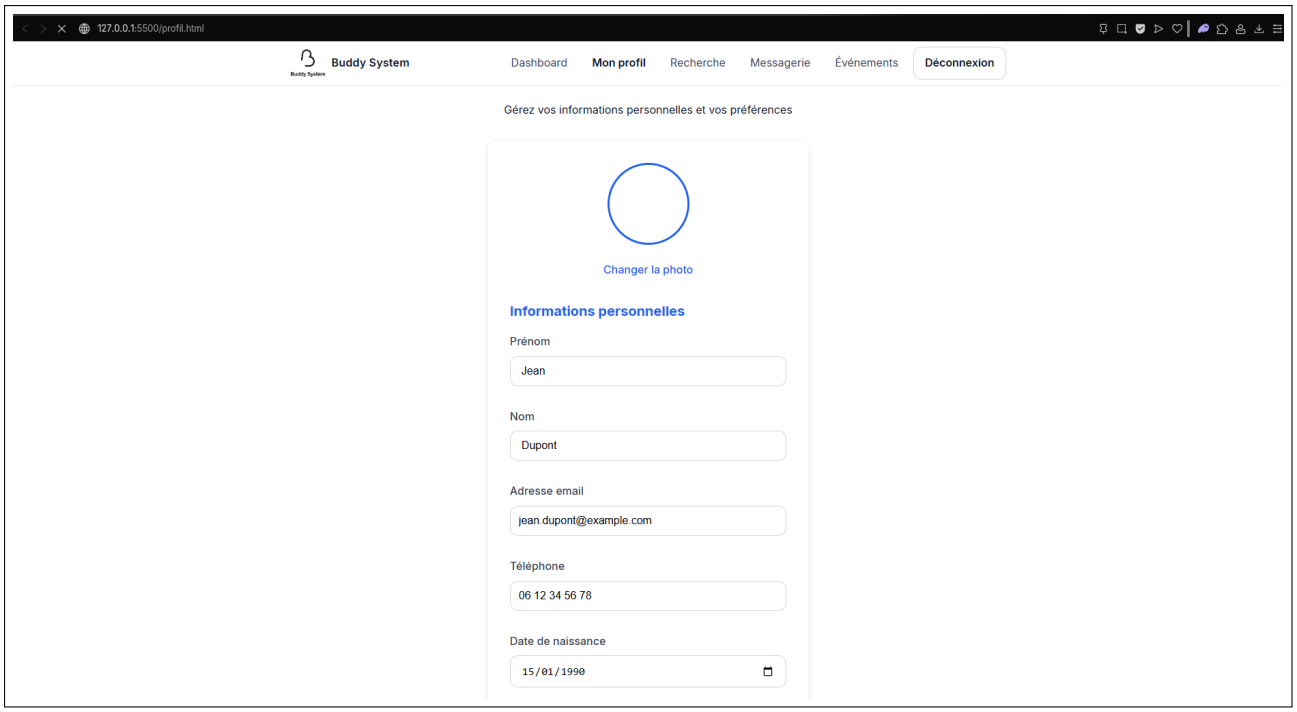



**Figure 18** – Maquette — *Page Profil (vue 1)*

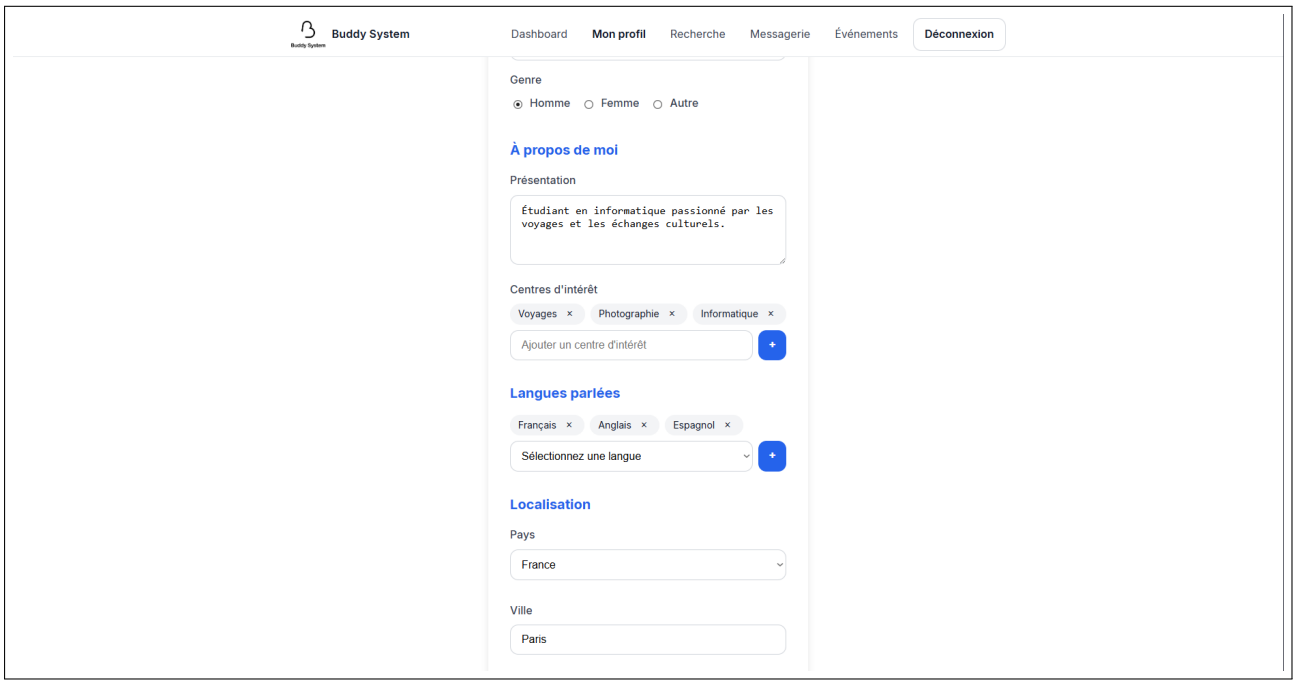



**Figure 19** – Maquette — *Page Profil (vue 2)*

## Bilan du Sprint 1

**Synthèse :** Ce premier sprint a permis d'établir les fondations de la modélisation du Buddy System. L'équipe s'est concentrée sur l'analyse du périmètre « gestion du compte utilisateur » et la production des premiers modèles nécessaires aux itérations suivantes.

**Livrables produits :**

- MCD v1 (Utilisateur, Profil, Rôle) et MPD associé.
- Diagramme de classes v1 pour la gestion des comptes.
- Scénarios complets : *Créer un compte*, *S'authentifier*, *Gérer son profil*.
- Diagrammes de séquence associés aux trois cas d'utilisation.
- Maquettes IHM minimales : Connexion, Inscription, Profil.
- Organisation initiale du tableau MS Planner (planification + mêlées).

**Points à préciser ultérieurement :**

- Ajustements possibles des IHM minimales pour une meilleure cohérence.
- Certains diagrammes de séquence pourront être raffinés en fonction des évolutions du modèle.

**Décision pour la suite :** Le Sprint 2 portera sur la modélisation des relations entre utilisateurs (recherche, demande, acceptation), ce qui servira de base à la messagerie et à l'évolution globale du système.


# Sprint 2 : Relations entre utilisateurs

## Objectif

Ce sprint avait pour objectif de modéliser l'ensemble des mécanismes liés à la mise en relation entre utilisateurs, en traitant les cas d'utilisation *Rechercher un buddy*, *Envoyer une demande de relation* et *Accepter / Refuser une demande*. Il s'agissait d'étendre le MCD initial, de définir la structure des relations (utilisateur envoyeur / receveur), et de produire les scénarios, séquences et maquettes nécessaires.

## Planification

La planification du Sprint 2 a été réalisée dans *MS Planner* à travers un ensemble de tâches structurées selon les activités principales du sprint, comme illustré dans la capture ci-dessous.

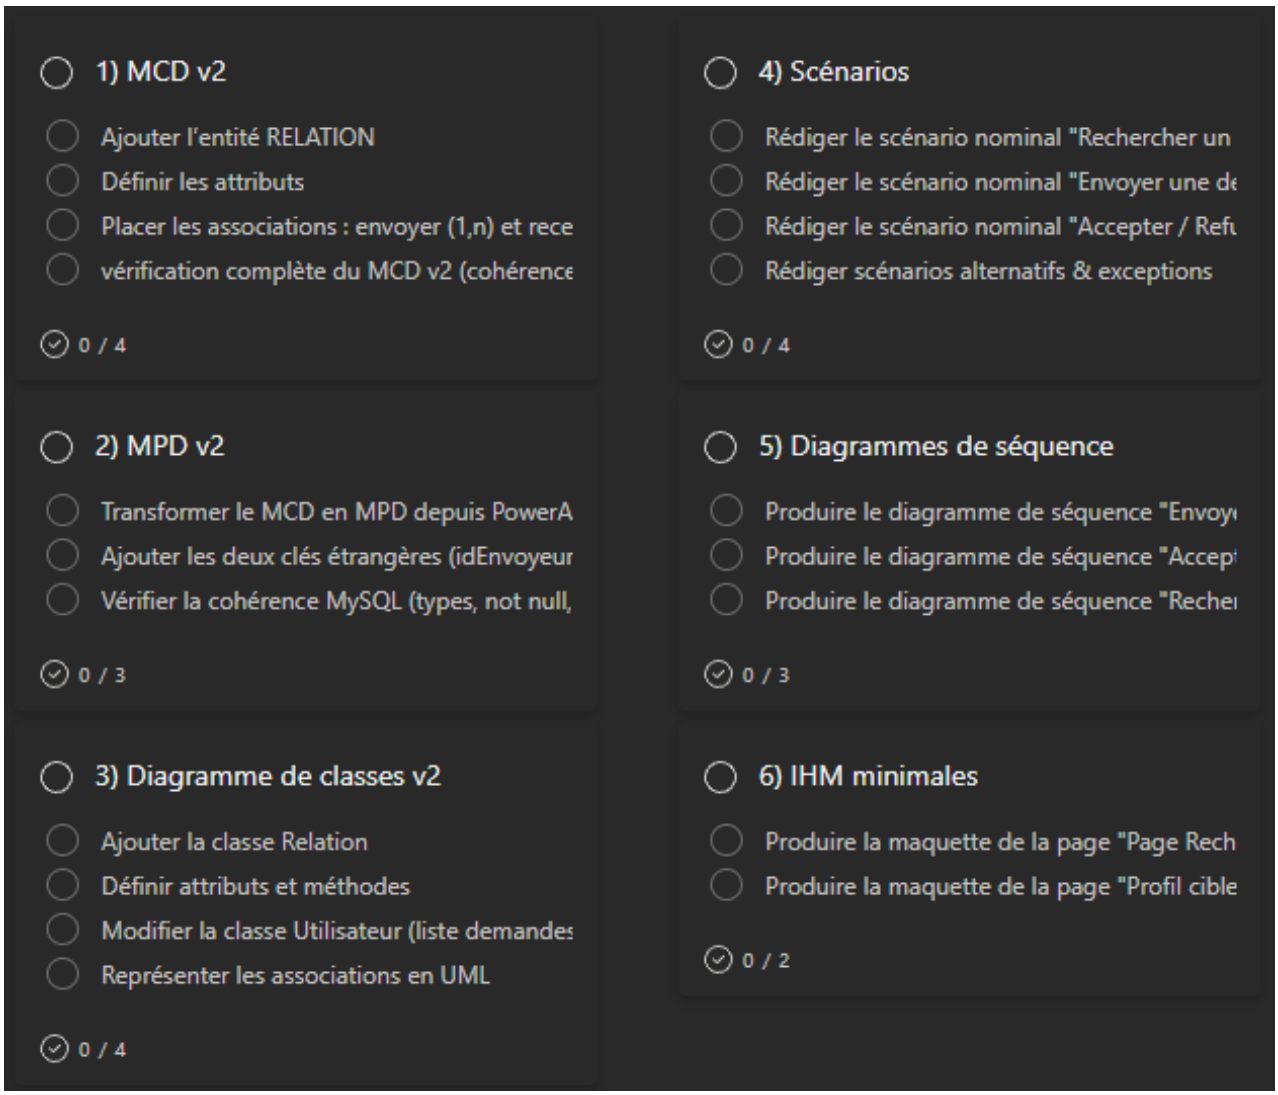


Planification initiale des tâches du Sprint 2 dans MS Planner.

## Mêlée 1

La première mêlée s'est tenue juste après la planification afin de lancer le Sprint 2 dans de bonnes conditions. L'objectif était d'attribuer clairement les tâches aux membres de l'équipe, de valider l'ordre de réalisation et de s'assurer que chacun dispose d'une première action concrète pour la journée suivante.

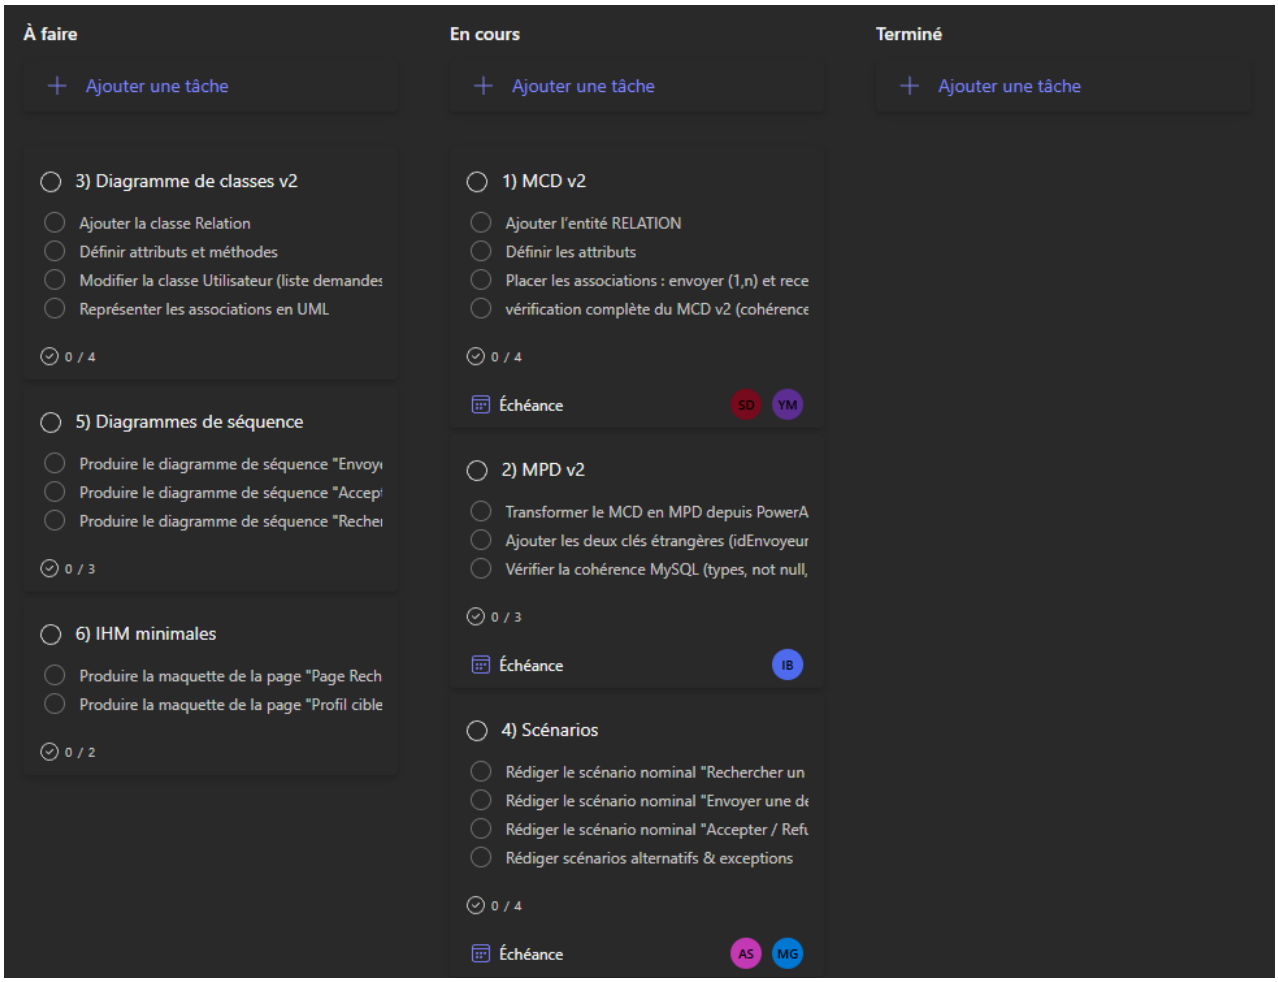



**Figure 20** – État du tableau Kanban après la mêlée 1

## Mêlée 2

Cette seconde mêlée a permis de faire un point d'avancement sur les tâches du Sprint 2 et d'ajuster la répartition du travail en fonction des éléments déjà réalisés.

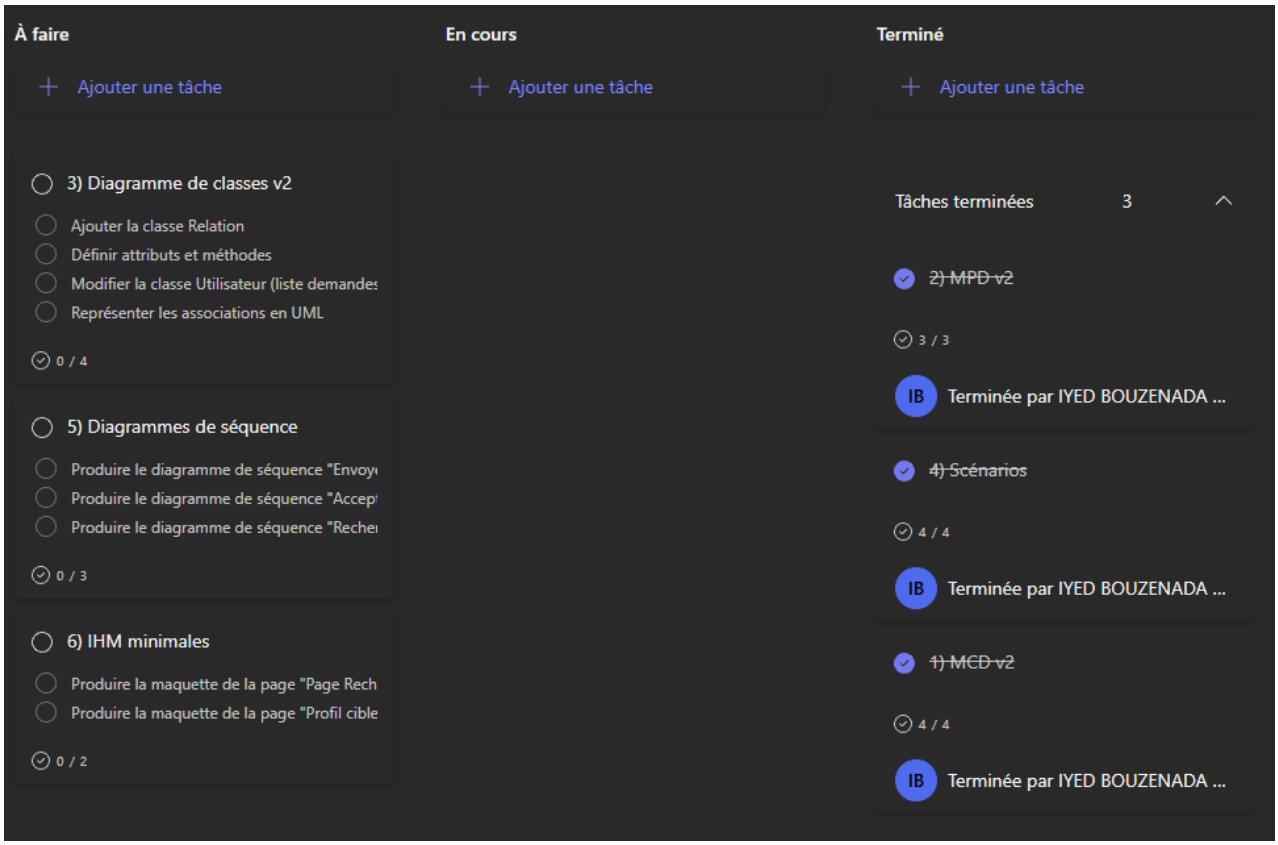



**Figure 21** – État du tableau Kanban avant la mêlée 2

**Livrables complétés au moment de cette deuxième mêlée :**

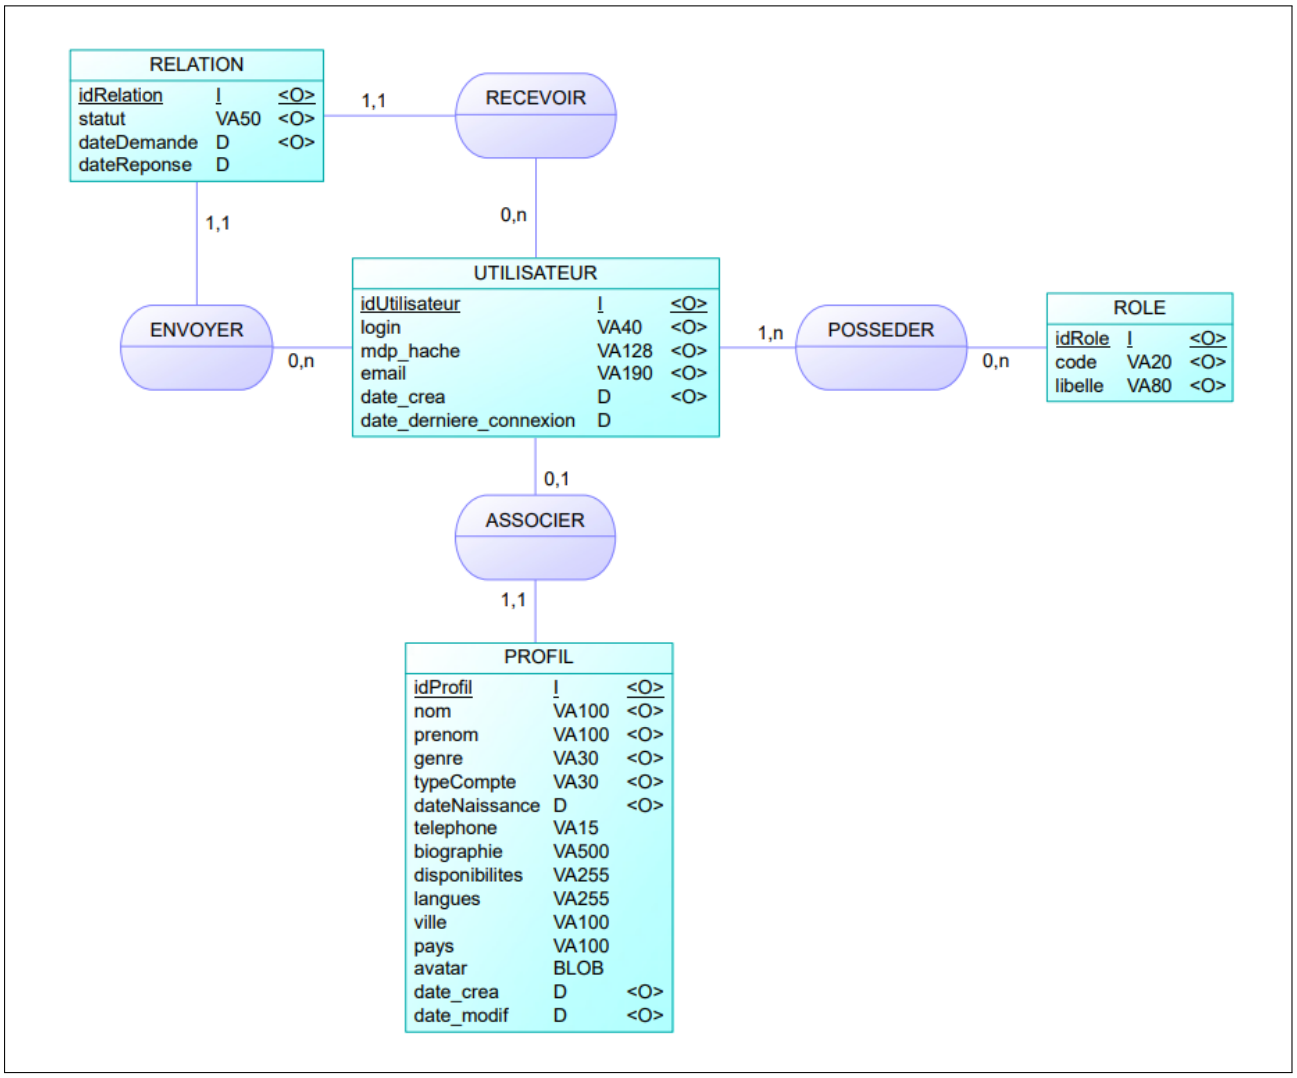



**Figure 22** – Deuxième version du MCD.

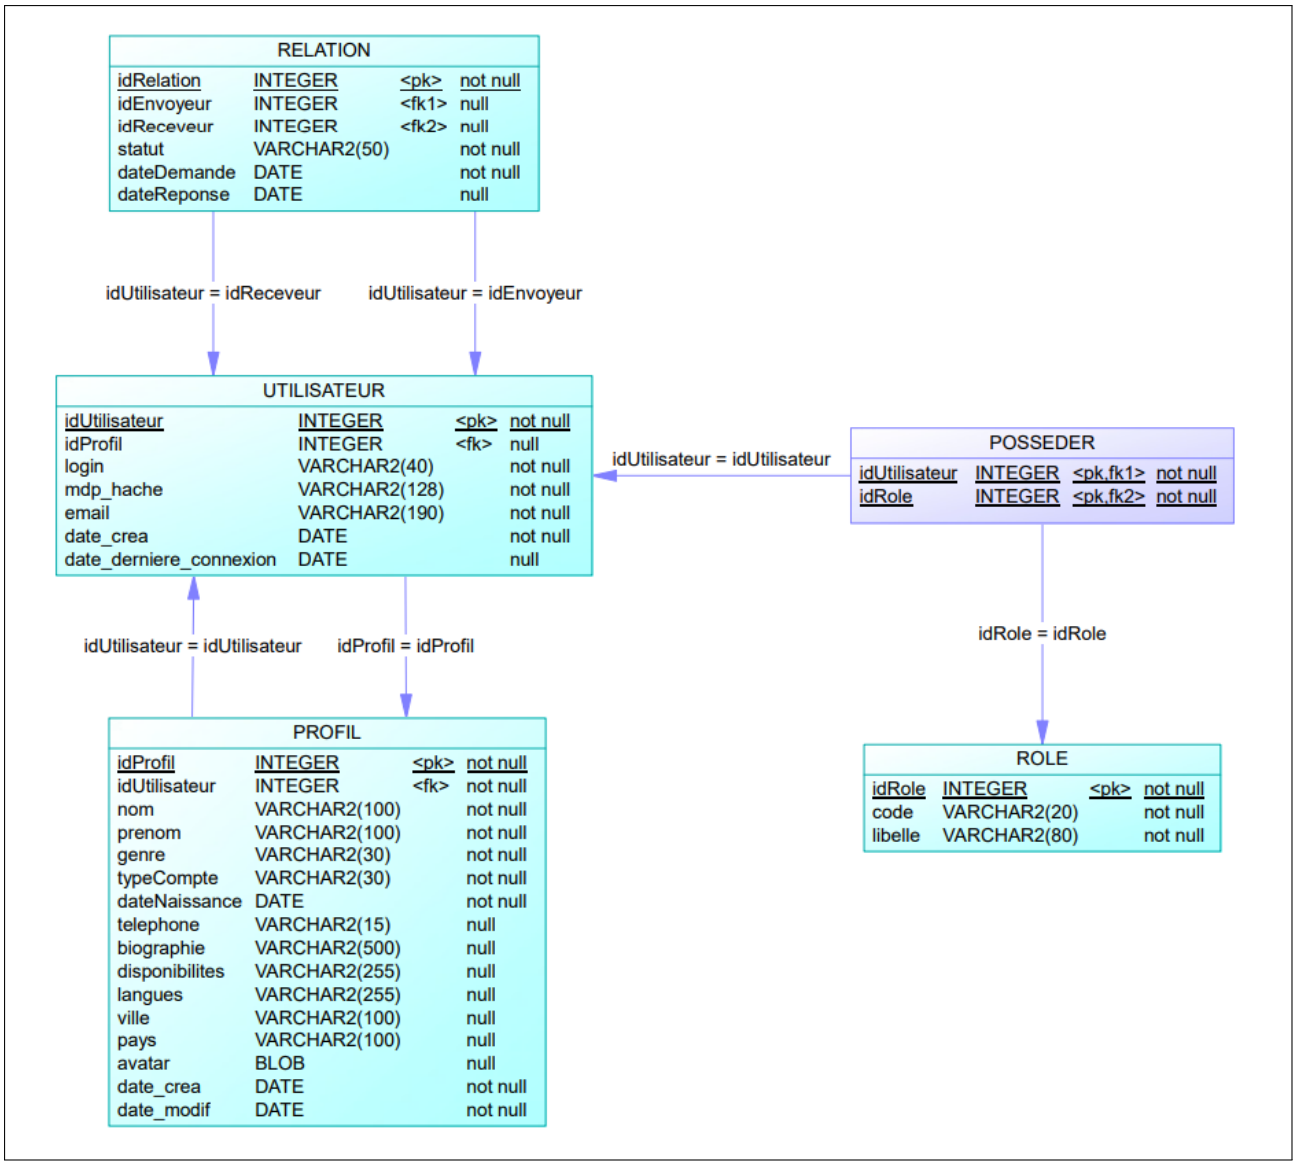



**Figure 23** – Deuxième version du MPD.

**Table 1** – Scénario nominal — Rechercher un buddy

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre la page de recherche. |
| 2 | Il saisit un ou plusieurs critères (langue, ville, centres d'intérêt, disponibilités). |
| 3 | Le système récupère la liste des utilisateurs compatibles. |
| 4 | Le système affiche les résultats correspondants. |
| 5 | L'utilisateur consulte la fiche détaillée d'un buddy potentiel. |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — Rechercher un buddy

| Étape | Action |
|---|---|
| 3a | Aucun utilisateur ne correspond aux critères : le système affiche « Aucun résultat trouvé ». |
| 3b | Les critères sont incomplets : le système demande à l'utilisateur de préciser sa recherche. |

**Table 3** – Scénario d'exception — Rechercher un buddy

| Étape | Action |
|---|---|
| 3e | Une erreur survient lors de la récupération des données : le système affiche « Erreur interne, veuillez réessayer ». |

**Figure 24** – Scénarios — *Rechercher un Buddy*

**Table 1** – Scénario nominal — Envoyer une demande de relation

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre le profil du buddy potentiel. |
| 2 | Il clique sur « Envoyer une demande ». |
| 3 | Le système vérifie qu'aucune relation n'existe déjà entre les deux utilisateurs. |
| 4 | Le système crée une relation avec le statut « en_attente ». |
| 5 | Le système confirme l'envoi de la demande à l'utilisateur. |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — Envoyer une demande de relation

| Étape | Action |
|---|---|
| 3a | Une relation existe déjà : le système affiche « Une demande existe déjà avec cet utilisateur ». |
| 3b | L'utilisateur tente de s'envoyer une demande à lui-même : le système l'en empêche. |

**Table 3** – Scénario d'exception — Envoyer une demande de relation

| Étape | Action |
|---|---|
| 4e | Le système ne parvient pas à enregistrer la relation : message « Erreur lors de l'envoi, veuillez réessayer ». |

**Figure 25** – Scénarios — *Envoyer une demande de relation*

**Table 1** – Scénario nominal — Accepter une demande de relation

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre la liste des demandes reçues. |
| 2 | Il sélectionne une demande à traiter. |
| 3 | Il clique sur « Accepter ». |
| 4 | Le système met à jour le statut de la relation en « acceptee ». |
| 5 | Le système enregistre la date de réponse. |

**Table 2** – Scénario alternatif — Refuser une demande de relation

| Étape | Action |
|---|---|
| 3a | L'utilisateur clique sur « Refuser ». |
| 3b | Le système change le statut de la relation en « refusee ». |

**Table 3** – Scénario d'exception — Accepter / Refuser une demande

| Étape | Action |
|---|---|
| 2e | La demande n'existe plus (déjà traitée ou supprimée) : le système affiche « Cette demande n'est plus disponible ». |

**Figure 26** – Scénarios — *Accepter / Refuser une demande (de relation)*

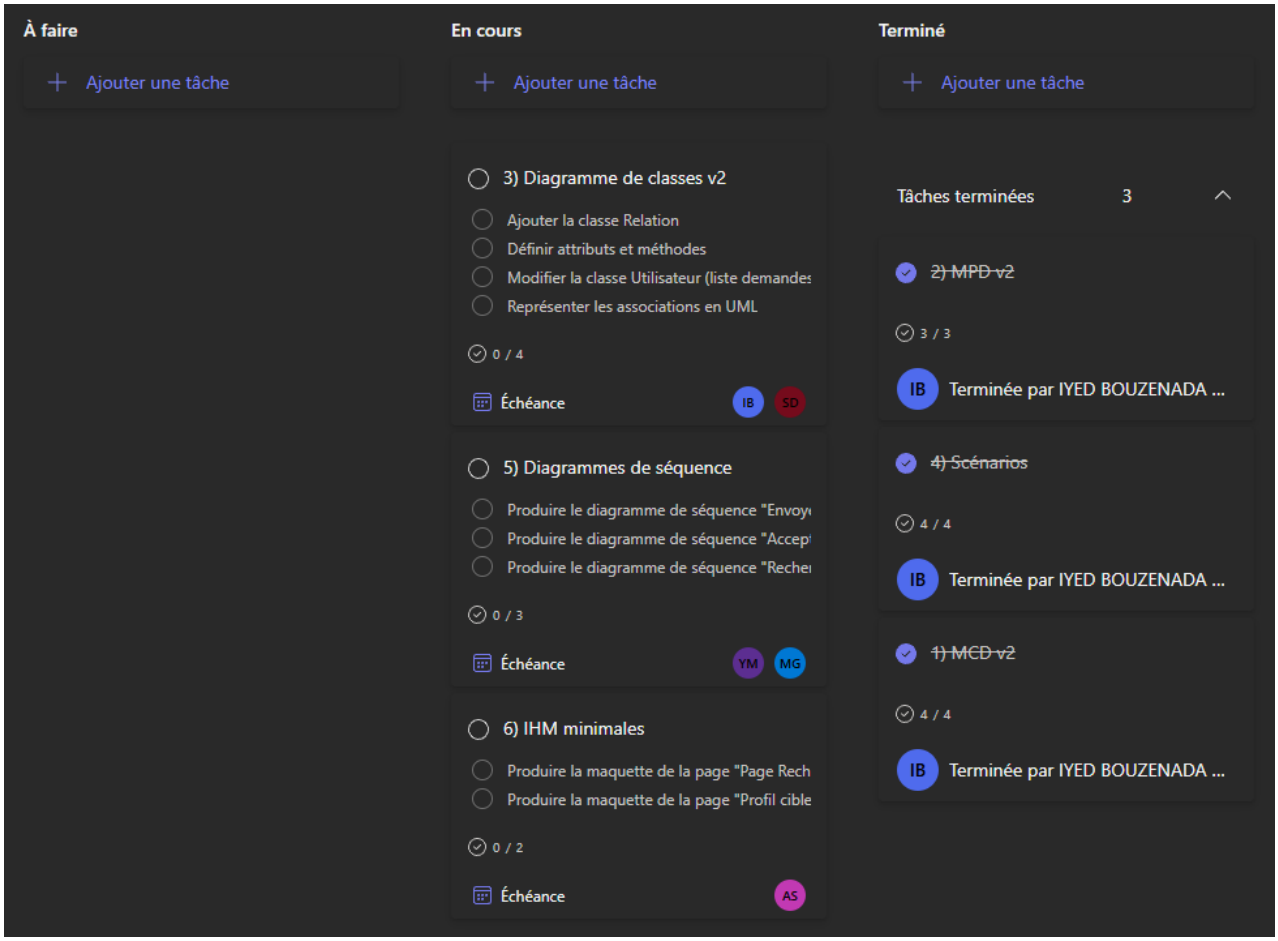



**Figure 27** – État du tableau Kanban après la mêlée 2

## Mêlée 3

À ce stade, l'ensemble des tâches du Sprint 2 apparaît comme complété, et tous les livrables prévus ont été produits.

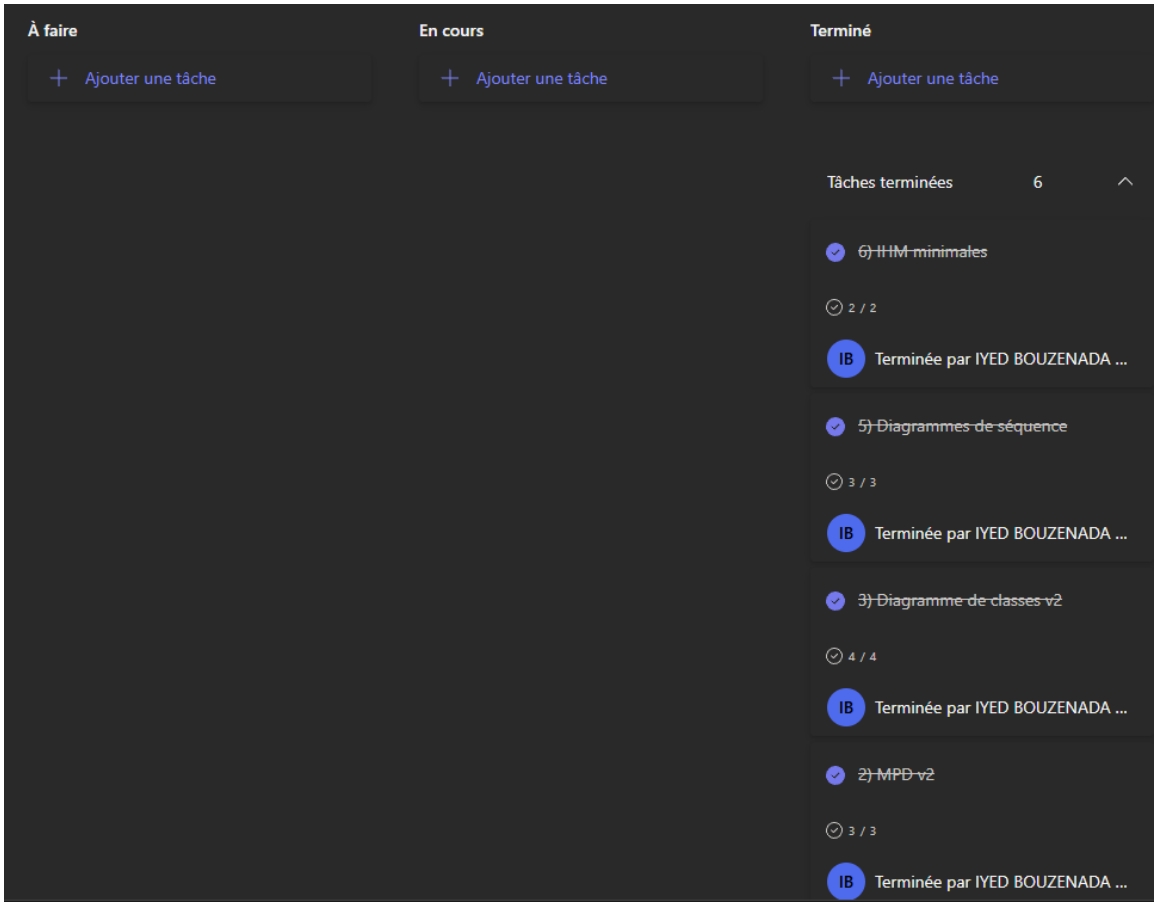



**Figure 28** – État du tableau Kanban avant la mêlée 3

**Livrables complétés au moment de cette troisième mêlée :**

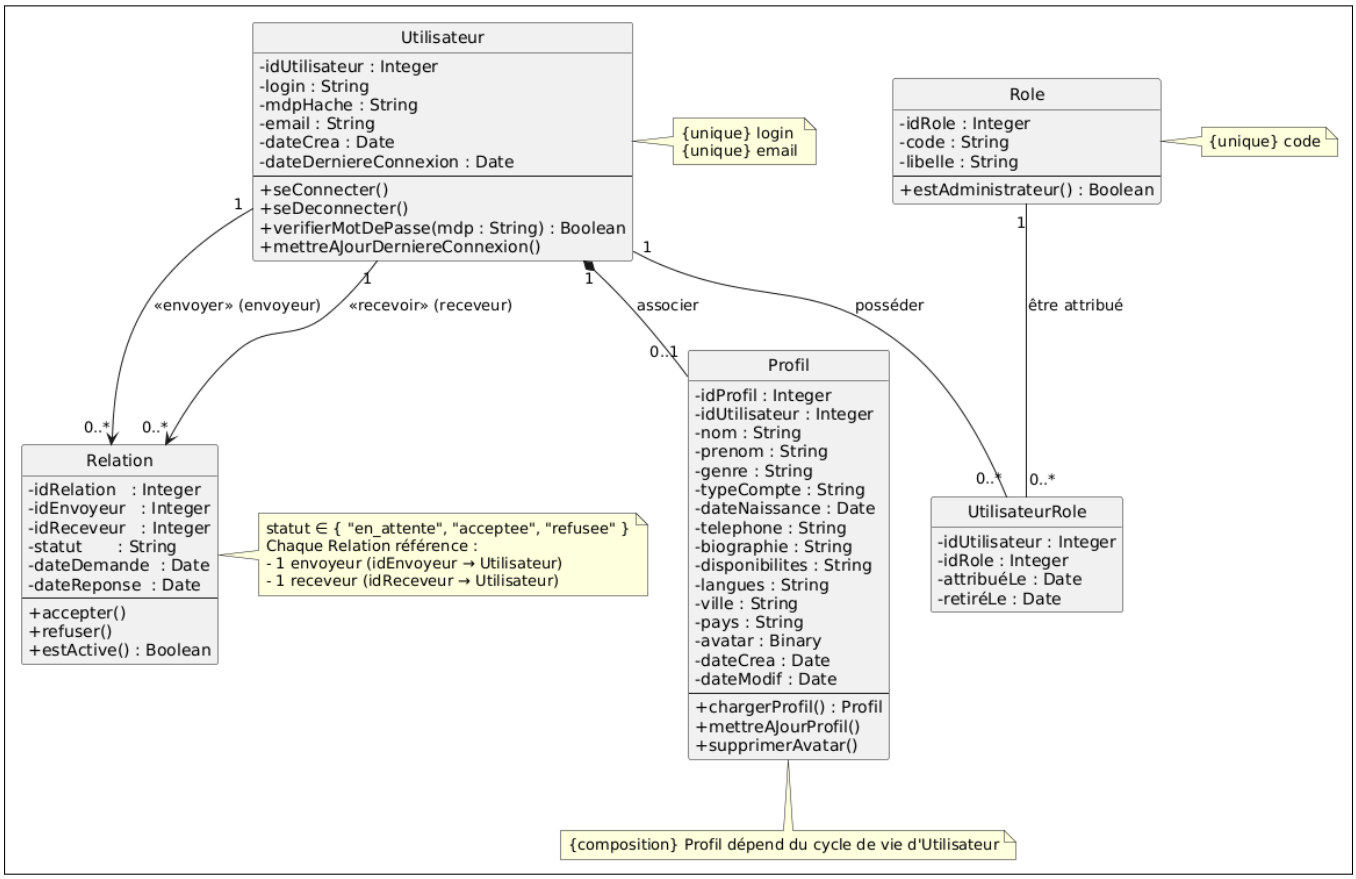



**Figure 29** – Diagramme de classes

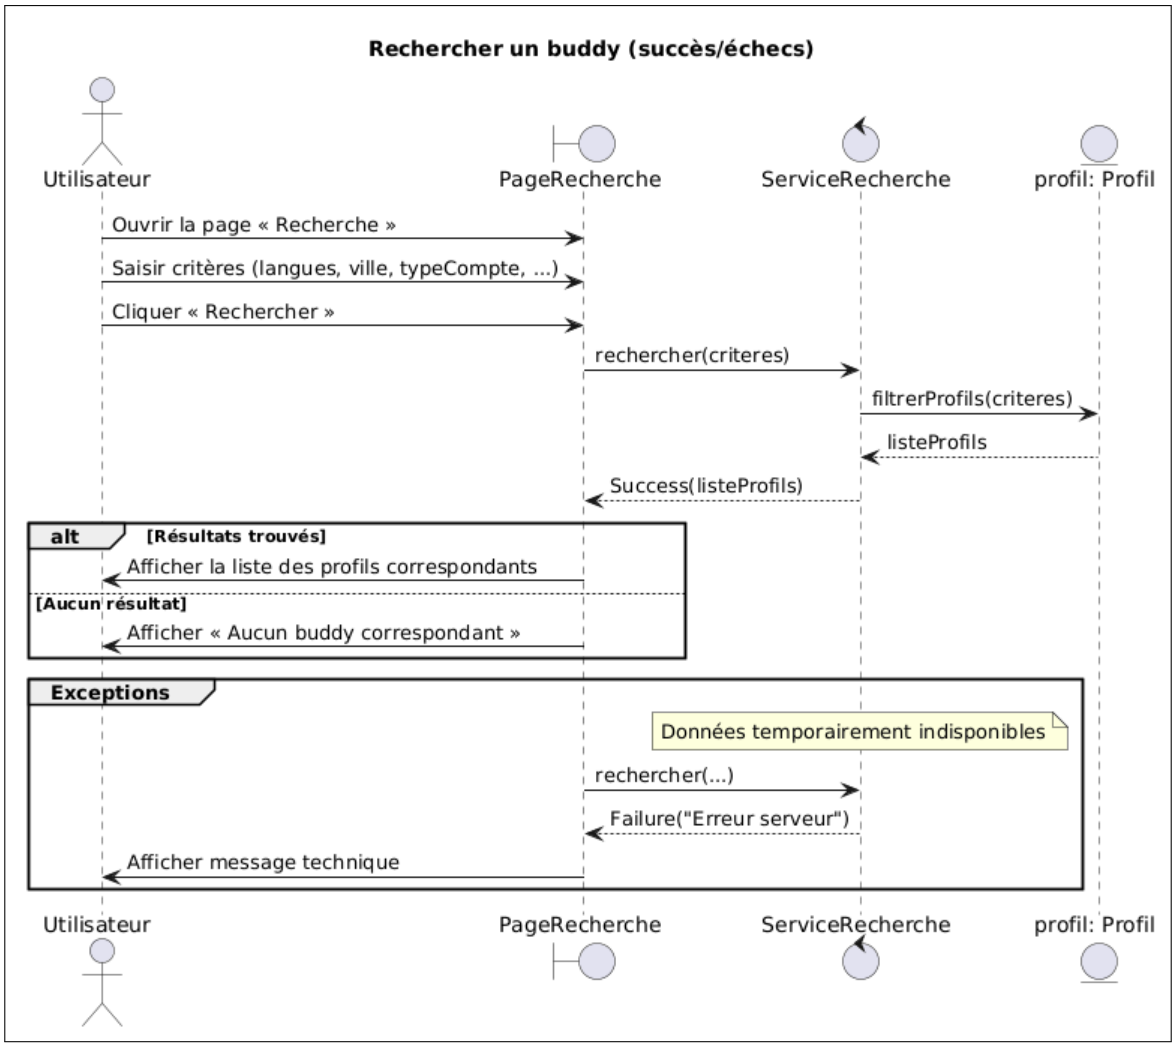



**Figure 30** – Diagramme de Séquence — *Rechercher un Buddy*

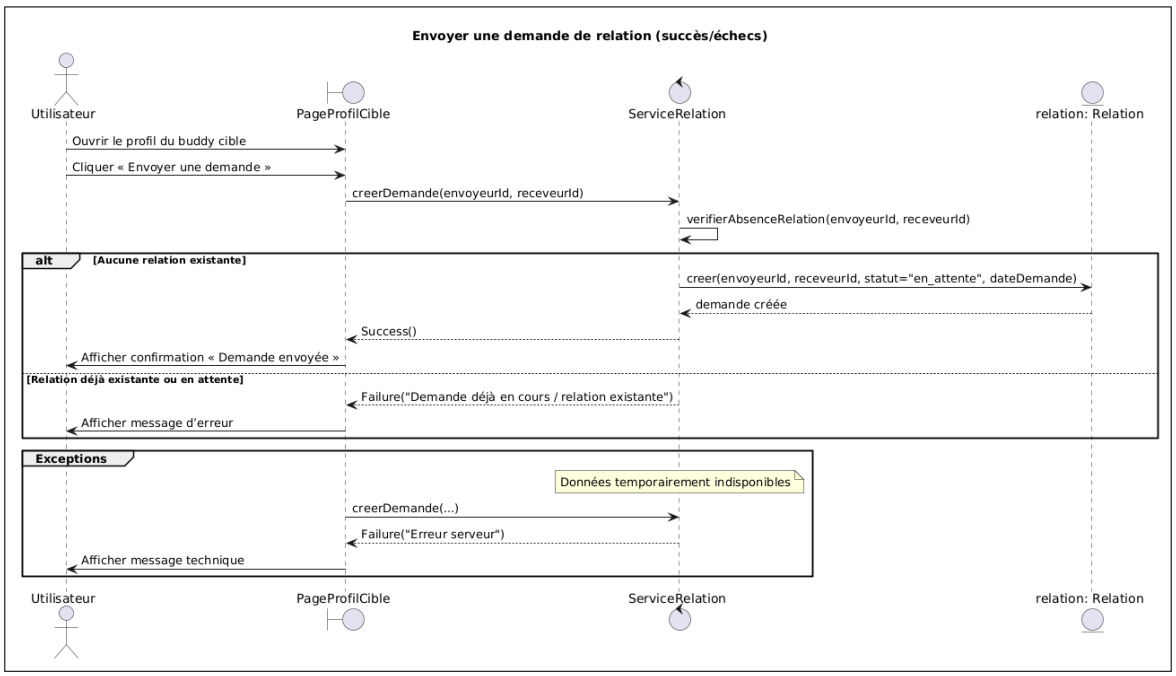



**Figure 31** – Diagramme de Séquence — *Envoyer une demande de relation*

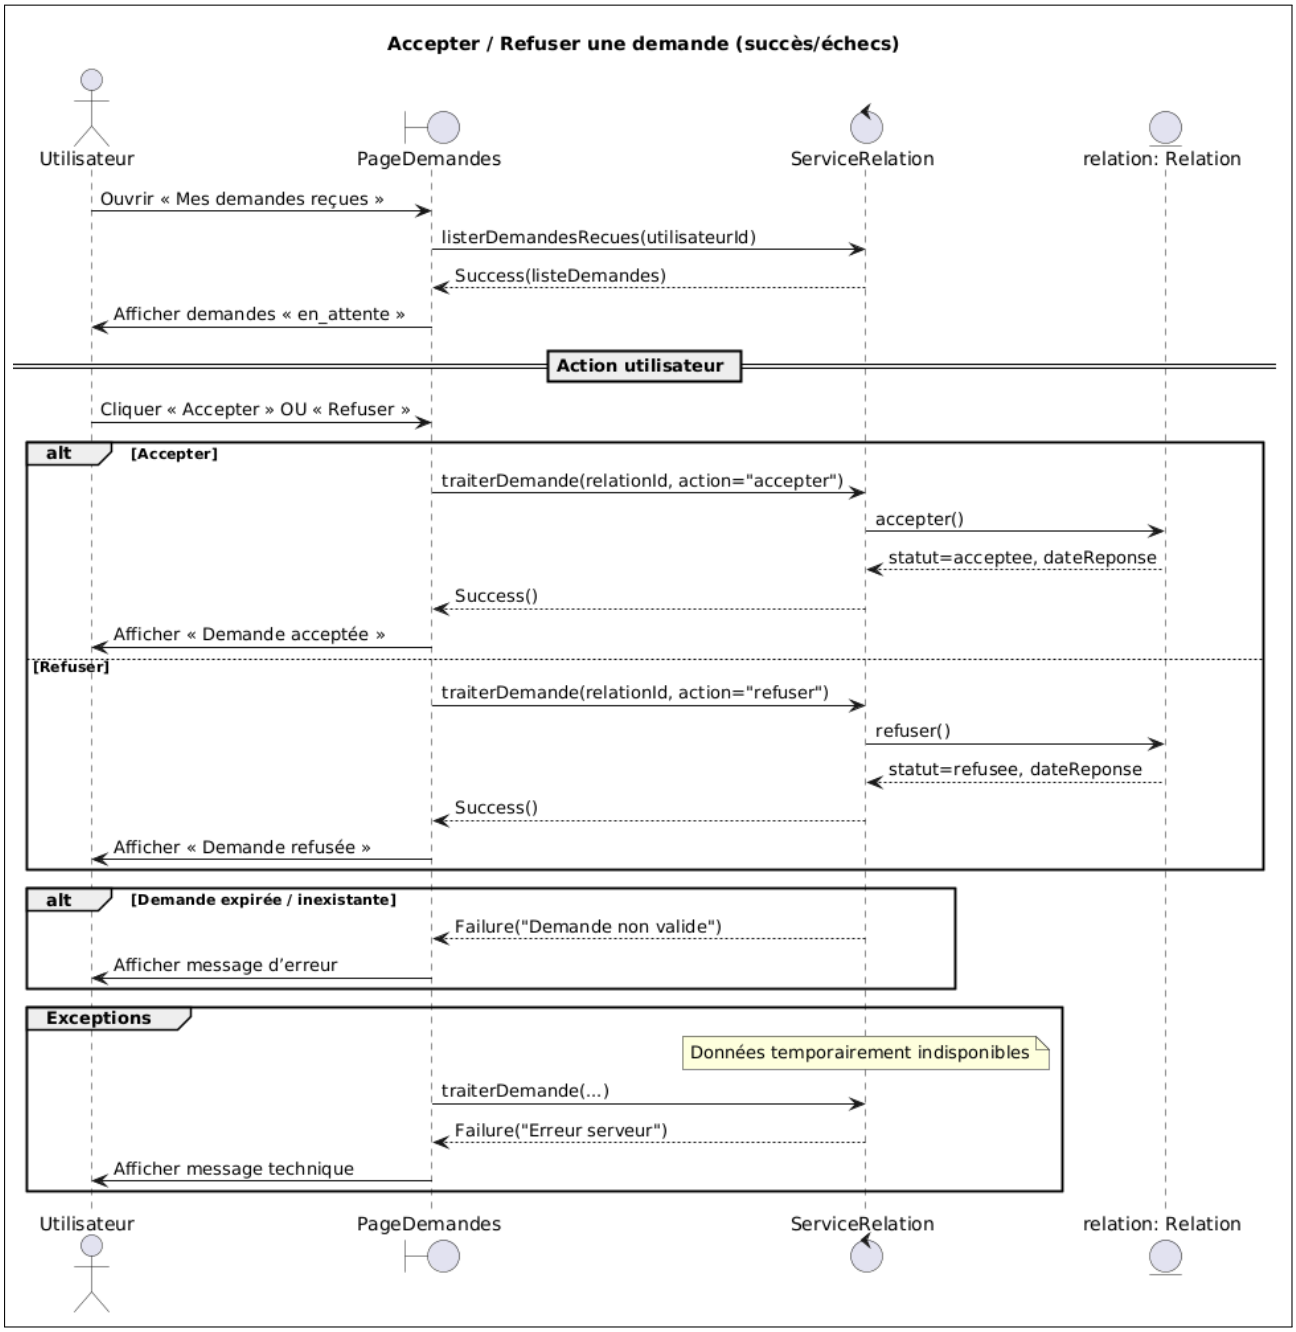



**Figure 32** – Diagramme de Séquence — *Accepter / Refuser une demande (de relation)*

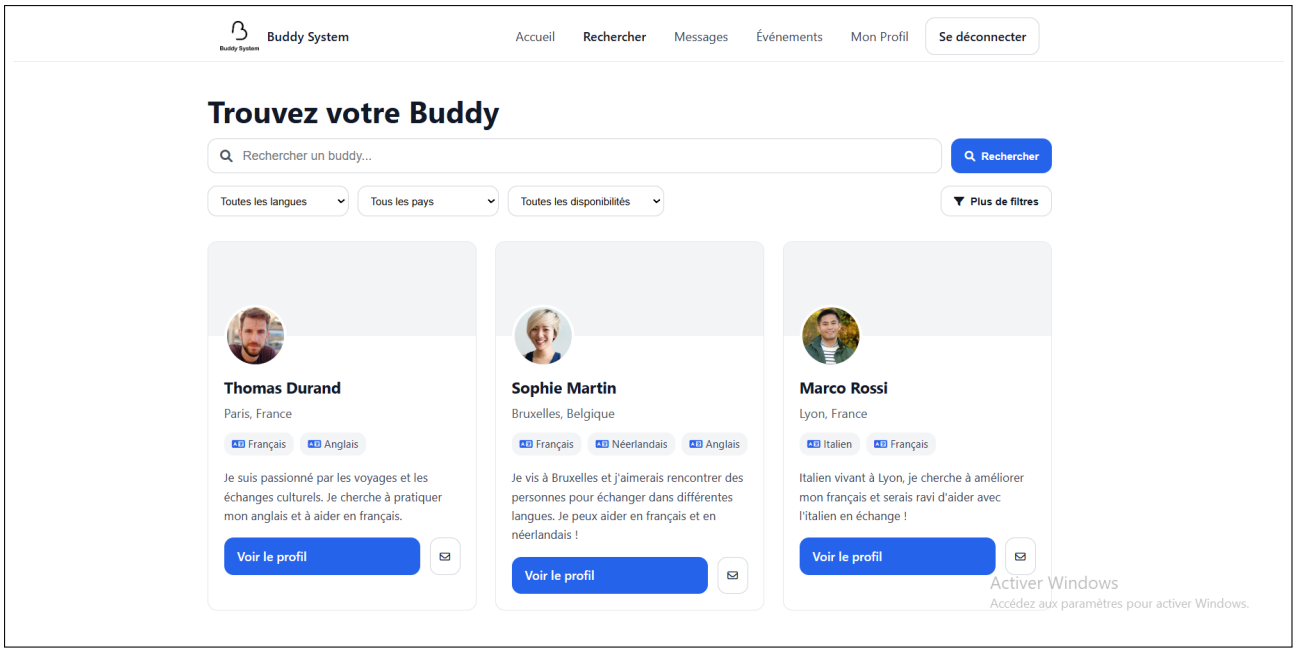



**FIGURE 33** – Maquette — *Page Recherche Buddy*

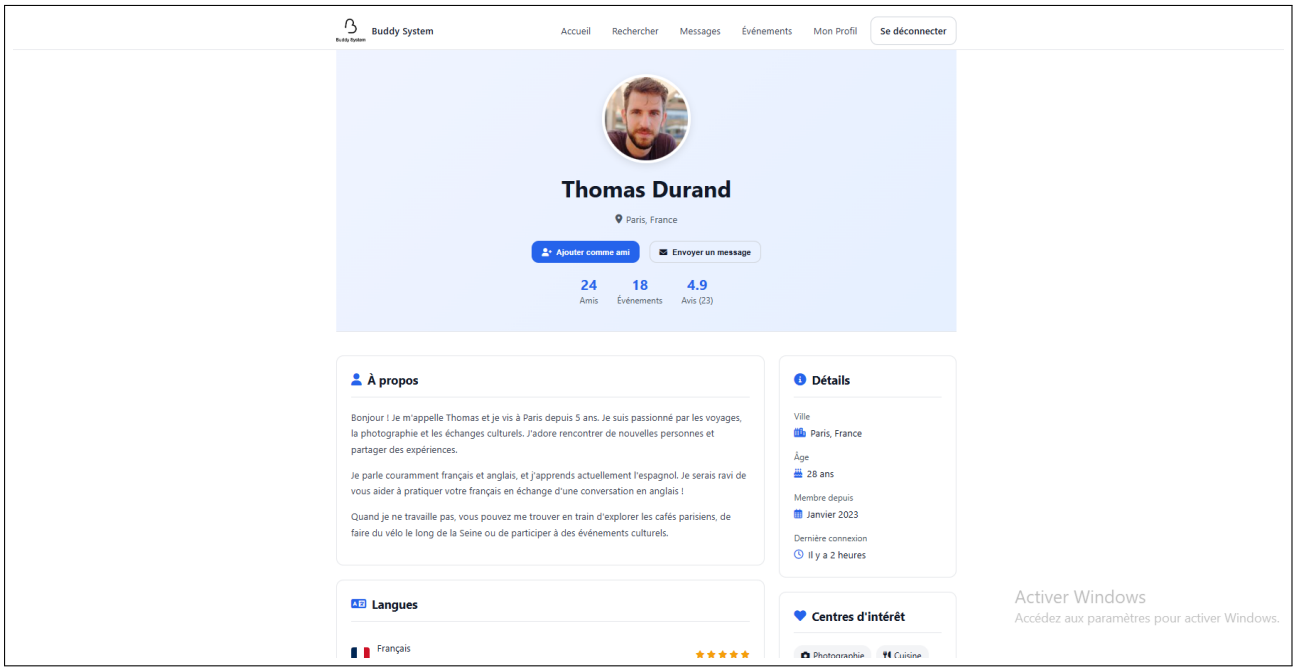



**FIGURE 34** – Maquette — *Page Profil cible*

## Bilan du Sprint 2

**Synthèse :**

Ce deuxième sprint a permis d'étendre la modélisation du système en intégrant le module central de *gestion des relations entre utilisateurs*. L'équipe s'est concentrée sur l'analyse des interactions « rechercher un buddy », « envoyer une demande » et « accepter / refuser une relation ».

La modélisation conceptuelle a été mise à jour et consolidée, permettant d'obtenir une vision plus complète du fonctionnement social du Buddy System.

**Livrables produits :**

— MCD v2 incluant l'entité *Relation* (envoyeur, receveur, statut, dates).

— MPD mis à jour et cohérent avec la nouvelle structure.

— Diagramme de classes v2 intégrant les nouvelles associations et rôles (envoyer/recevoir).

— Scénarios complets : *Rechercher un buddy*, *Envoyer une demande*, *Accepter / Refuser une demande*.

— Diagrammes de séquence associés aux trois cas d'utilisation.

— Maquettes IHM : Page recherche Buddy, Profil cible.

— Mise à jour du tableau MS Planner (planification + mêlées).

**Points à préciser ultérieurement :**

— Définir certains comportements avancés de la relation (ex. expiration, annulation par l'utilisateur).

— Préciser les règles de filtrage pour la recherche de buddy (pondération, critères optionnels).

— Possibilité d'étendre les diagrammes de séquence en incluant les notifications futures.

**Décision pour la suite :**

Le Sprint 3 portera sur la modélisation complète de la *messagerie* : conversations, messages, signalements, ainsi que les scénarios d'envoi et de réception. Ce module s'appuiera directement sur les relations définies au Sprint 2 et constitue la prochaine brique fonctionnelle essentielle du système.


# Sprint 3 : Messagerie et signalement

## Objectif

Ce sprint avait pour objectif de modéliser la messagerie et le signalement minimal : *Envoyer un message*, *Démarrer une conversation* et *Signaler un message*. Il s'agissait d'étendre le MCD/MPD (entités *Conversation*, *Message*, *Signalement*), de préciser les règles d'association avec *Utilisateur*, et de produire les scénarios, séquences et la mise à jour du diagramme de classes associés.

## Planification

La planification du Sprint 3 a été réalisée dans *MS Planner* à travers un ensemble de tâches structurées selon les activités principales du sprint, comme illustré dans la capture ci-dessous.

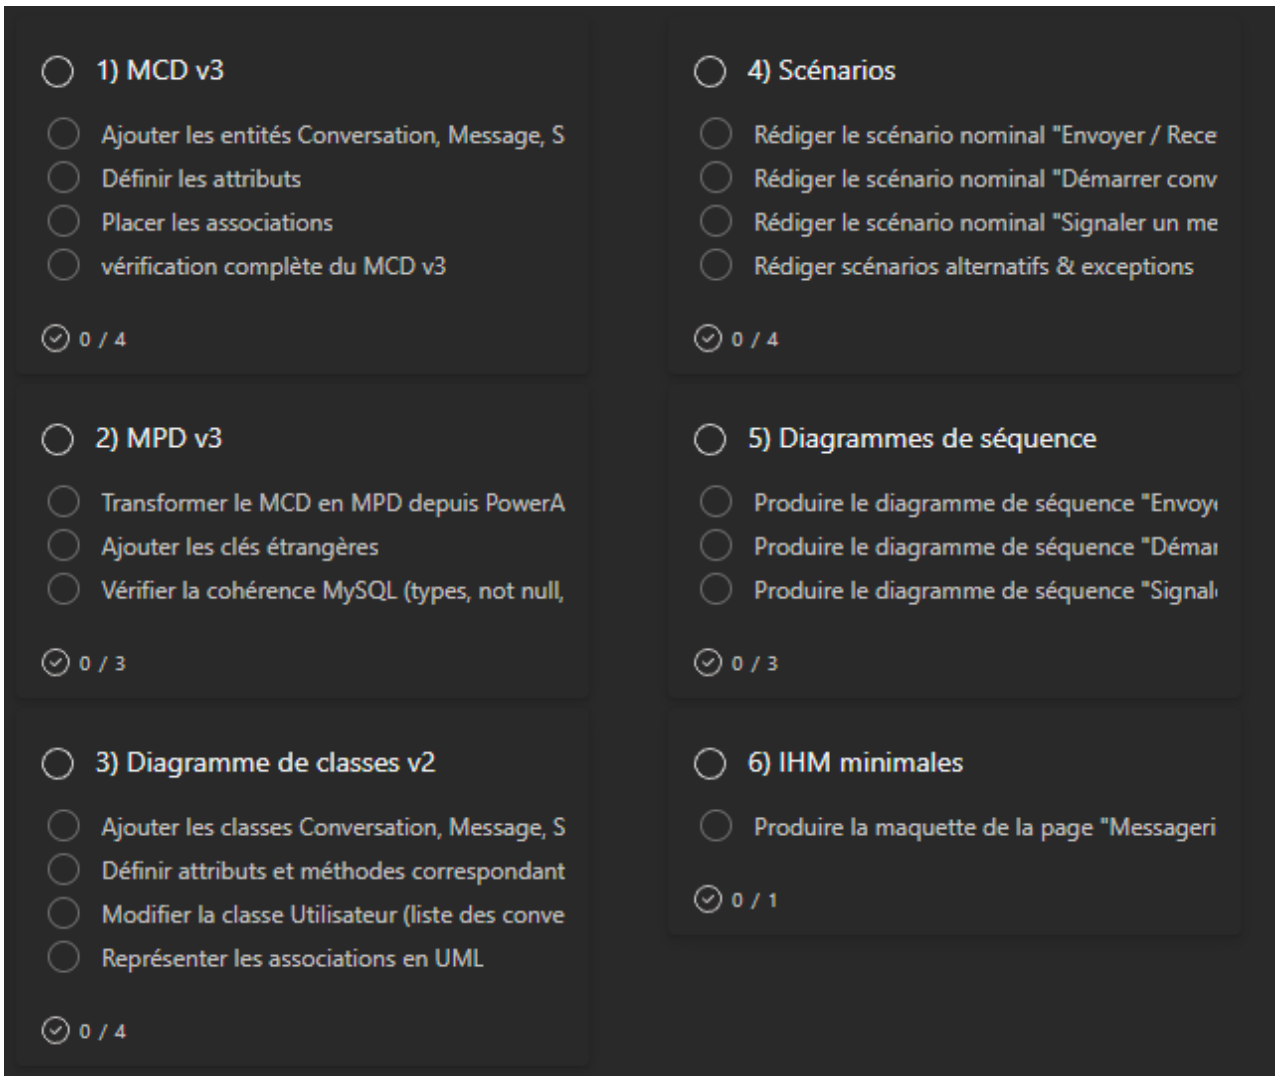


Planification initiale des tâches du Sprint 3 dans MS Planner.

## Mêlée 1

La première mêlée s'est tenue juste après la planification afin de lancer le Sprint 3 dans de bonnes conditions. L'objectif était d'attribuer clairement les tâches aux membres de l'équipe, de valider l'ordre de réalisation et de s'assurer que chacun dispose d'une première action concrète pour la journée suivante.

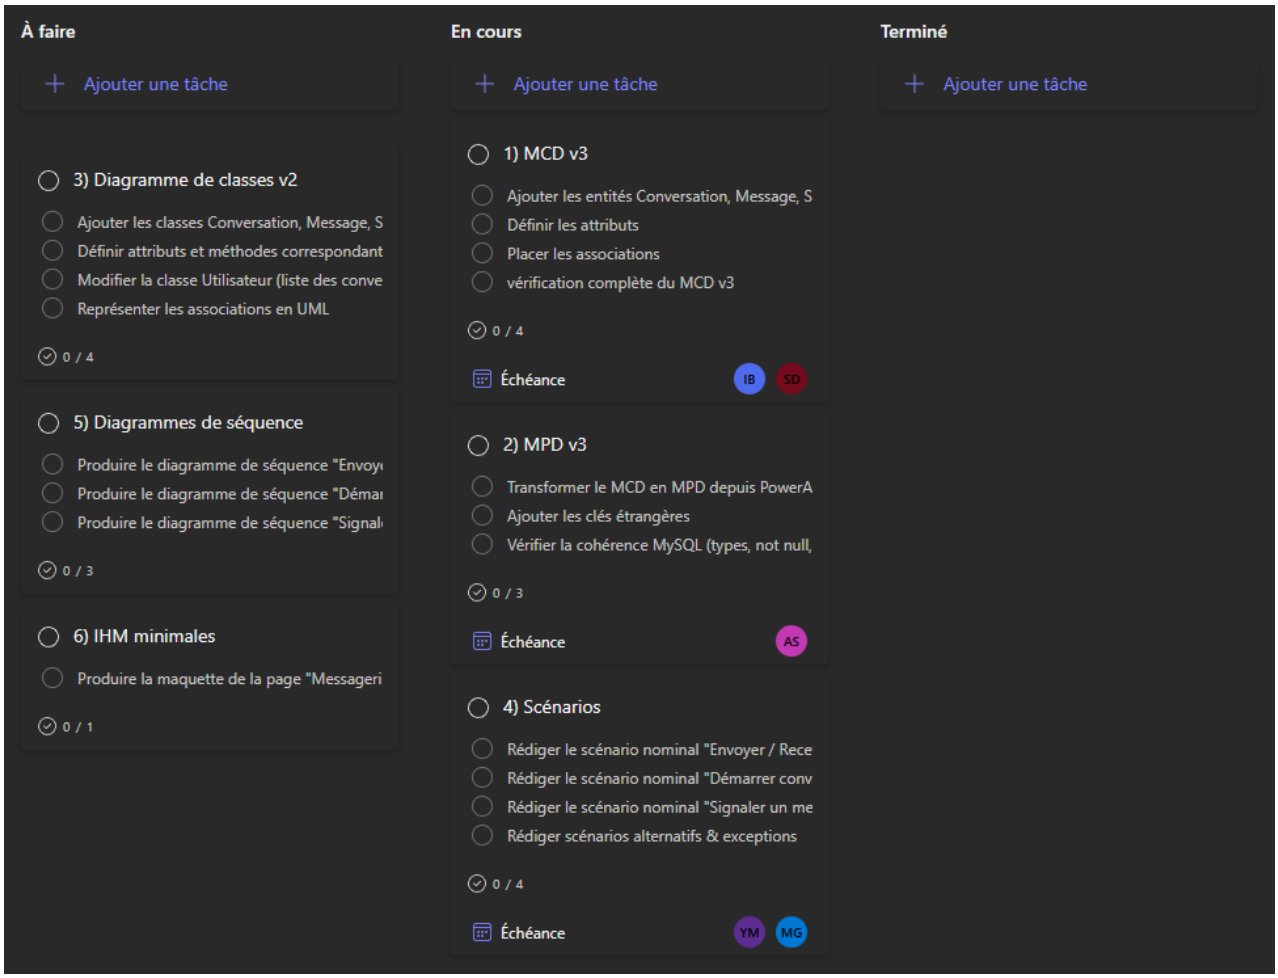



**Figure 35** – État du tableau Kanban après la mêlée 1

## Mêlée 2

Cette seconde mêlée a permis de faire un point d'avancement sur les tâches du Sprint 3 et d'ajuster la répartition du travail en fonction des éléments déjà réalisés.

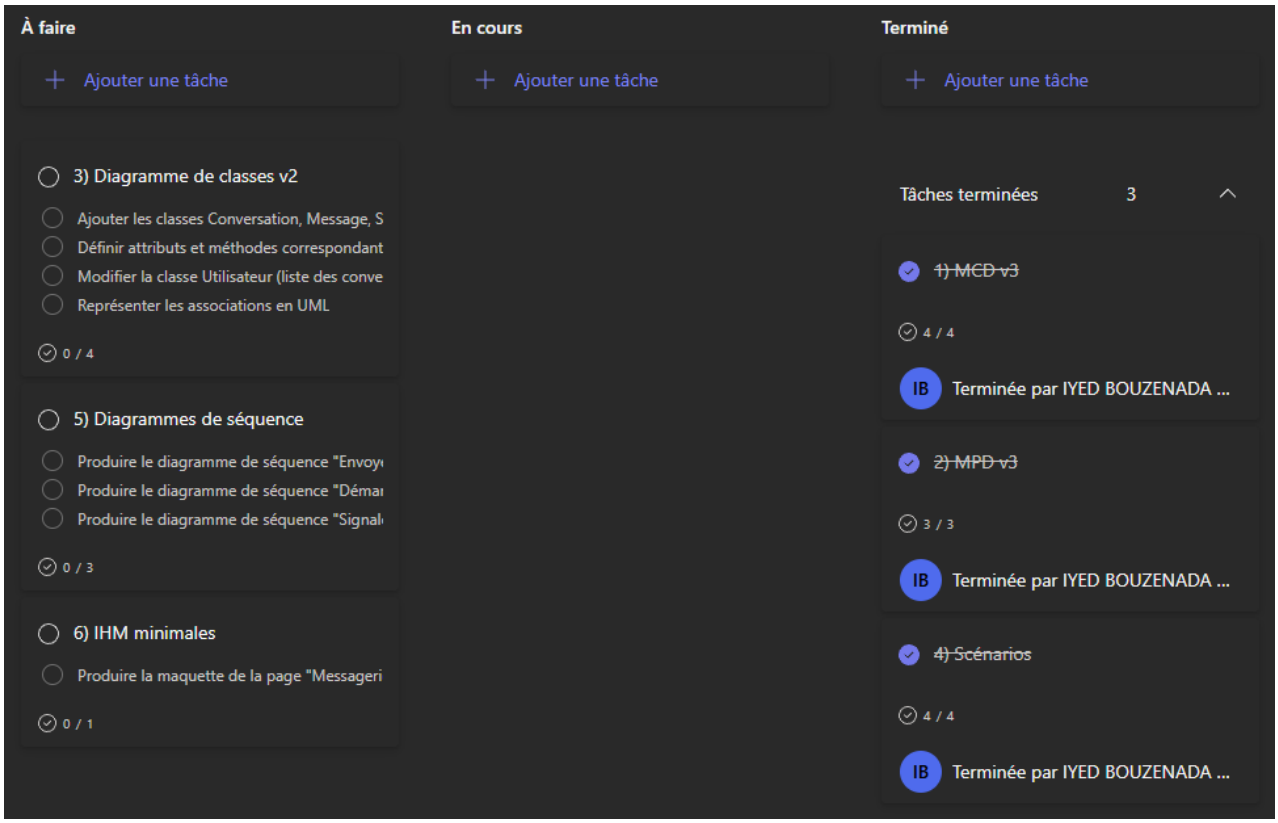



**Figure 36** – État du tableau Kanban avant la mêlée 2

**Livrables complétés au moment de cette deuxième mêlée :**

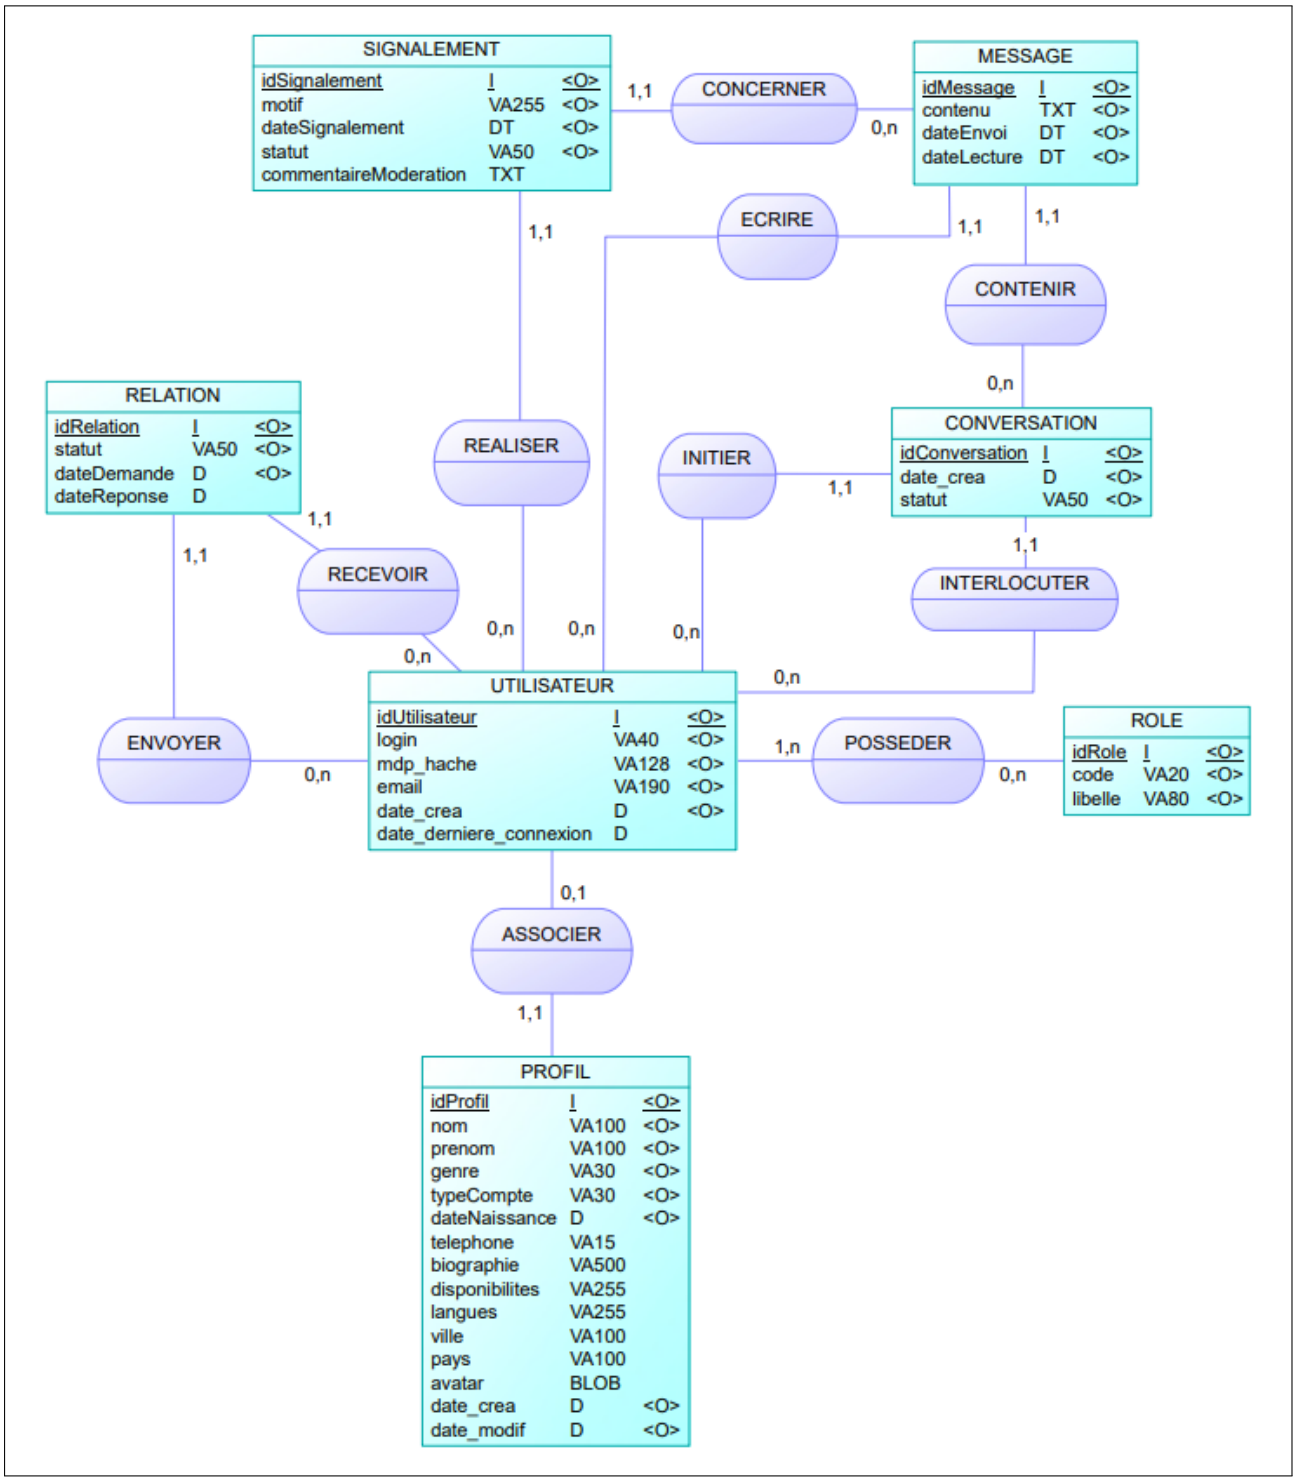



**Figure 37** – Troisième version du MCD.

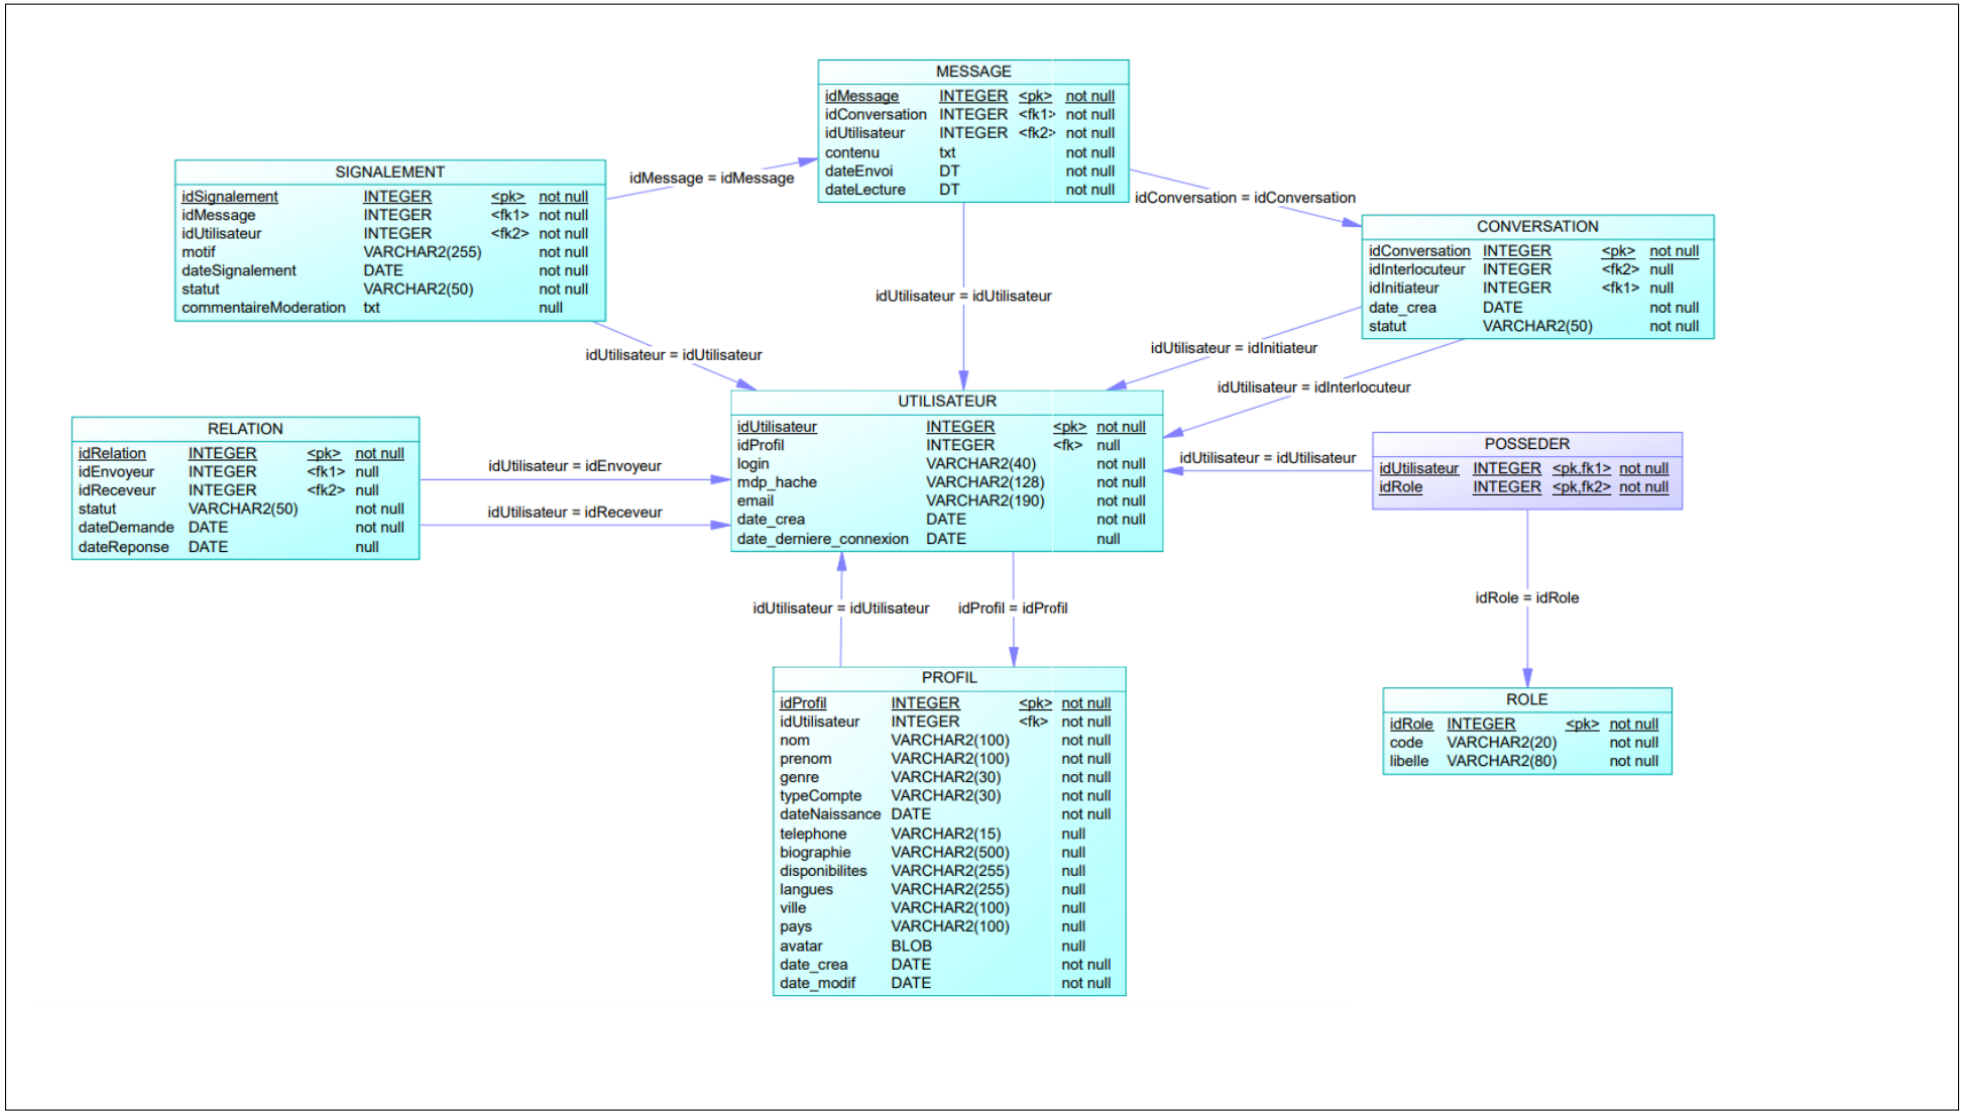



**Figure 38** – Troisième version du MPD.

**Table 1** – Scénario nominal — Envoyer un message

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre la conversation avec l'interlocuteur. |
| 2 | Il saisit le contenu du message. |
| 3 | Il clique sur « Envoyer ». |
| 4 | Le système crée un **Message** (contenu, dateEnvoi, auteur) et l'associe à la **Conversation**. |
| 5 | Le système marque le message « non lu » côté destinataire et affiche le message dans le fil. |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — Envoyer un message

| Étape | Action |
|---|---|
| 4a | Le contenu est vide ou dépasse la taille autorisée : le système refuse l'envoi et affiche « Message invalide ». |
| 4b | La conversation est fermée/bloquée : le système refuse l'envoi et affiche « Envoi non autorisé ». |

**Table 3** – Scénario d'exception — Envoyer un message

| Étape | Action |
|---|---|
| 4e | Ressources indisponibles : le système affiche « Erreur serveur, veuillez réessayer plus tard ». |

**Figure 39** – Scénarios — *Envoyer un message*

**Table 1** – Scénario nominal — Démarrer une conversation

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre le **Profil** de la personne cible. |
| 2 | Il clique sur « Démarrer une conversation ». |
| 3 | Le système vérifie qu'aucune conversation active n'existe déjà entre les deux utilisateurs. |
| 4 | Le système crée une **Conversation** (initiateur, interlocuteur, date de création, statut=active). |
| 5 | Le système redirige l'utilisateur vers l'écran de conversation. |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — Démarrer une conversation

| Étape | Action |
|---|---|
| 3a | Une conversation active existe déjà : le système ouvre la conversation existante (pas de doublon). |
| 3b | Le démarrage n'est pas autorisé (utilisateur bloqué / relation requise manquante) : le système affiche « Action non autorisée ». |

**Table 3** – Scénario d'exception — Démarrer une conversation

| Étape | Action |
|---|---|
| 4e | Ressources indisponibles : le système affiche « Erreur serveur, veuillez réessayer plus tard ». |

**Figure 40** – Scénarios — *Démarrer une conversation*

**Table 1** – Scénario nominal — Signaler un message

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre les options d'un message reçu ou affiché. |
| 2 | Il clique sur « Signaler ce message ». |
| 3 | Il saisit le motif du signalement, puis confirme. |
| 4 | Le système enregistre un **Signalement** (message, utilisateur, motif, date, statut=en_attente). |
| 5 | Le système confirme « Message signalé » et retourne à la conversation. |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — Signaler un message

| Étape | Action |
|---|---|
| 3a | Motif vide ou invalide : le système refuse l'enregistrement et affiche « Motif requis ». |
| 4a | Le même utilisateur a déjà signalé ce message : le système affiche « Message déjà signalé ». |

**Table 3** – Scénario d'exception — Signaler un message

| Étape | Action |
|---|---|
| 4e | Ressources indisponibles : le système affiche « Erreur serveur, veuillez réessayer plus tard ». |

**Figure 41** – Scénarios — *Signaler un message*

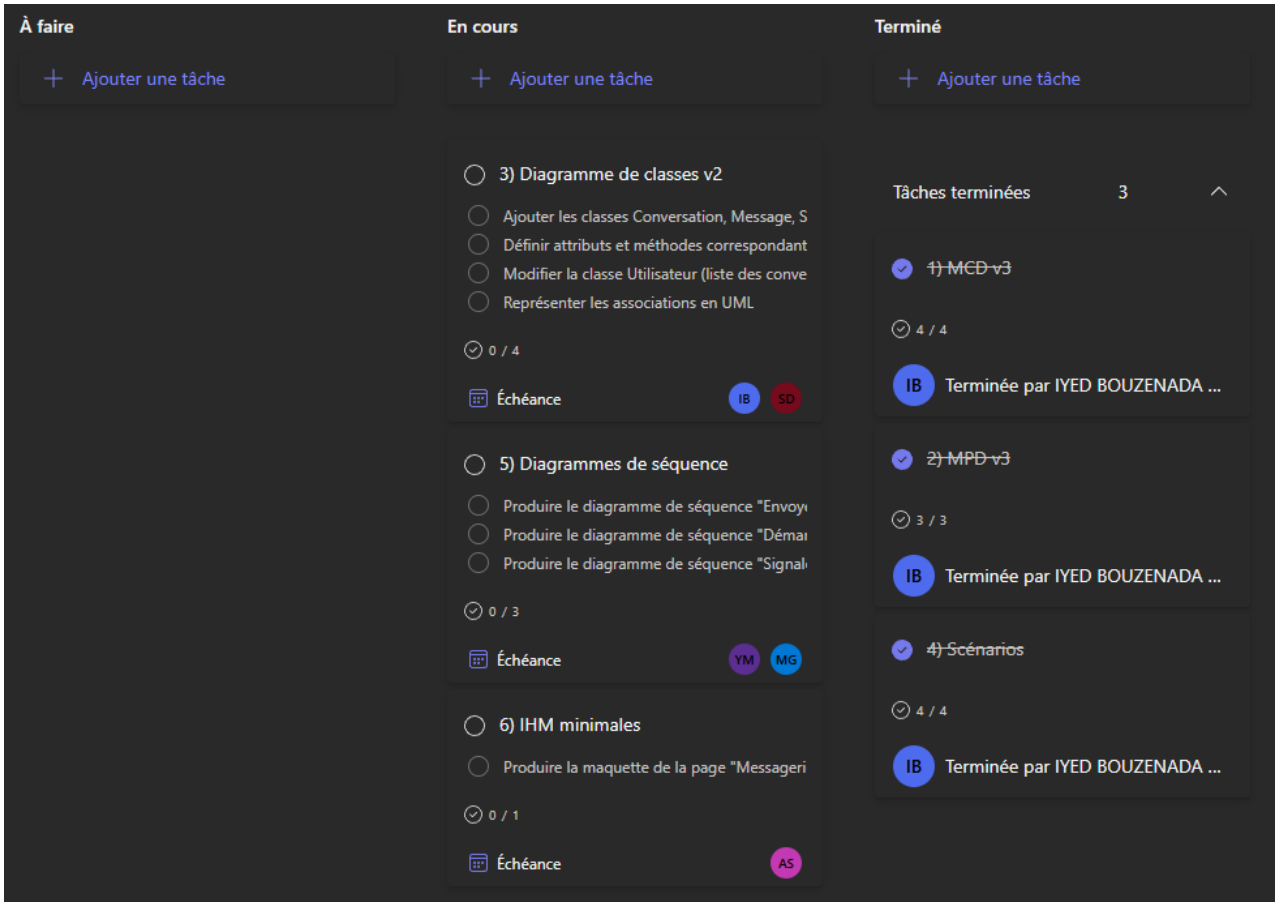



**Figure 42** – État du tableau Kanban après la mêlée 2

## Mêlée 3

À ce stade, l'ensemble des tâches du Sprint 3 apparaît comme complété, et tous les livrables prévus ont été produits.

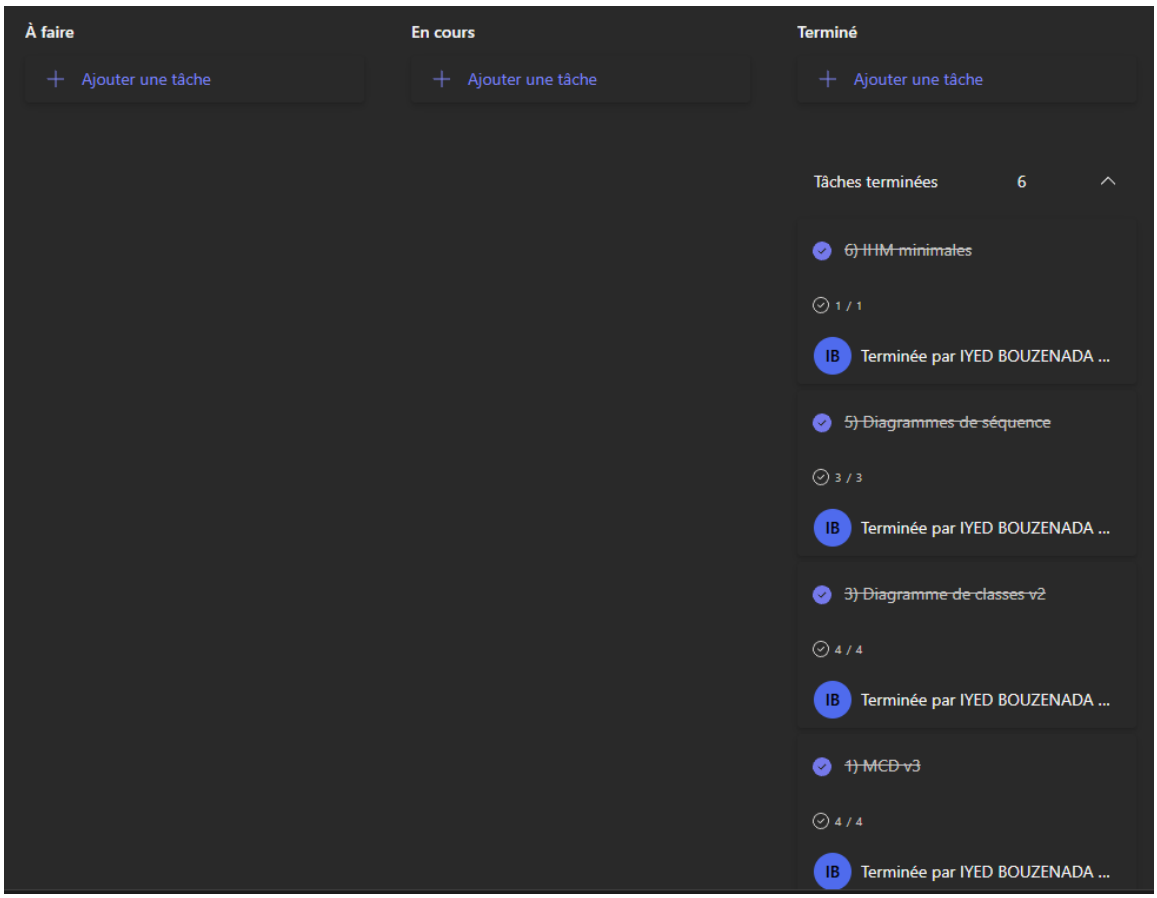



**Figure 43** – État du tableau Kanban avant la mêlée 3

**Livrables complétés au moment de cette troisième mêlée :**

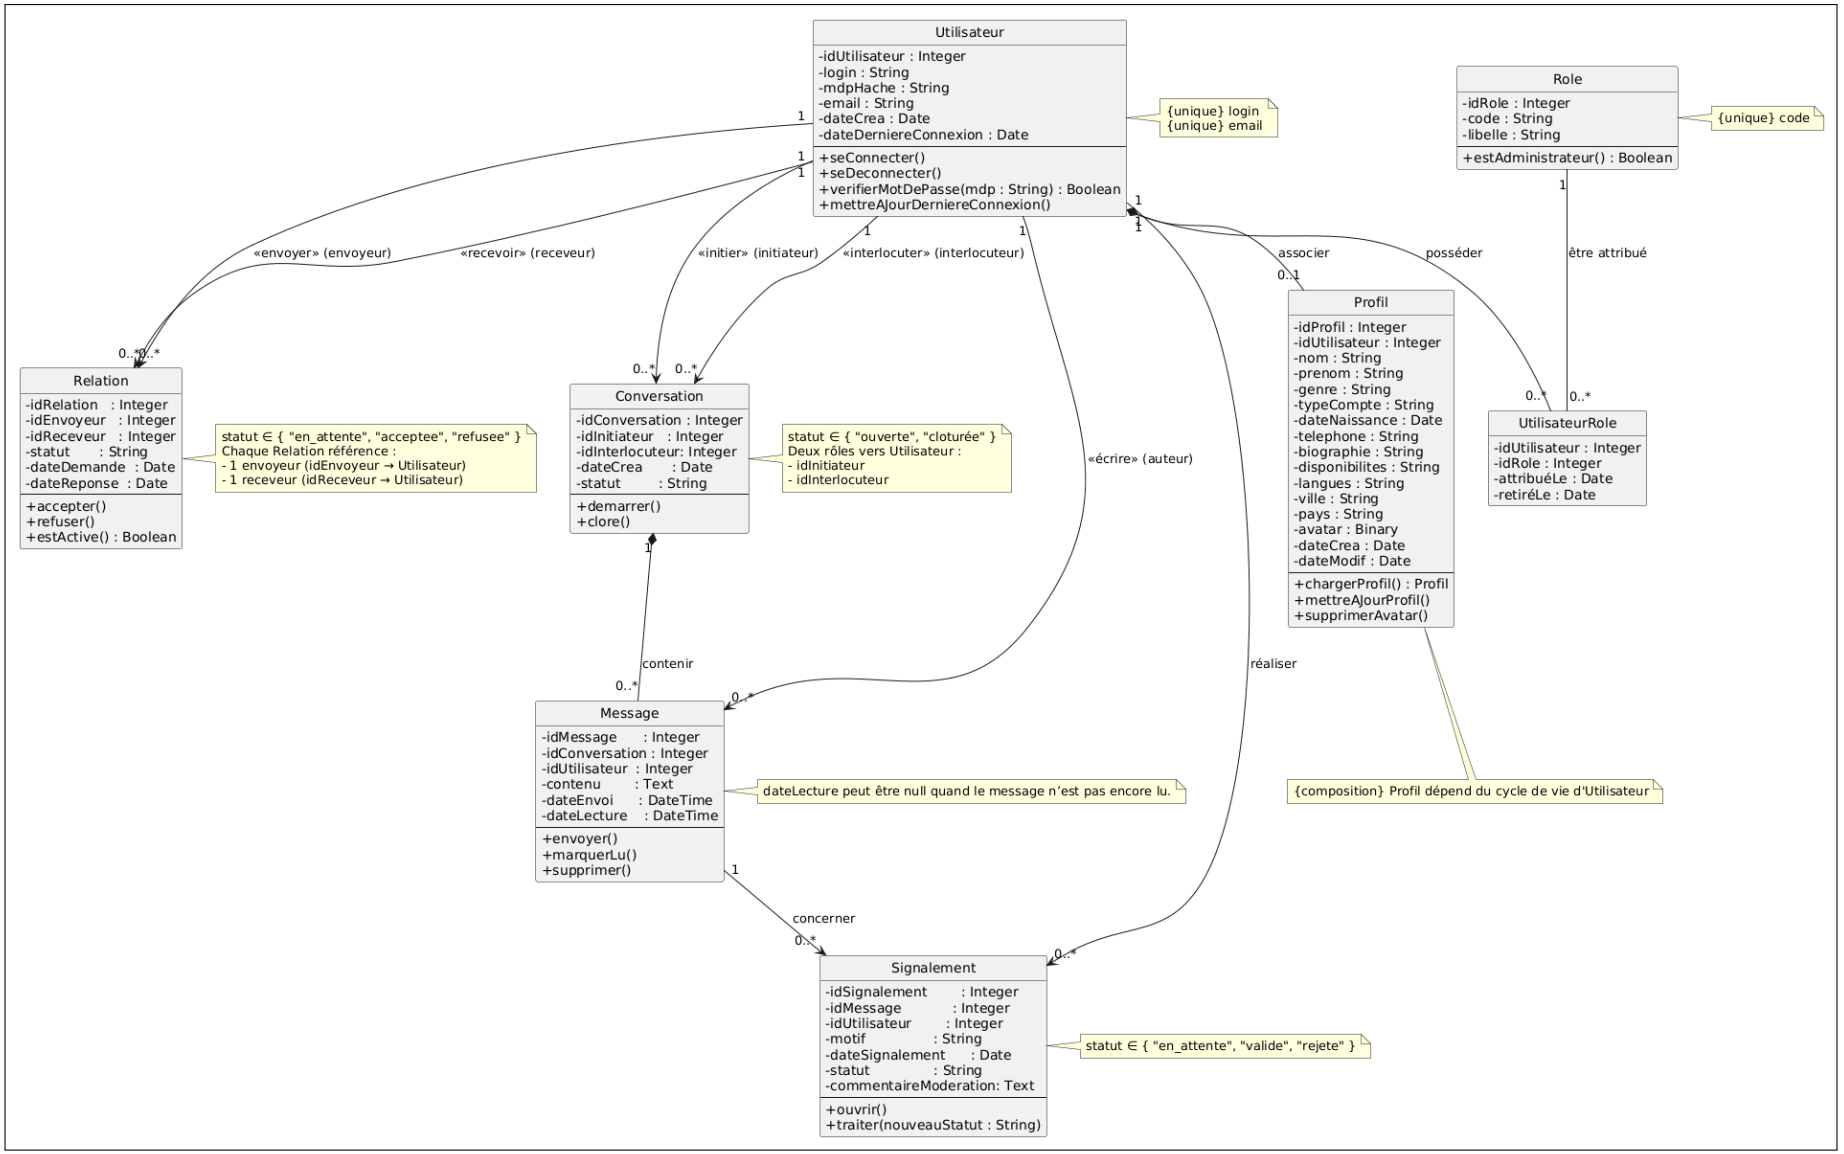



**Figure 44** – Diagramme de classes — version Sprint 3

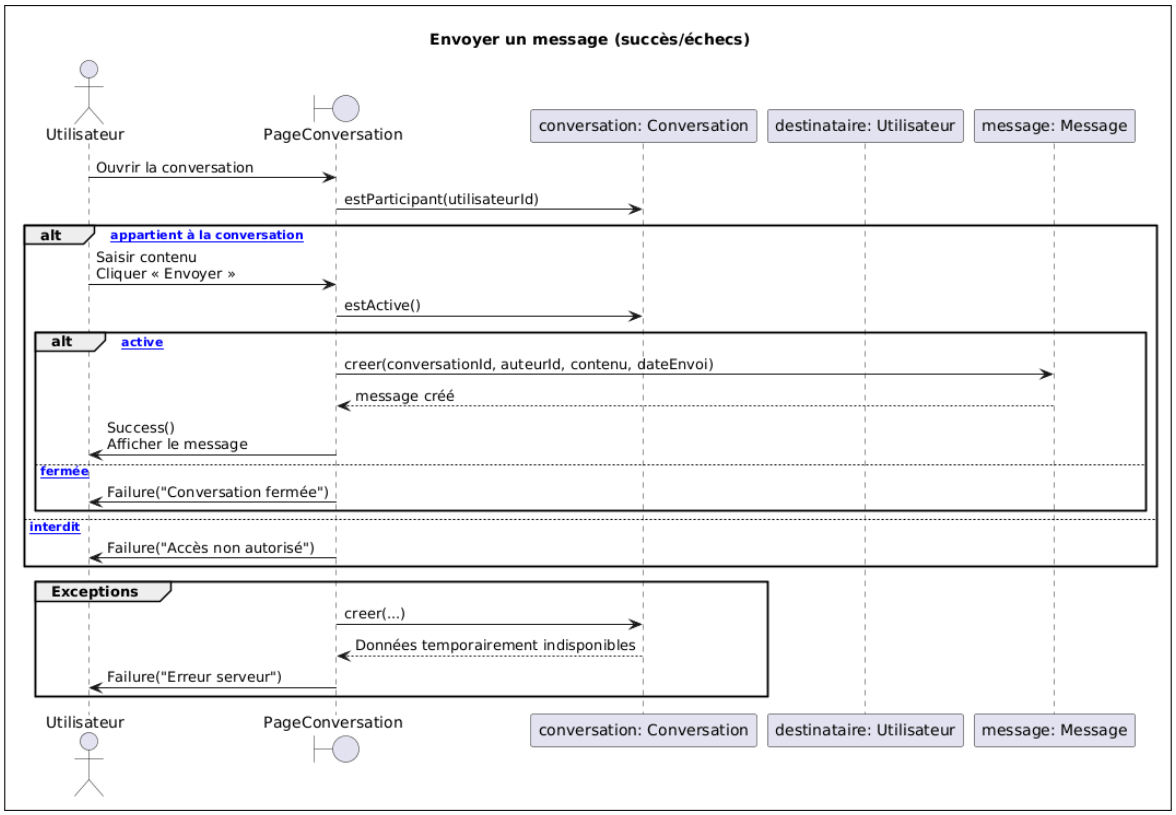



**Figure 45** – Diagramme de Séquence — *Envoyer un message*

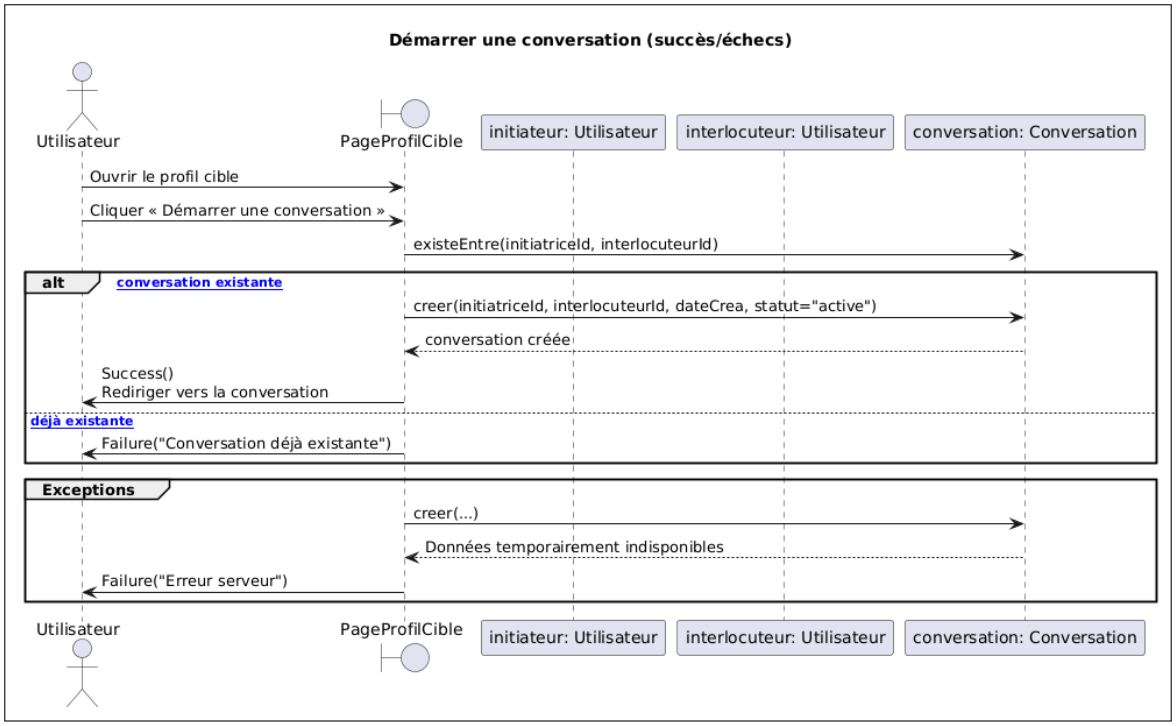



**Figure 46** – Diagramme de Séquence — *Démarrer une conversation*

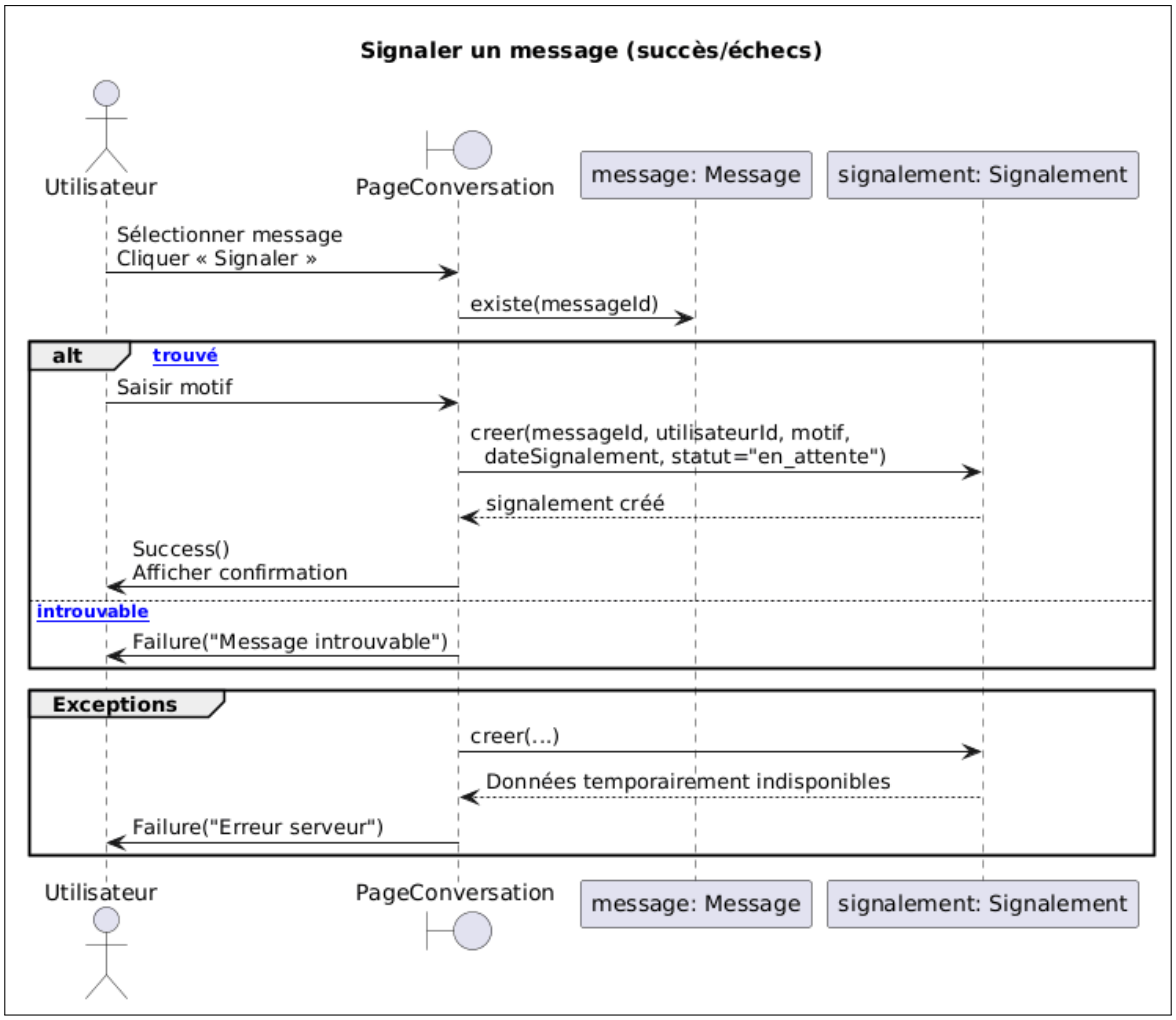



**Figure 47** – Diagramme de Séquence — *Signaler un message*

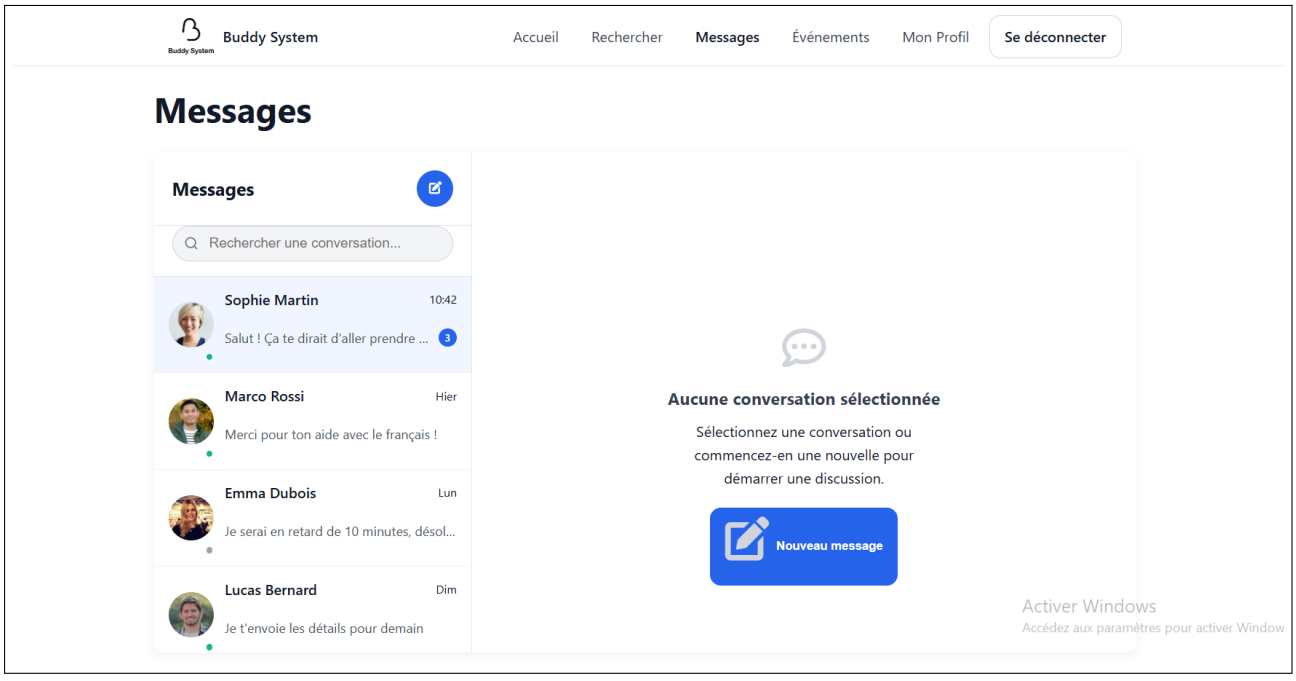



**Figure 48** – Maquette — *Page Messagerie*

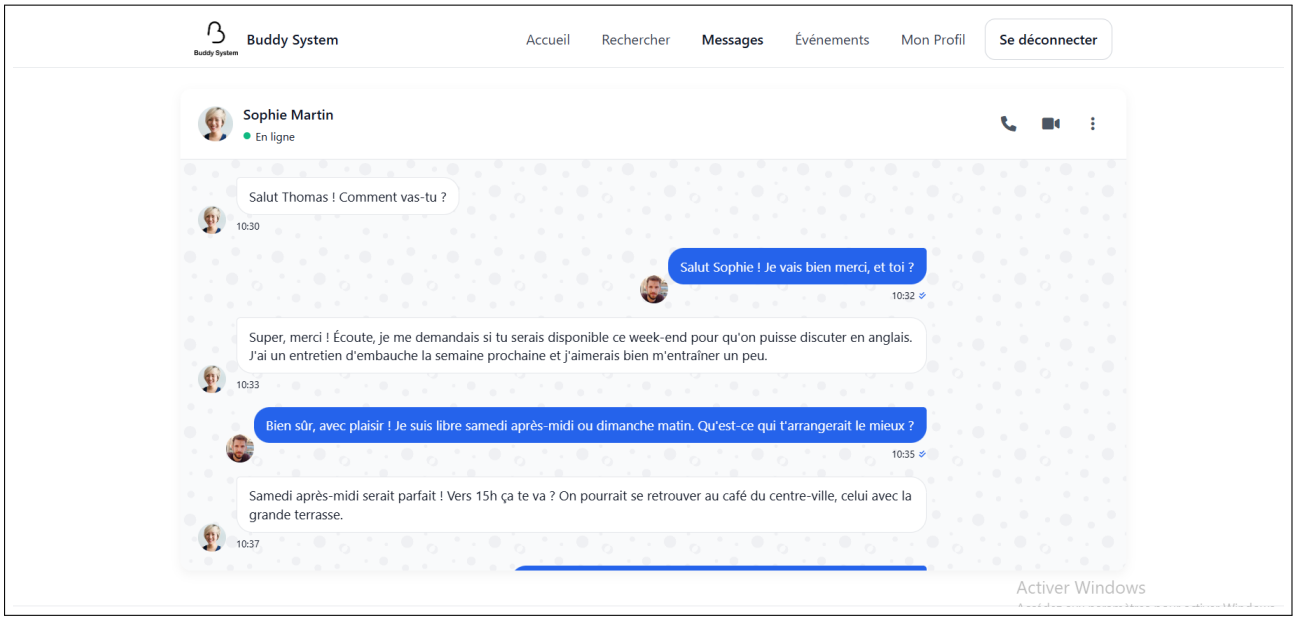



**FIGURE 49** – Maquette — *Page Conversation ouverte*

## Bilan du Sprint 3

**Synthèse :**

Ce troisième sprint a permis d'intégrer l'ensemble du *module de messagerie* au sein du modèle : conversations, messages et mécanisme de signalement. L'équipe s'est concentrée sur l'analyse détaillée des cas d'utilisation « envoyer un message », « démarrer une conversation » et « signaler un message ».

**Livrables produits :**

- MCD v3 incluant les entités *Message*, *Conversation* et *Signalement*, avec leurs associations (écrire, concerner, réaliser).
- MPD v3 cohérent avec la messagerie (idUtilisateur, idConversation, dates, statuts).
- Diagramme de classes v3 intégrant messages, conversations et signalements.
- Scénarios complets : *Envoyer un message*, *Démarrer une conversation*, *Signaler un message*.
- Diagrammes de séquence associés aux trois cas d'utilisation.
- Maquettes IHM : *Page Messagerie (liste des conversations)* et *Page Conversation ouverte*.
- Mise à jour du tableau MS Planner (planification + mêlées).

**Points à préciser ultérieurement :**

- Définir les règles de statut des conversations (ouverte, archivée, verrouillée).
- Préciser le comportement exact de la date de lecture des messages.
- Définir plus finement le cycle de vie d'un signalement (validation, modération, clôture).

**Décision pour la suite :**

Le Sprint 4 portera sur la modélisation du module *Événements* : création, inscription, désinscription et gestion des participations. Ce bloc fonctionnel s'appuiera sur les comptes utilisateurs déjà définis et constituera une nouvelle extension majeure du modèle.


# Sprint 4 : Événements et participations

## Objectif

Ce sprint avait pour objectif de modéliser l'ensemble des mécanismes liés aux *événements* et aux *participations*, en traitant les cas d'utilisation *Parcourir / S'inscrire à un événement*, *Créer un événement* et *Se désinscrire d'un événement*.

## Planification

La planification du Sprint 4 a été réalisée dans *MS Planner* à travers un ensemble de tâches structurées selon les activités principales du sprint, comme illustré dans la capture ci-dessous.

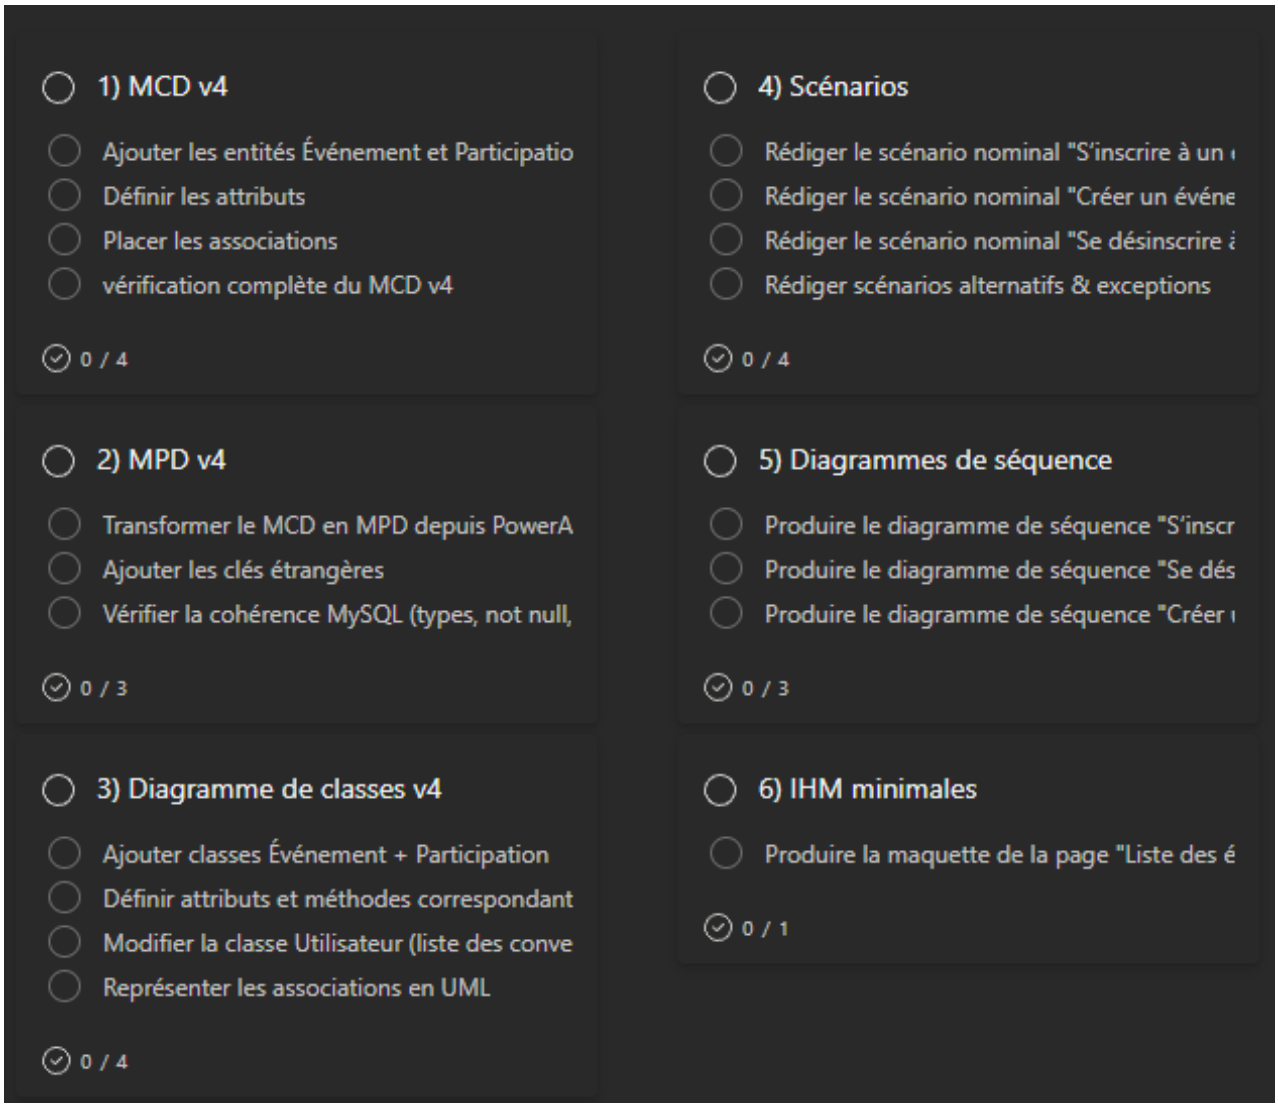


Planification initiale des tâches du Sprint 4 dans MS Planner.

## Mêlée 1

La première mêlée s'est tenue juste après la planification afin de lancer le Sprint 4 dans de bonnes conditions. L'objectif était d'attribuer clairement les tâches aux membres de l'équipe, de valider l'ordre de réalisation et de s'assurer que chacun dispose d'une première action concrète pour la journée suivante.

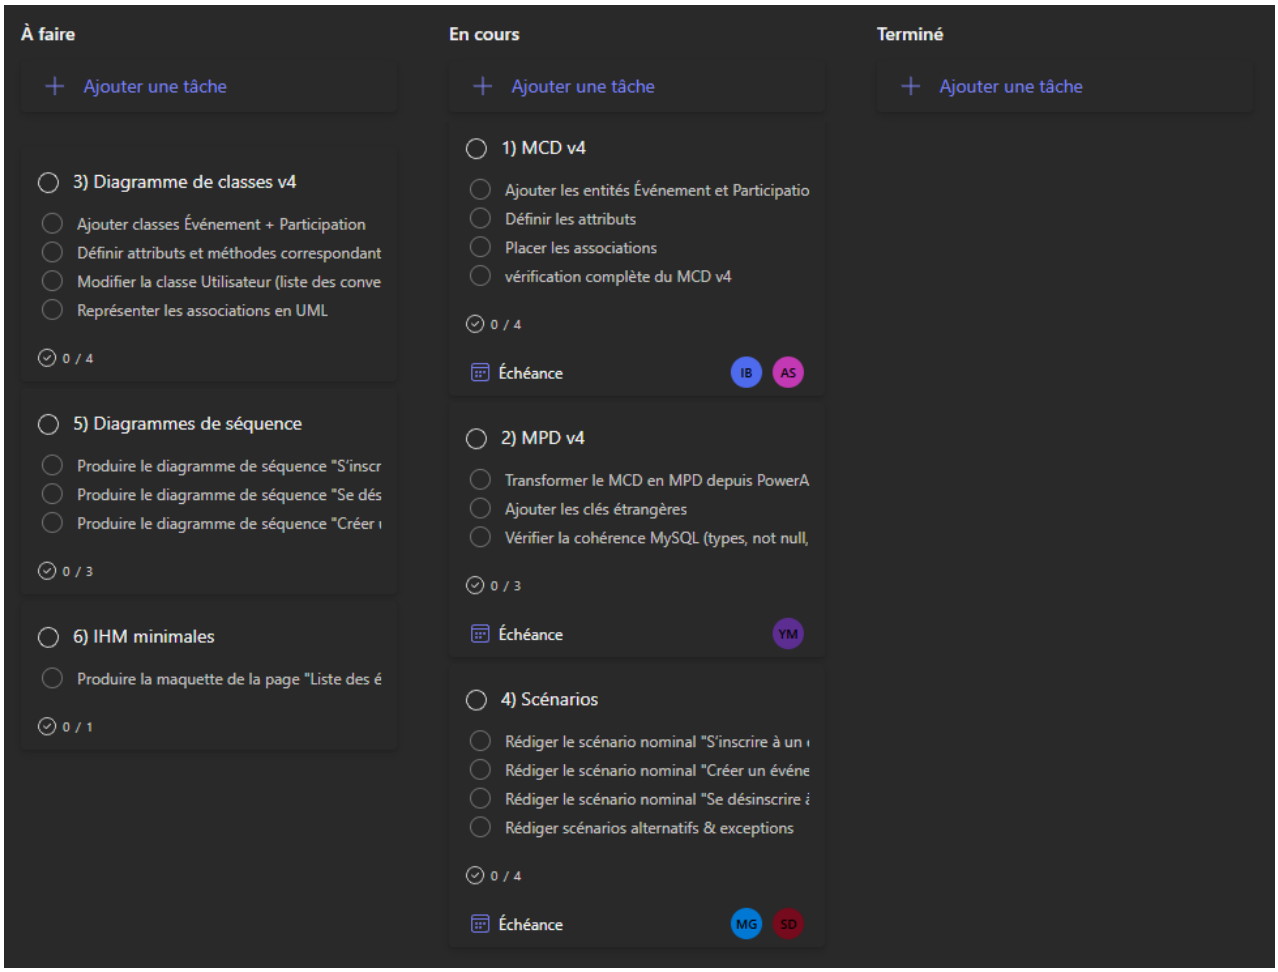



**Figure 50** – État du tableau Kanban après la mêlée 1

## Mêlée 2

Cette seconde mêlée a permis de faire un point d'avancement sur les tâches du Sprint 4 et d'ajuster la répartition du travail en fonction des éléments déjà réalisés.

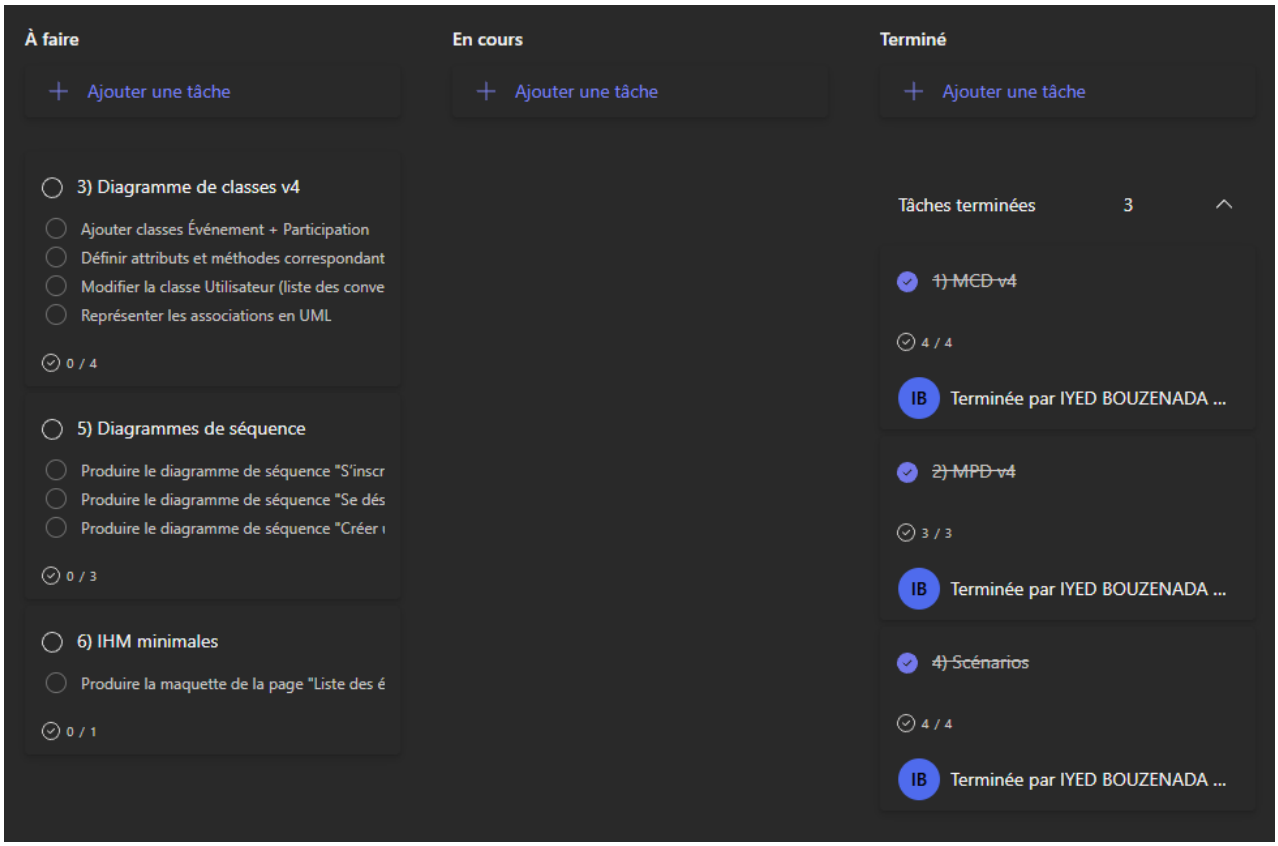



**Figure 51** – État du tableau Kanban avant la mêlée 2

**Livrables complétés au moment de cette deuxième mêlée :**

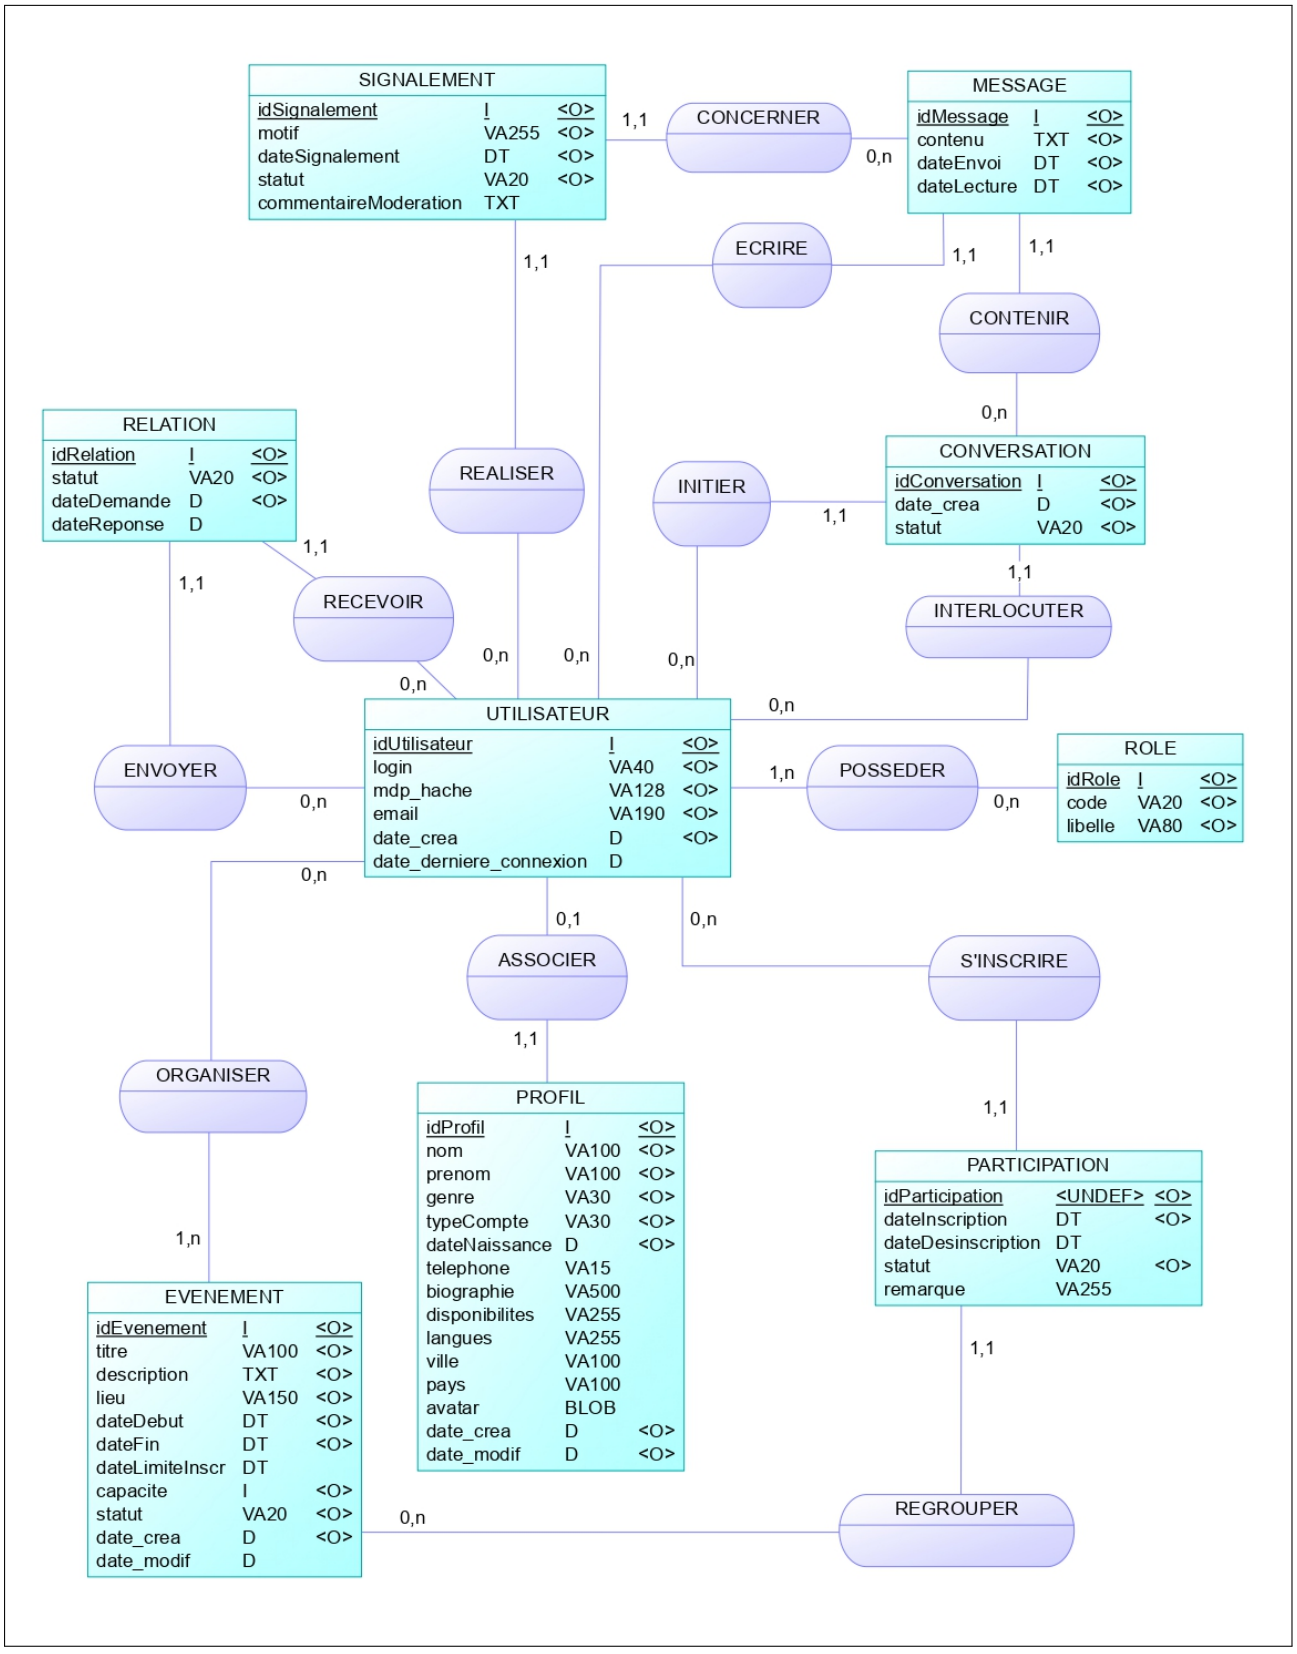



**Figure 52** – Quatrième version du MCD.

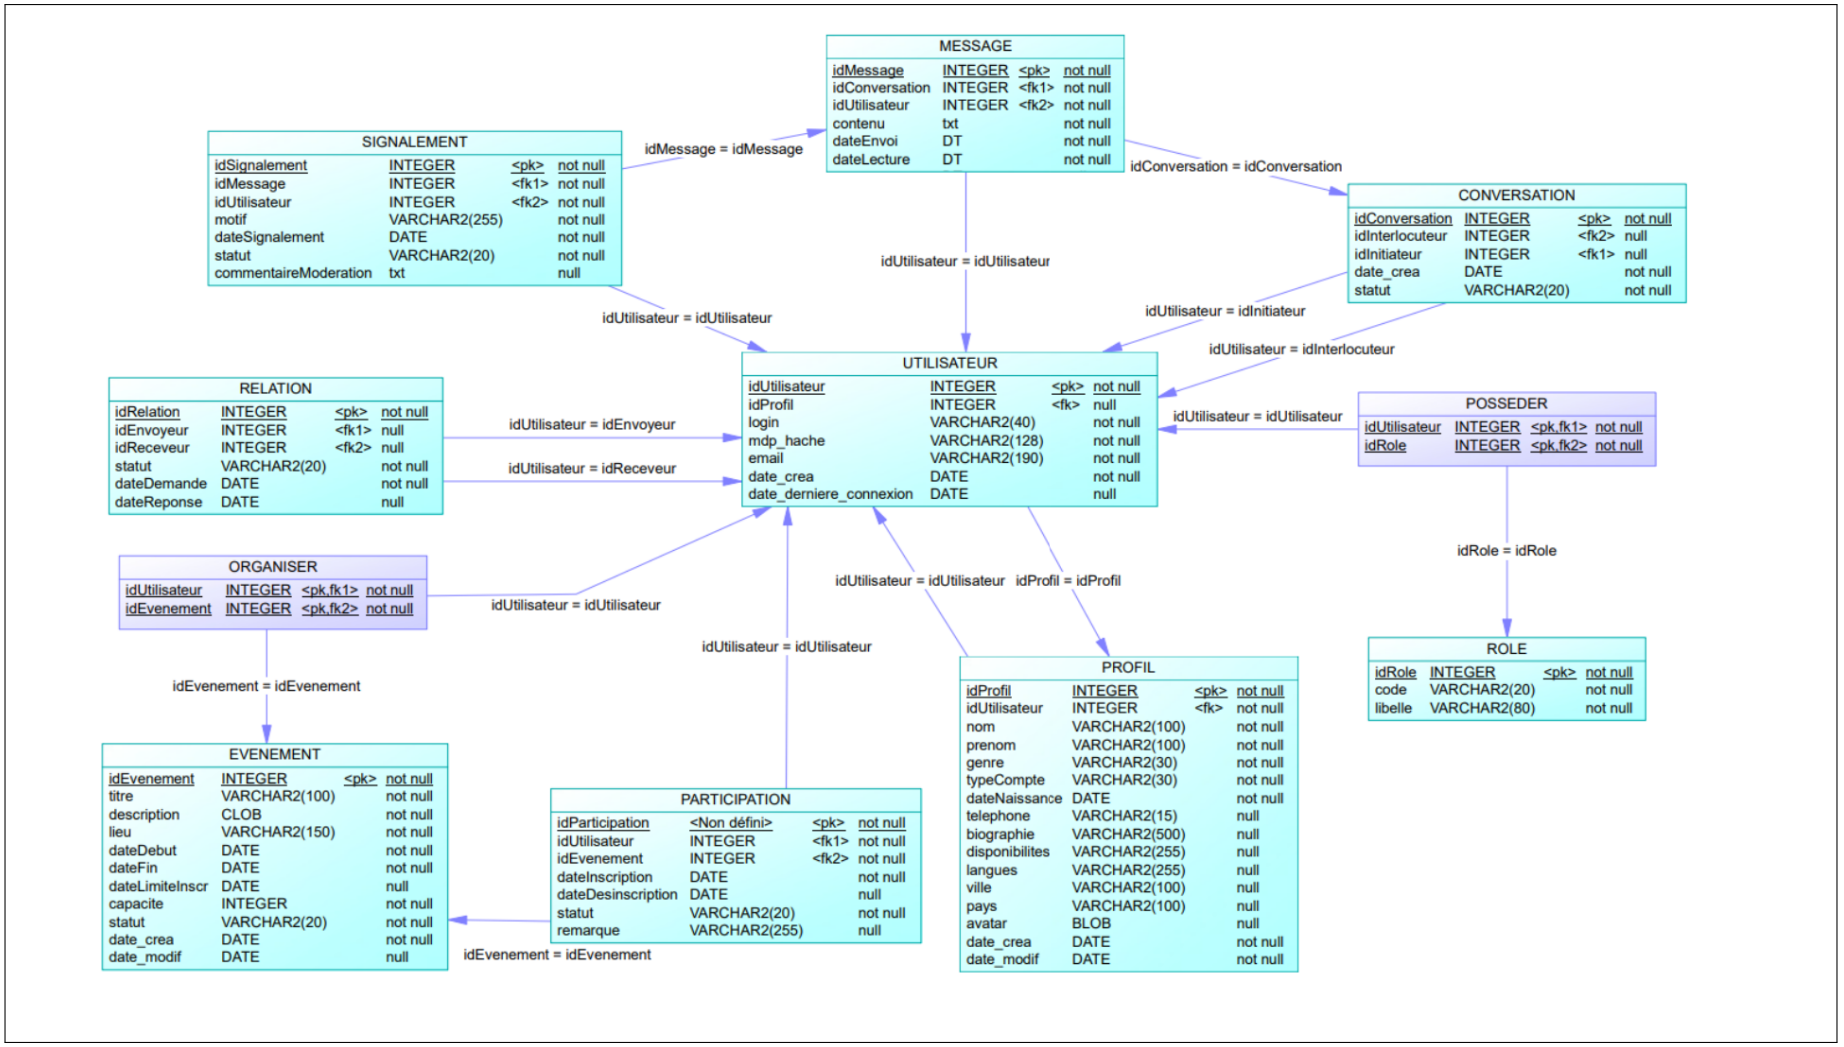



**Figure 53** – Quatrième version du MPD.

**Scénario nominal — S'inscrire à un événement**

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre la page de l'événement. |
| 2 | Il clique sur « S'inscrire ». |
| 3 | Le système vérifie : disponibilité des places, date limite d'inscription non dépassée, non-inscription préalable de l'utilisateur. |
| 4 | Le système enregistre une *Participation* (dateInscription, statut = « inscrit »). |
| 5 | Le système confirme l'inscription et met à jour la capacité restante. |

**Scénarios alternatifs — S'inscrire à un événement**

| Étape | Action |
|---|---|
| 3a | Plus de places disponibles : le système refuse l'inscription (ou propose la liste d'attente si prévue). |
| 3b | Date limite d'inscription dépassée : le système affiche un message d'indisponibilité. |
| 3c | Utilisateur déjà inscrit : le système empêche une double inscription. |
| 3d | Utilisateur non connecté : le système redirige vers la page de connexion. |

**Scénario d'exception — S'inscrire à un événement**

| Étape | Action |
|---|---|
| 4e | Erreur technique (BD/service indisponible) : le système affiche « Inscription temporairement indisponible, veuillez réessayer ». |

**Figure 54** – Scénarios — *S'inscrire à un événement*

**Scénario nominal — Créer un événement**

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre la page « Créer un événement ». |
| 2 | Il saisit les informations : titre, description, lieu, dates (début/fin), date limite d'inscription, capacité. |
| 3 | Le système valide les champs et la cohérence des dates (fin début, limiteInscr  début) et de la capacité ($> 0$). |
| 4 | Le système enregistre l'*Événement* (statut = « ouvert ») et crée l'entrée correspondante. |
| 5 | Le système confirme la création et redirige vers la page de l'événement. |

**Scénarios alternatifs — Créer un événement**

| Étape | Action |
|---|---|
| 3a | Champs manquants ou invalides : le système affiche les erreurs et bloque l'enregistrement. |
| 3b | Incohérence de dates (fin $<$ début, limiteInscr $>$ début) : le système refuse la création et demande correction. |
| 3c | Capacité non valide ($<= 0$) : le système refuse la création. |
| 3d | Utilisateur non autorisé (droits insuffisants) : le système refuse l'opération. |

**Scénario d'exception — Créer un événement**

| Étape | Action |
|---|---|
| 4e | Erreur technique (BD/service indisponible) : le système affiche « Création momentanément indisponible ». |

**Figure 55** – Scénarios — *Créer un événement*

**Scénario nominal — Se désinscrire d'un événement**

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'utilisateur ouvre la page de l'événement où il est inscrit. |
| 2 | Il clique sur « Se désinscrire ». |
| 3 | Le système vérifie que l'utilisateur est bien inscrit et que la désinscription est autorisée (événement non commencé, règle interne). |
| 4 | Le système met à jour la *Participation* (dateDésinscription, statut = « désinscrit ») et libère une place. |
| 5 | Le système confirme la désinscription (et, le cas échéant, notifie la prochaine personne en liste d'attente). |

**Scénarios alternatifs — Se désinscrire d'un événement**

| Étape | Action |
|---|---|
| 3a | L'utilisateur n'est pas inscrit : le système refuse l'action. |
| 3b | L'événement a déjà commencé (ou désinscription tardive interdite) : le système refuse la demande. |
| 3c | Utilisateur non connecté : le système redirige vers la page de connexion. |

**Scénario d'exception — Se désinscrire d'un événement**

| Étape | Action |
|---|---|
| 4e | Erreur technique (BD/service indisponible) : le système affiche « Désinscription temporairement indisponible ». |

**Figure 56** – Scénarios — *Se désinscrire d'un événement*

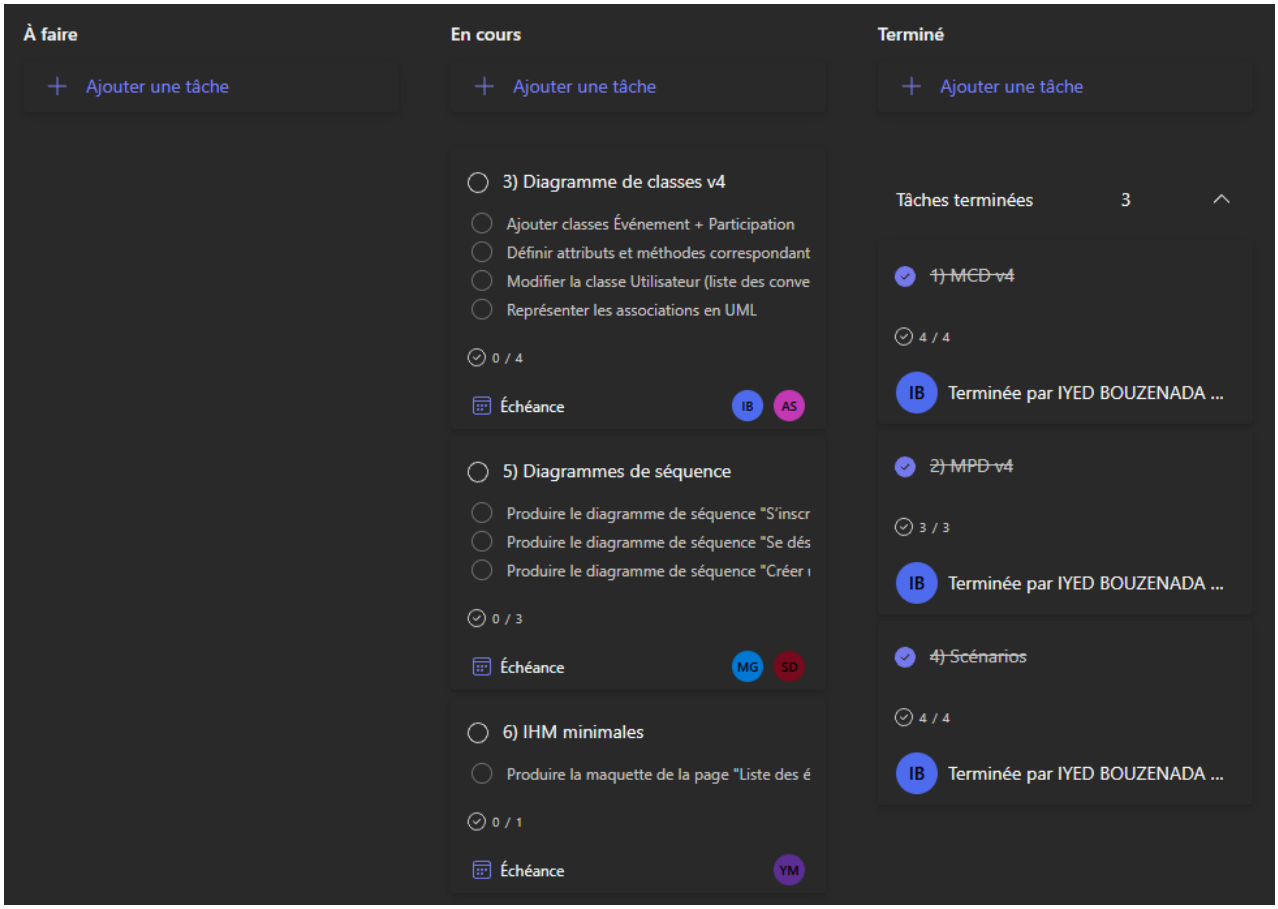



**Figure 57** – État du tableau Kanban après la mêlée 2

## Mêlée 3

À ce stade, l'ensemble des tâches du Sprint 4 apparaît comme complété, et tous les livrables prévus ont été produits.

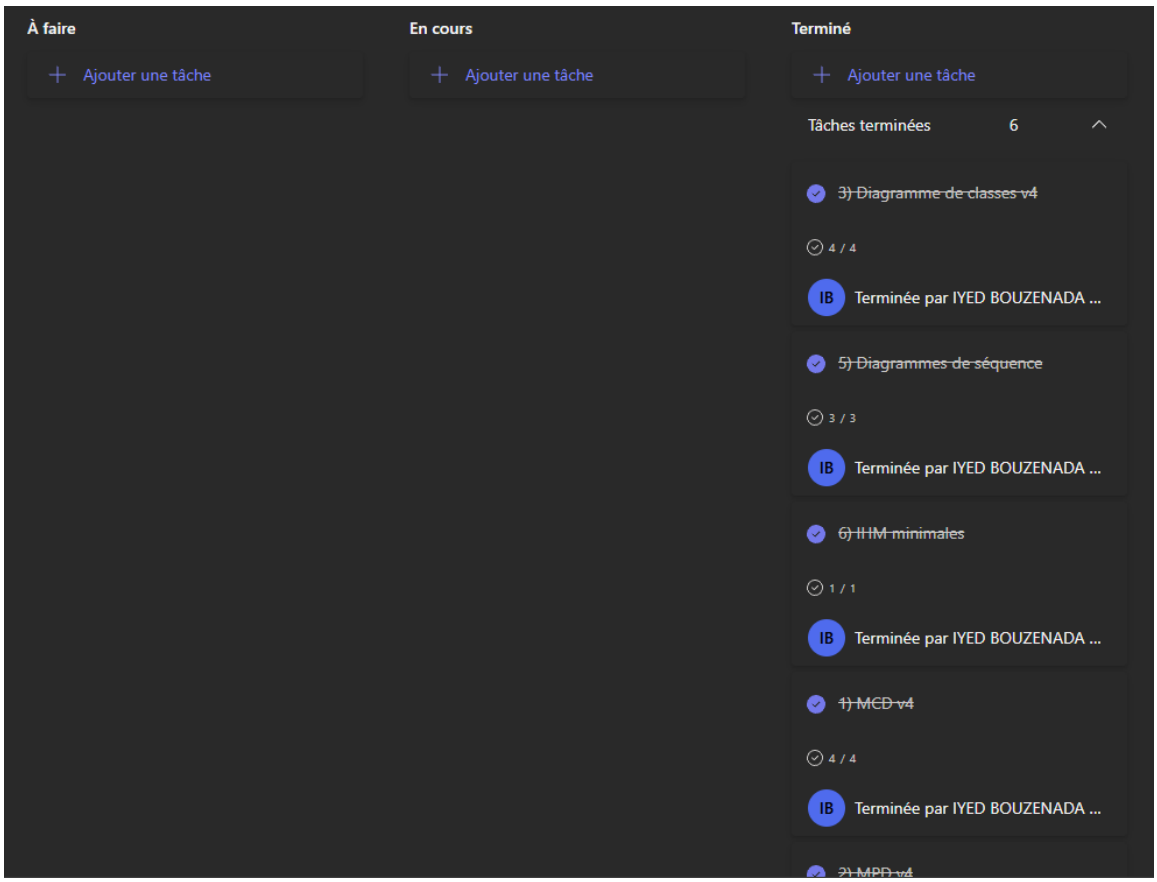



**Figure 58** – État du tableau Kanban avant la mêlée 3

**Livrables complétés au moment de cette troisième mêlée :**

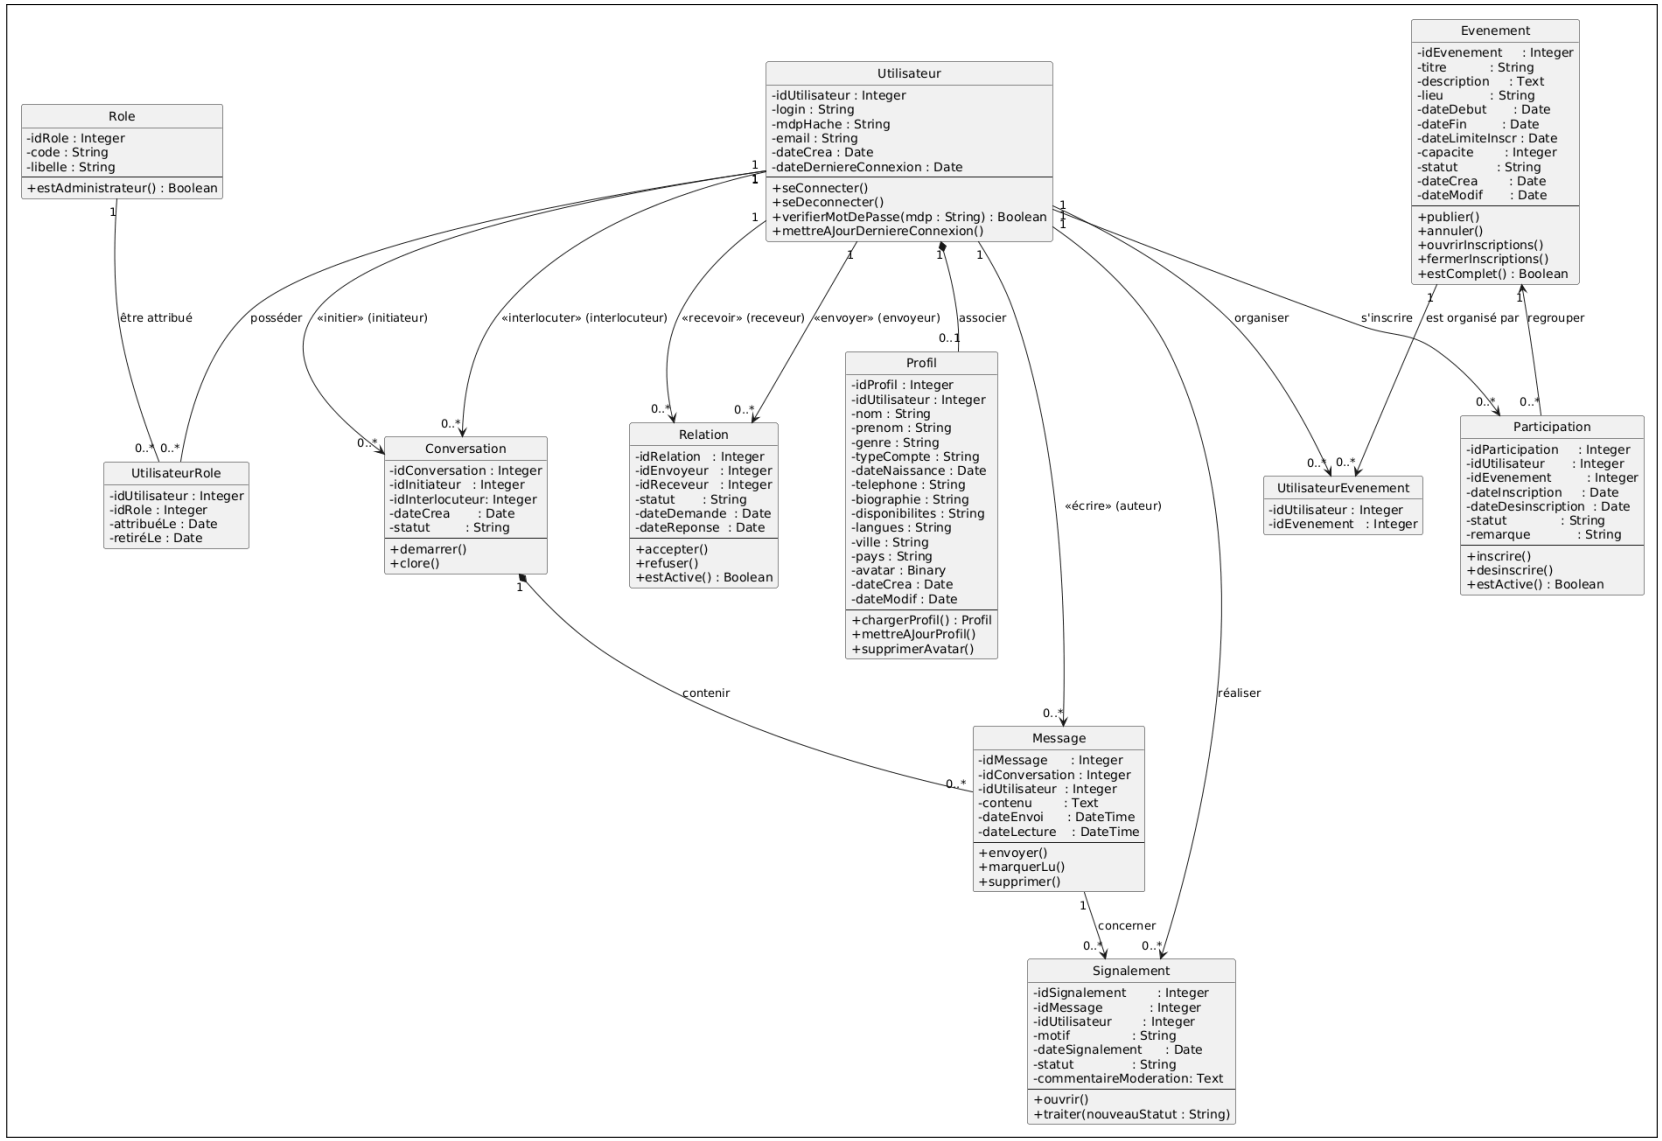



**Figure 59** – Diagramme de classes

Afin d'améliorer la lisibilité générale du diagramme de classes, les notes explicatives initialement présentes dans la version annotée ont été retirées. Leur présence directement sur le schéma surchargeait visuellement la représentation UML et rendait l'analyse plus difficile, en particulier lors de l'impression ou de la consultation en format réduit.

Pour conserver néanmoins les précisions essentielles du modèle, les principales contraintes décrites dans ces notes sont rappelées ci-dessous de manière synthétique :

— **Utilisateur** : les attributs *login* et *email* sont soumis à une contrainte d'unicité. Le *Profil* dépend du cycle de vie d'un utilisateur.

— **Relation** : le statut est limité à *en_ attente*, *acceptee*, *refusee*. Une relation référence toujours un envoyeur et un receveur.

— **Conversation** : deux rôles sont distingués (*initiateur* et *interlocuteur*). Le statut peut être *ouverte* ou *cloturee*.

— **Message** : la date de lecture peut être nulle tant que le message n'a pas été lu.

— **Signalement** : le statut est restreint à *en_ attente*, *valide* ou *rejete*.

— **Événement et Participation** : la participation est liée à un seul utilisateur et un seul événement, avec gestion d'une date limite d'inscription, d'une capacité maximale et d'un statut d'inscription.

Cette réorganisation permet d'obtenir un diagramme plus épuré tout en préservant l'ensemble des règles d'intégrité du modèle.

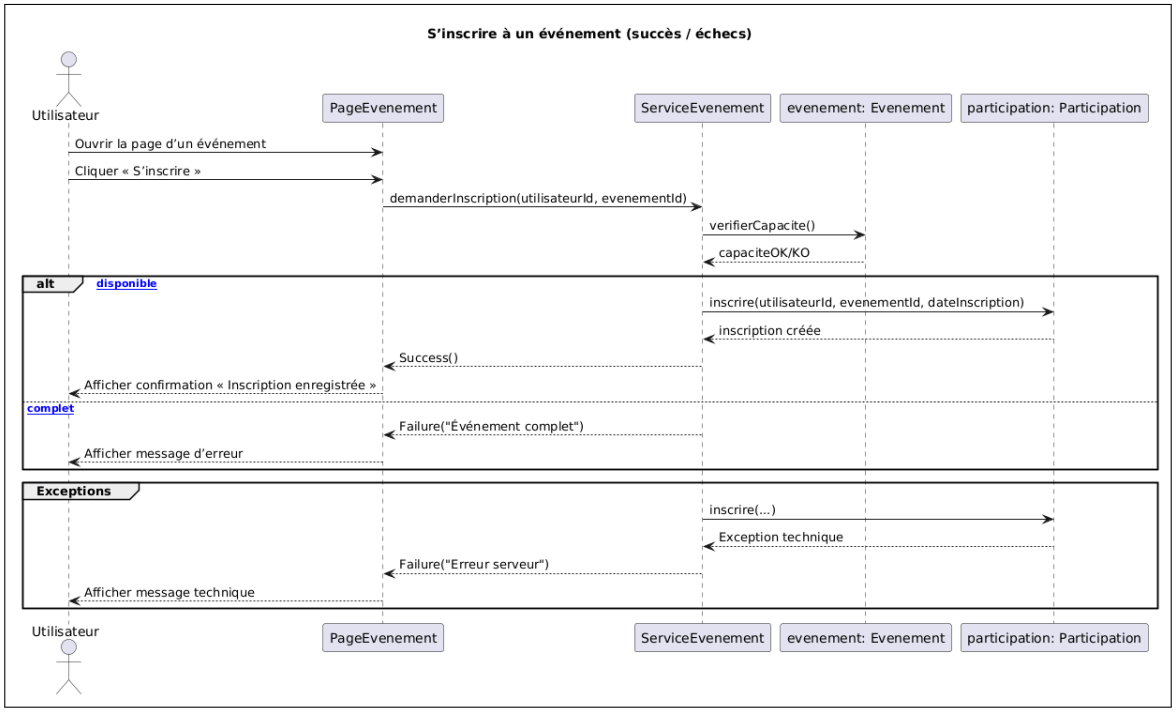



**Figure 60** – Diagramme de Séquence — *S'inscrire à un événement*

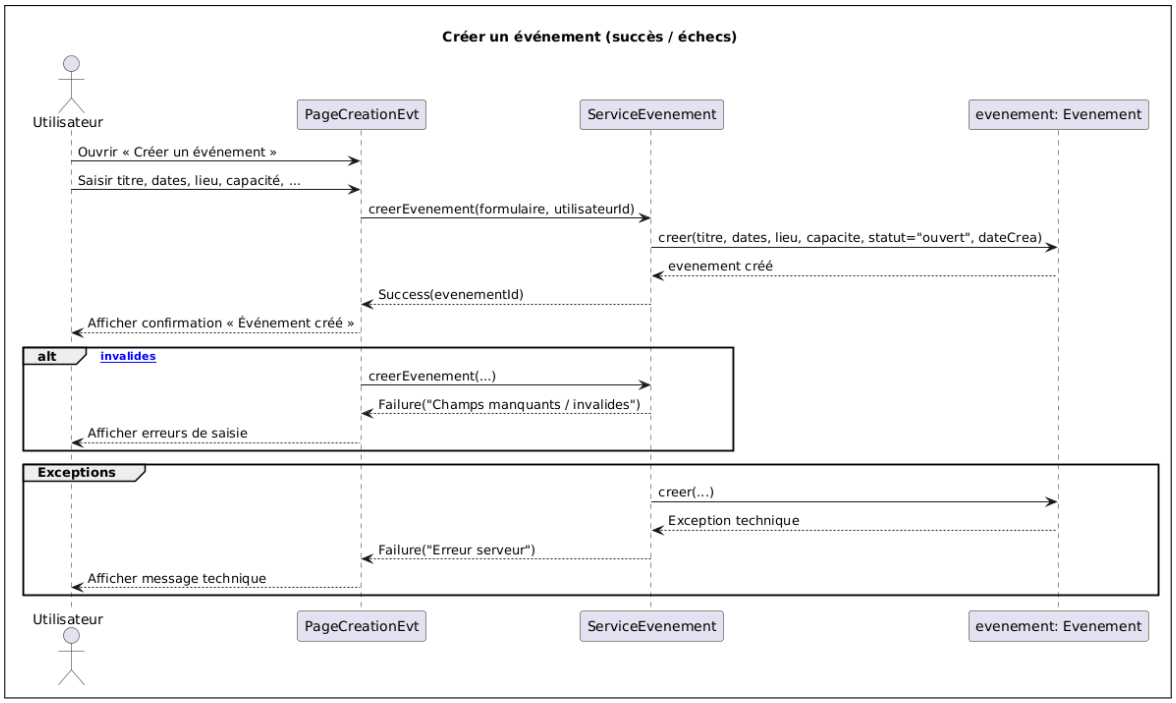



**FIGURE 61** – Diagramme de Séquence — *Créer un événement*

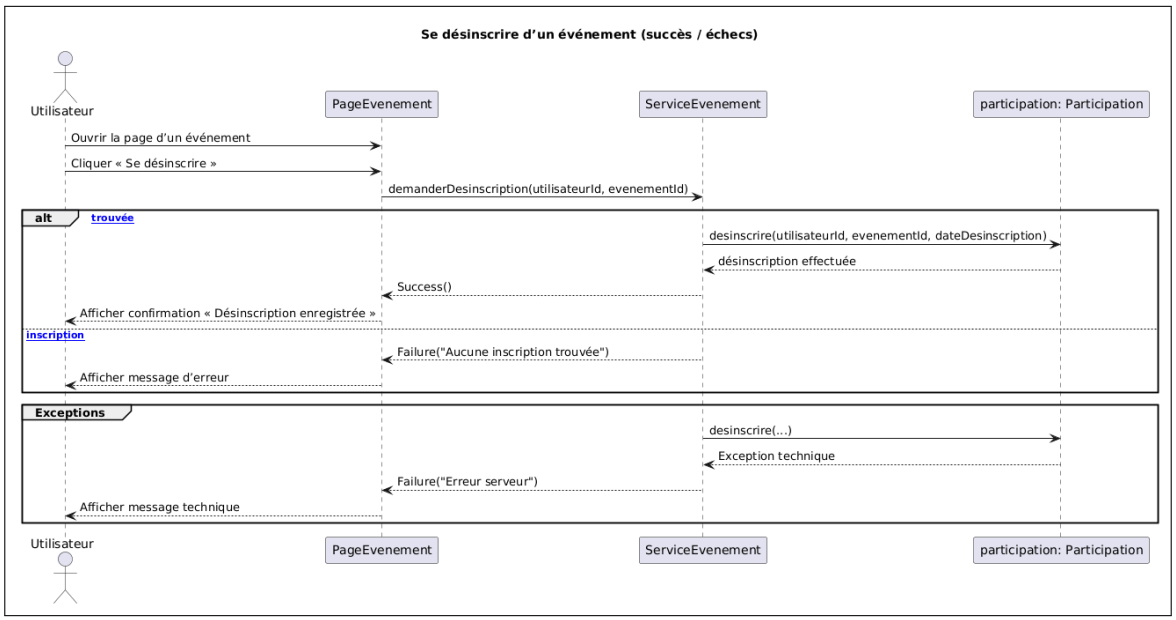



**FIGURE 62** – Diagramme de Séquence — *Se désinscrire d'un événement*

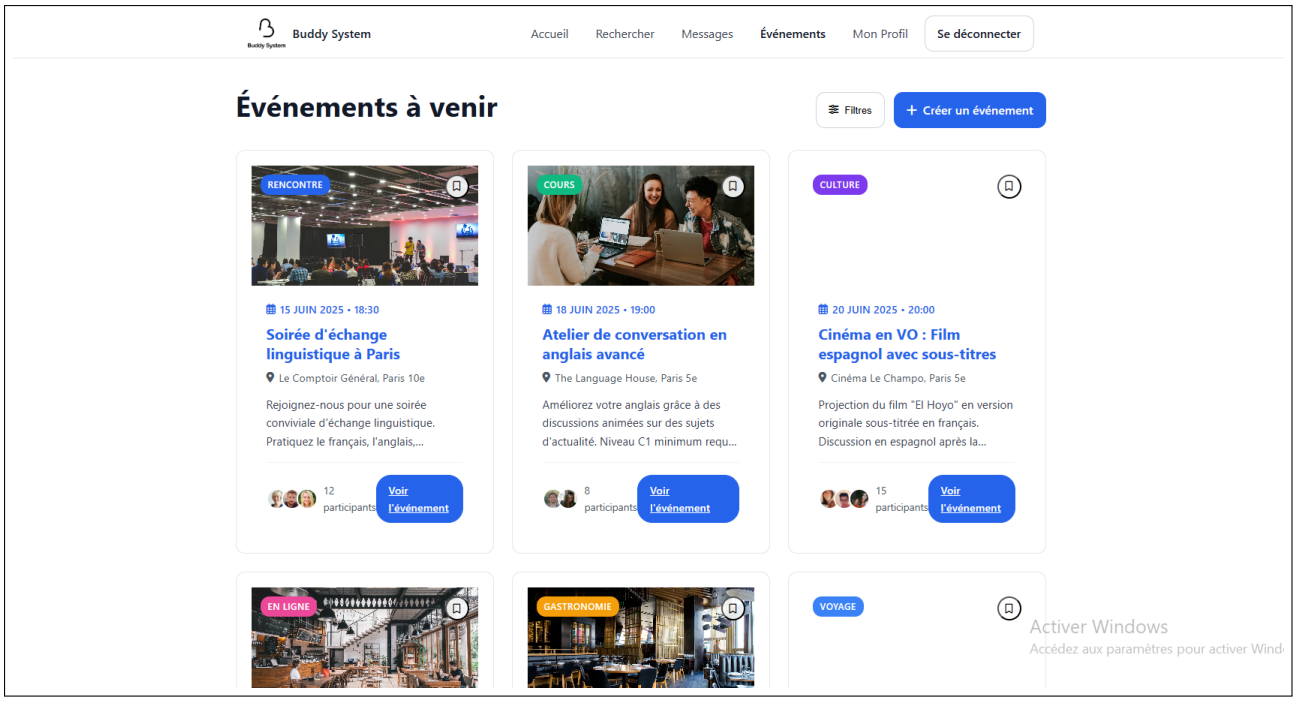



**Figure 63** – Maquette — *Page Liste des Événements*

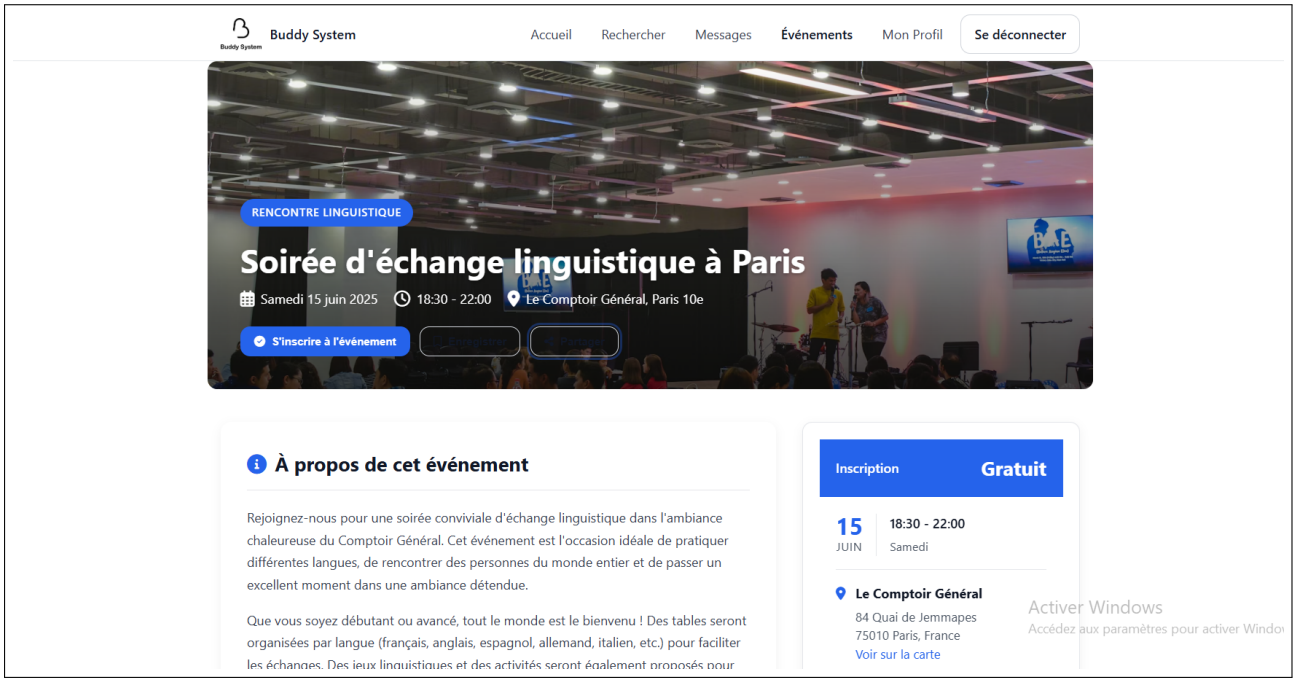



**Figure 64** – Maquette — *Page Détail Événement*

## Bilan du Sprint 4

**Synthèse :**

Ce quatrième sprint a permis d'intégrer le *module Événements* au sein du système, en ajoutant la gestion complète des événements, de leur organisation et de la participation des utilisateurs. L'équipe s'est concentrée sur les cas d'utilisation « s'inscrire à un événement », « créer un événement » et « se désinscrire d'un événement », ce qui a conduit à enrichir significativement la structure du modèle conceptuel et logique.

**Livrables produits :**

- MCD v4 intégrant les entités *Événement* et *Participation*, ainsi que les associations correspondantes (*organiser*, *s'inscrire*, *regrouper*).
- MPD v4 conforme au modèle conceptuel (clés étrangères, contraintes, statuts, dates).
- Diagramme de classes v4 incluant les classes *Événement* et *Participation* et l'adaptation des méthodes liées aux inscriptions.
- Scénarios complets : *S'inscrire à un événement*, *Créer un événement*, *Se désinscrire d'un événement*.
- Diagrammes de séquence associés aux trois cas d'utilisation.
- Maquette IHM minimale : *Page Messagerie / Événements* adaptée pour l'affichage et la gestion des inscriptions.
- Mise à jour du tableau MS Planner (planification + mêlées).

**Points à préciser ultérieurement :**

- Définir les règles de gestion des capacités (liste d'attente, fermeture automatique des inscriptions).
- Préciser les conditions de modification ou d'annulation d'un événement par son organisateur.
- Étendre la notion de participation pour intégrer des cas futurs (validation par l'organisateur, statut « présent », etc.).

**Décision pour la suite :**

Le Sprint 5 portera sur le module *Administration & rôles avancés* : gestion des comptes et des rôles (permissions), modération des contenus, et validation des événements.


# Sprint 5 : Administration & rôles avancés

## Objectif

Ce sprint avait pour objectif de modéliser la logique d'*administration* du système : **gérer les comptes et les rôles**, **modérer les contenus signalés** et **valider la création des événements**.

## Planification

La planification du Sprint 5 a été réalisée dans *MS Planner* comme pour les sprints précédents .

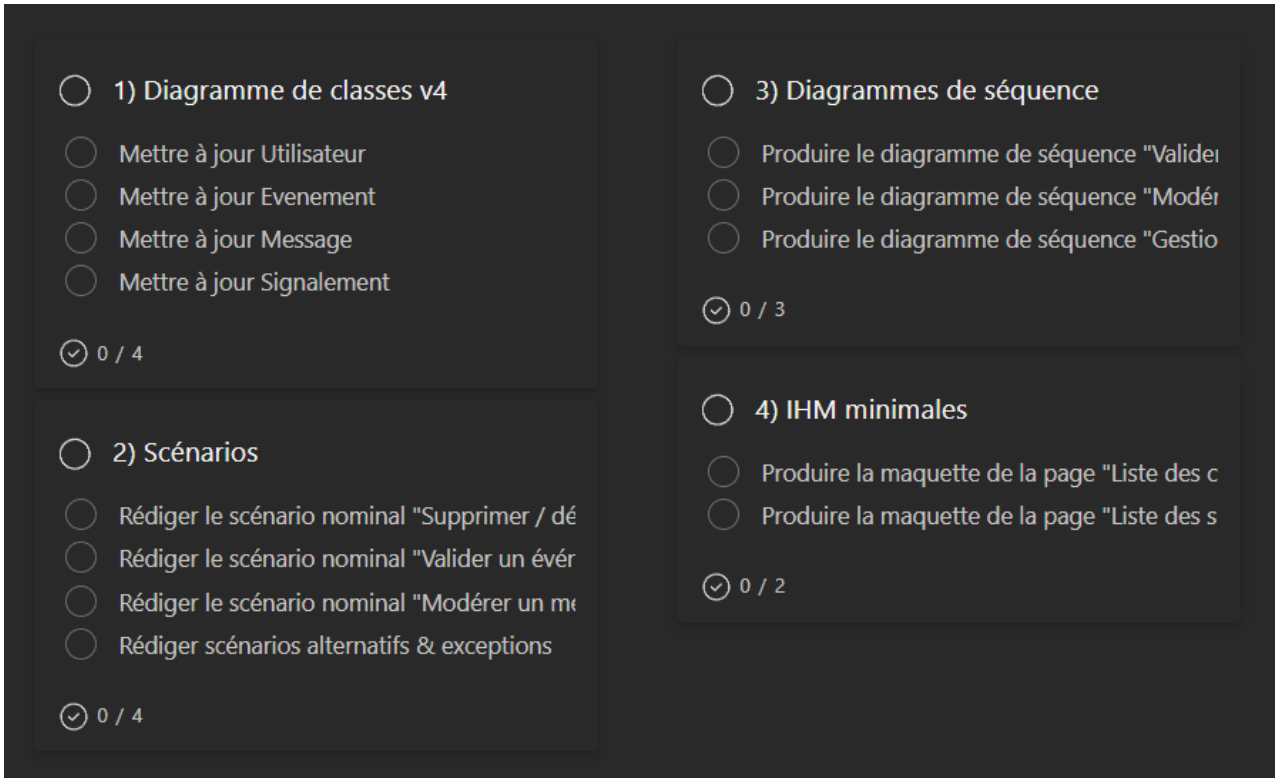


Planification initiale des tâches du Sprint 5 dans MS Planner.

## Mêlée 1

La première mêlée a permis d'assigner les tâches (comptes/rôles, modération, validation d'événements) et de fixer l'ordre de réalisation pour obtenir rapidement des premiers livrables concrets.

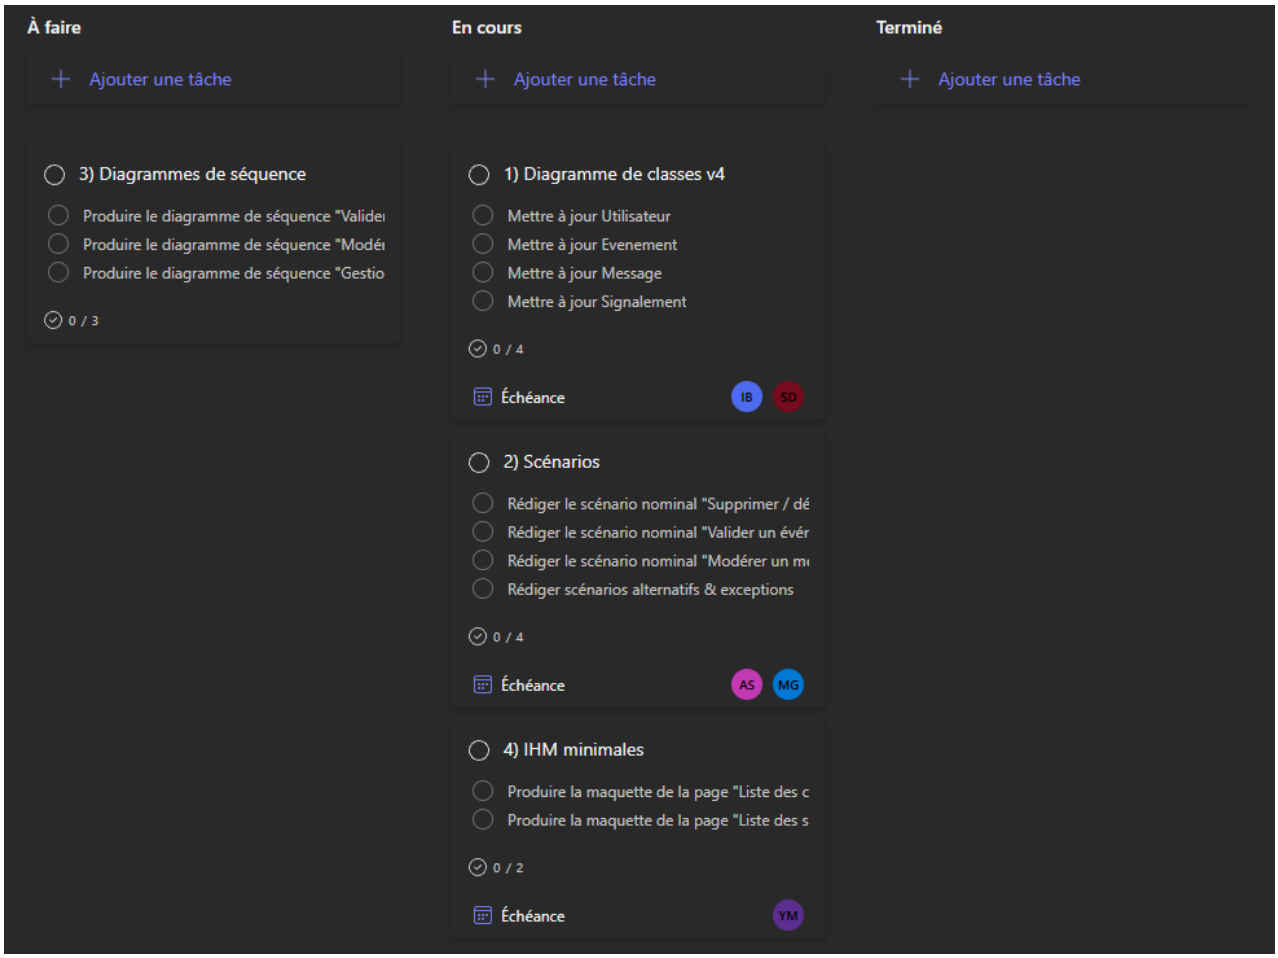



**Figure 65** – État du tableau Kanban après la mêlée 1

## Mêlée 2

Cette seconde mêlée a servi à faire un point d'avancement, à redistribuer la charge et à valider les enchaînements entre scénarios et séquences (suppression/désactivation de compte, workflow de validation d'événement, modération d'un message signalé).

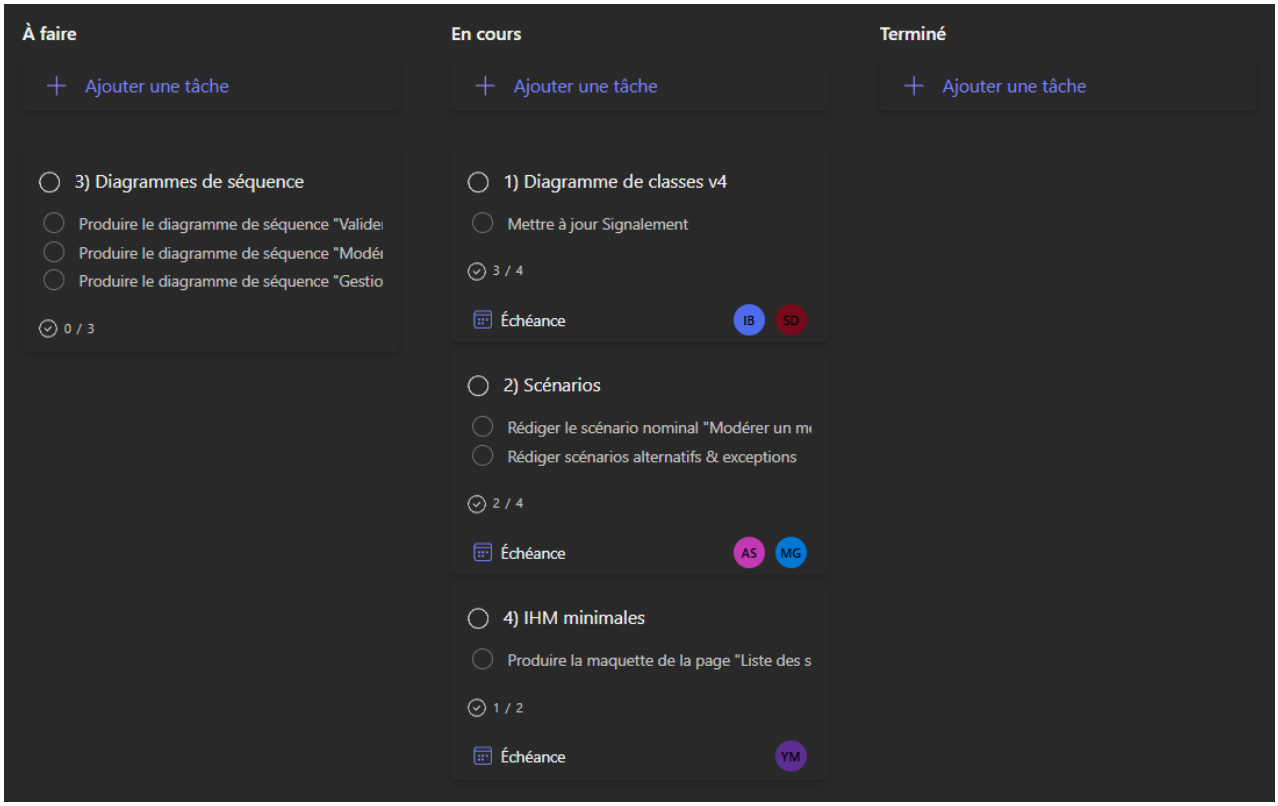



**Figure 66** – État du tableau Kanban avant la mêlée 2

**Livrables complétés au moment de cette deuxième mêlée :**

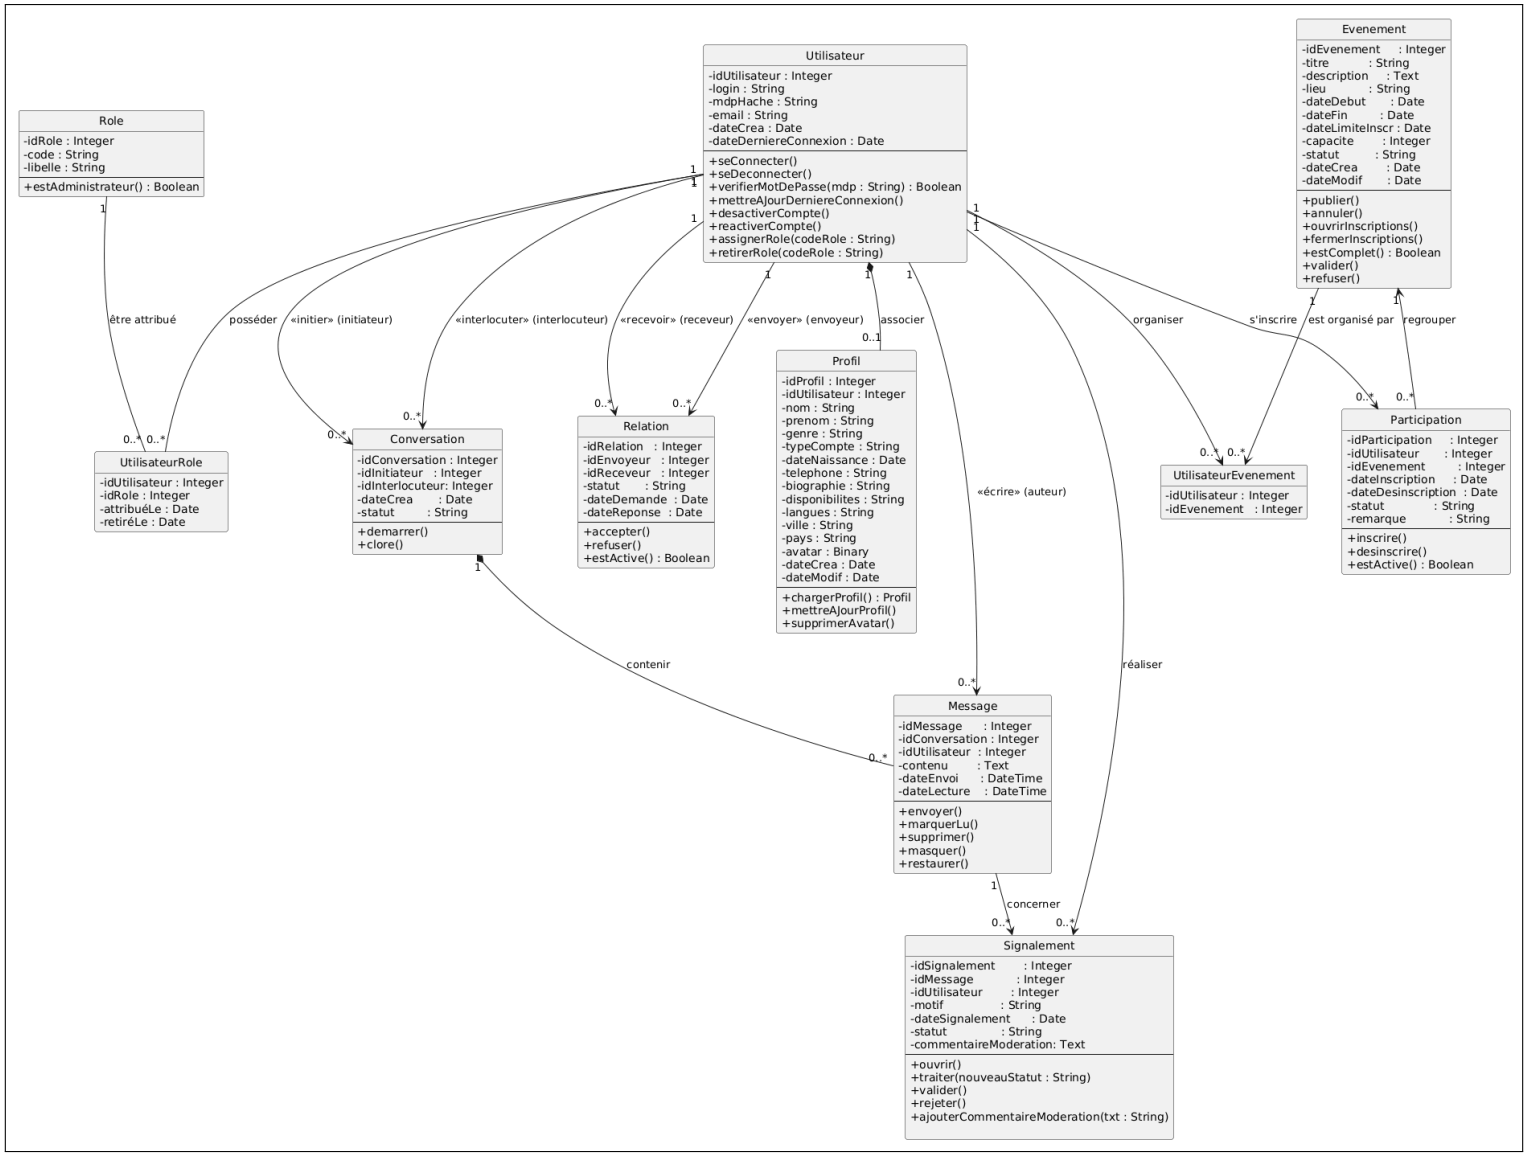



**Figure 67** – Diagramme de classes

**Table 1** – Scénario nominal — Supprimer / désactiver un compte

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'administrateur ouvre la page « Gestion des comptes ». |
| 2 | Il recherche un utilisateur et consulte sa fiche détaillée. |
| 3 | Il clique sur « Désactiver le compte » ou « Supprimer (soft delete) ». |
| 4 | Le système affiche une demande de confirmation. |
| 5 | L'administrateur confirme son choix. |
| 6 | Le système met à jour le statut du compte (désactivé ou supprimé). |
| 7 | Le système affiche un message de confirmation. |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — Supprimer / désactiver un compte

| Étape | Action |
|---|---|
| 2a | Aucun utilisateur ne correspond à la recherche : le système n'affiche aucun résultat. |
| 3a | Le compte est déjà désactivé : seule l'option « Réactiver » est disponible. |
| 3b | Le compte appartient à un super-administrateur : le système interdit la modification. |

**Table 3** – Scénario d'exception — Supprimer / désactiver un compte

| Étape | Action |
|---|---|
| 5e | Erreur serveur : l'opération échoue et le système affiche « Action impossible pour le moment ». |

**Figure 68** – Scénarios — *Supprimer / Désactiver un compte*

**Table 1** – Scénario nominal — Valider un événement

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | L'administrateur ouvre la section « Événements en attente ». |
| 2 | Il sélectionne un événement et consulte ses détails. |
| 3 | Il clique sur « Valider l'événement ». |
| 4 | Le système affiche une confirmation. |
| 5 | L'administrateur confirme. |
| 6 | Le système change le statut en « validé » et enregistre la décision. |
| 7 | Le système affiche la confirmation de validation. |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — Valider un événement

| Étape | Action |
|---|---|
| 3a | L'administrateur choisit « Refuser » : le système demande un motif puis enregistre le statut « refusé ». |
| 3b | L'administrateur choisit « À corriger » : le système demande un commentaire et marque l'événement « à corriger ». |
| 2c | L'événement comporte une date déjà passée : le système interdit la validation. |

**Table 3** – Scénario d'exception — Valider un événement

| Étape | Action |
|---|---|
| 5e | Défaillance système : impossible d'enregistrer la validation, le système affiche un message d'erreur. |

**Figure 69** – Scénarios — *Valider un événement*

**Table 1** – Scénario nominal — Modérer un message signalé

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | Le modérateur ouvre la page « Signalements en attente ». |
| 2 | Il sélectionne un signalement et consulte le message associé. |
| 3 | Il choisit une action : « Supprimer le message » ou « Rejeter le signalement ». |
| 4 | Il saisit un commentaire de modération puis confirme. |
| 5 | Le système applique la décision et met à jour le statut du signalement. |
| 6 | Le système affiche « Signalement traité ». |

**Table 2** – Scénarios alternatifs — Modérer un message signalé

| Étape | Action |
|---|---|
| 2a | Le message est déjà supprimé : seule l'option « Clore le signalement » est proposée. |
| 3b | Plusieurs signalements concernent le même message : le système applique la décision à tous les signalements liés. |

**Table 3** – Scénario d'exception — Modérer un message signalé

| Étape | Action |
|---|---|
| 4e | Erreur système : le traitement ne peut pas être appliqué, le système affiche « Opération échouée ». |

**Figure 70** – Scénarios — *Modérer un message signalé*

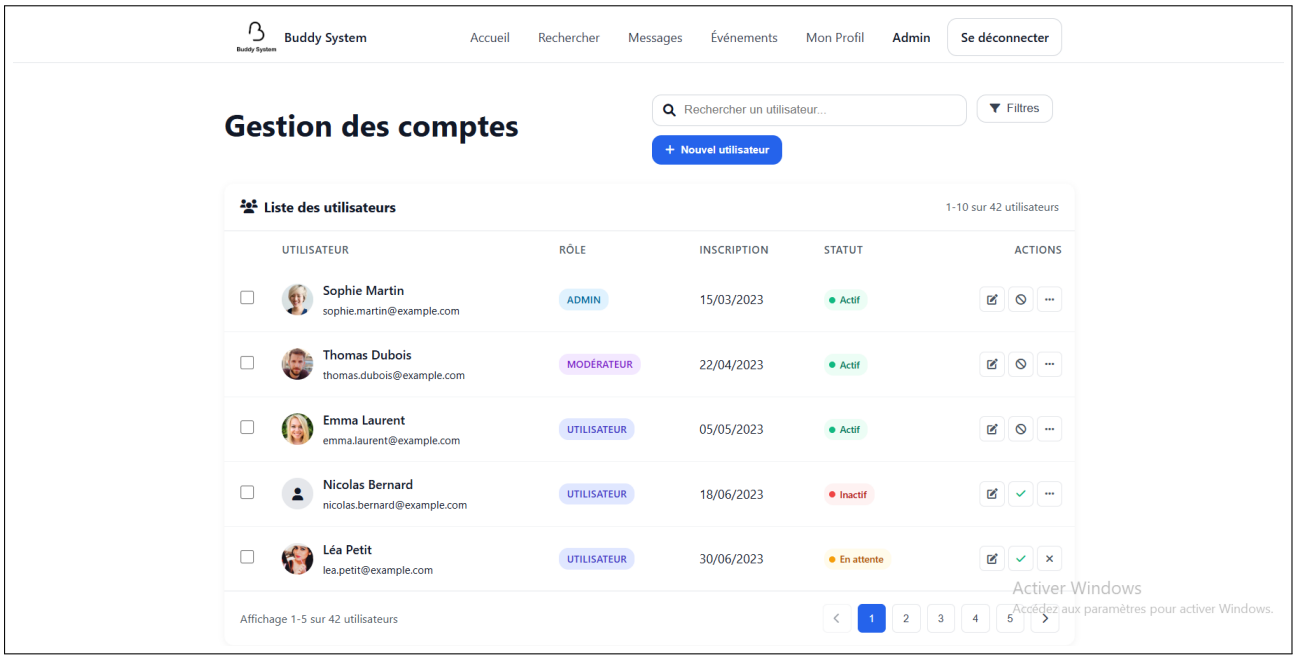



**Figure 71** – Maquette — *Page Admin - Liste des comptes*

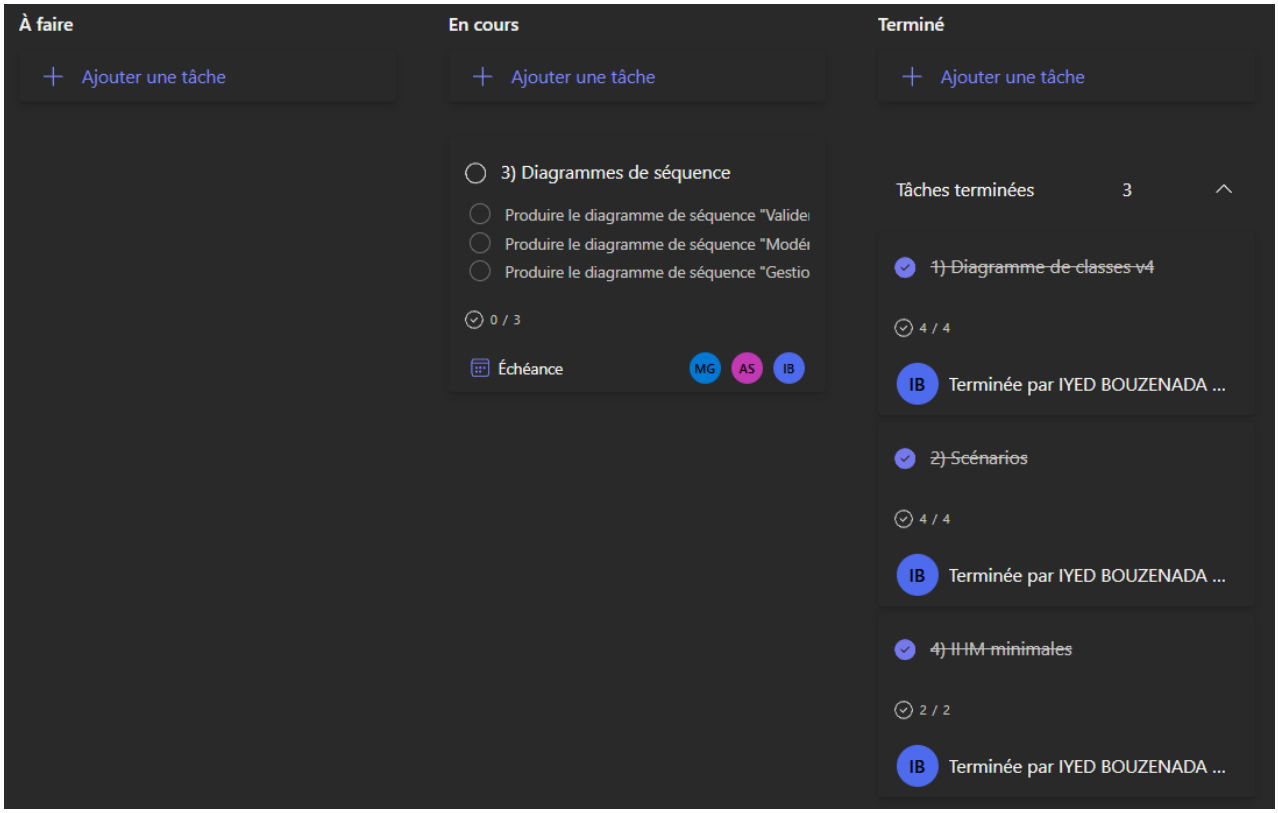



**Figure 72** – État du tableau Kanban après la mêlée 2

## Mêlée 3

À ce stade, l'ensemble des tâches du Sprint 5 apparaît comme complété, et tous les livrables prévus ont été produits.

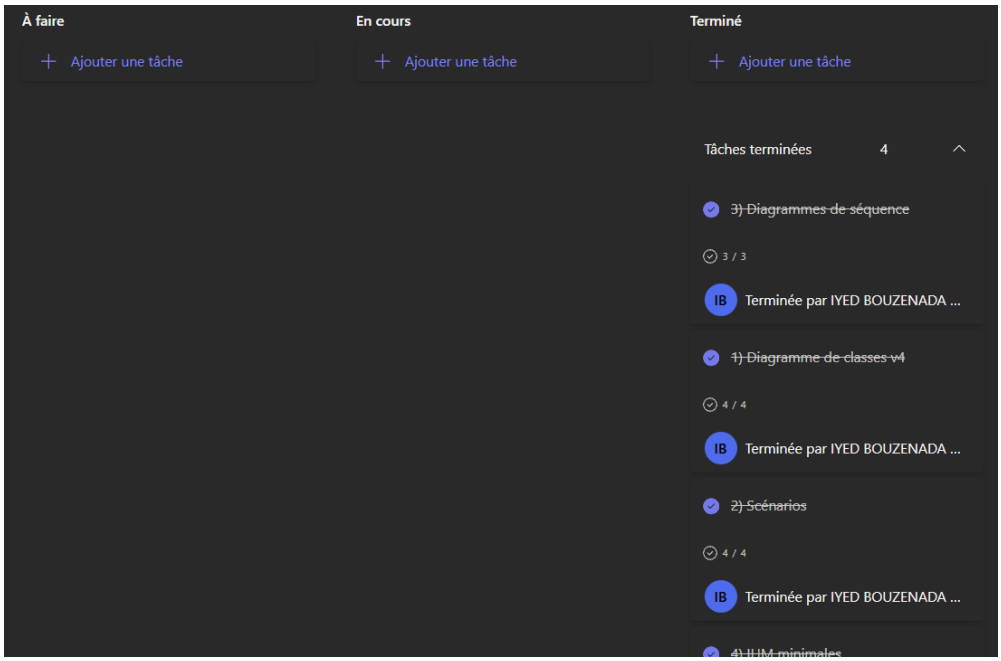



**Figure 73** – État du tableau Kanban avant la mêlée 3

**Livrables complétés au moment de cette troisième mêlée :**

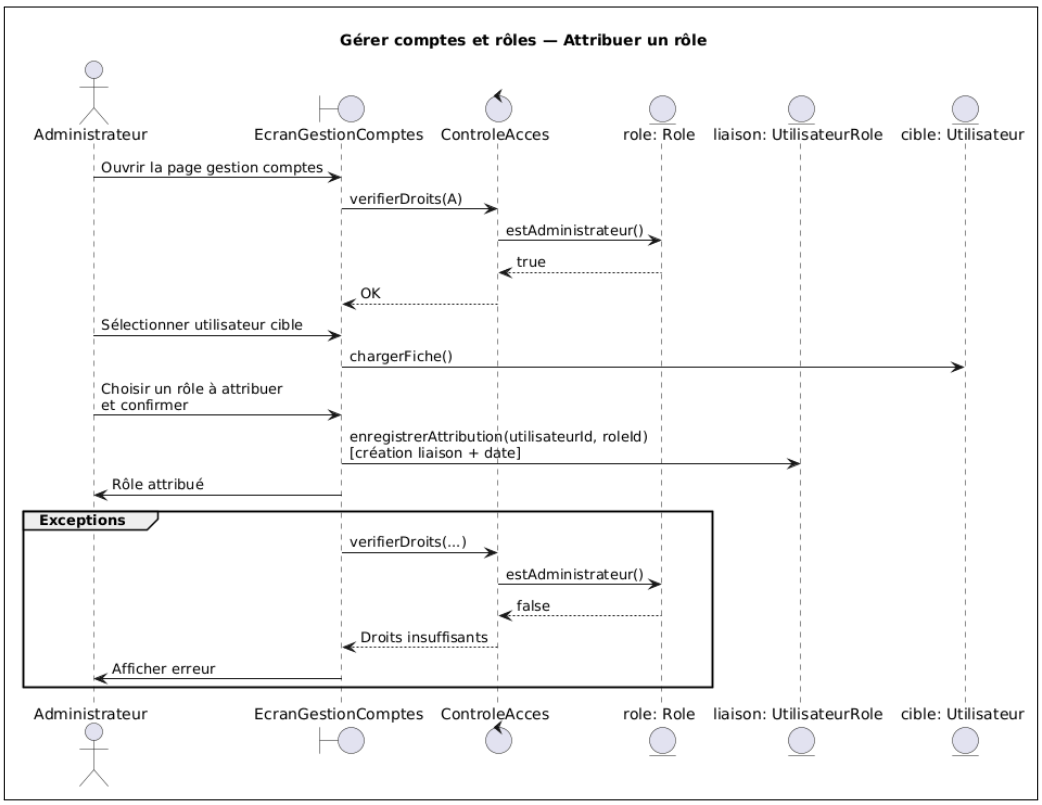



**Figure 74** – Diagramme de Séquence — *Gérer comptes et rôles - Attribuer un rôle*

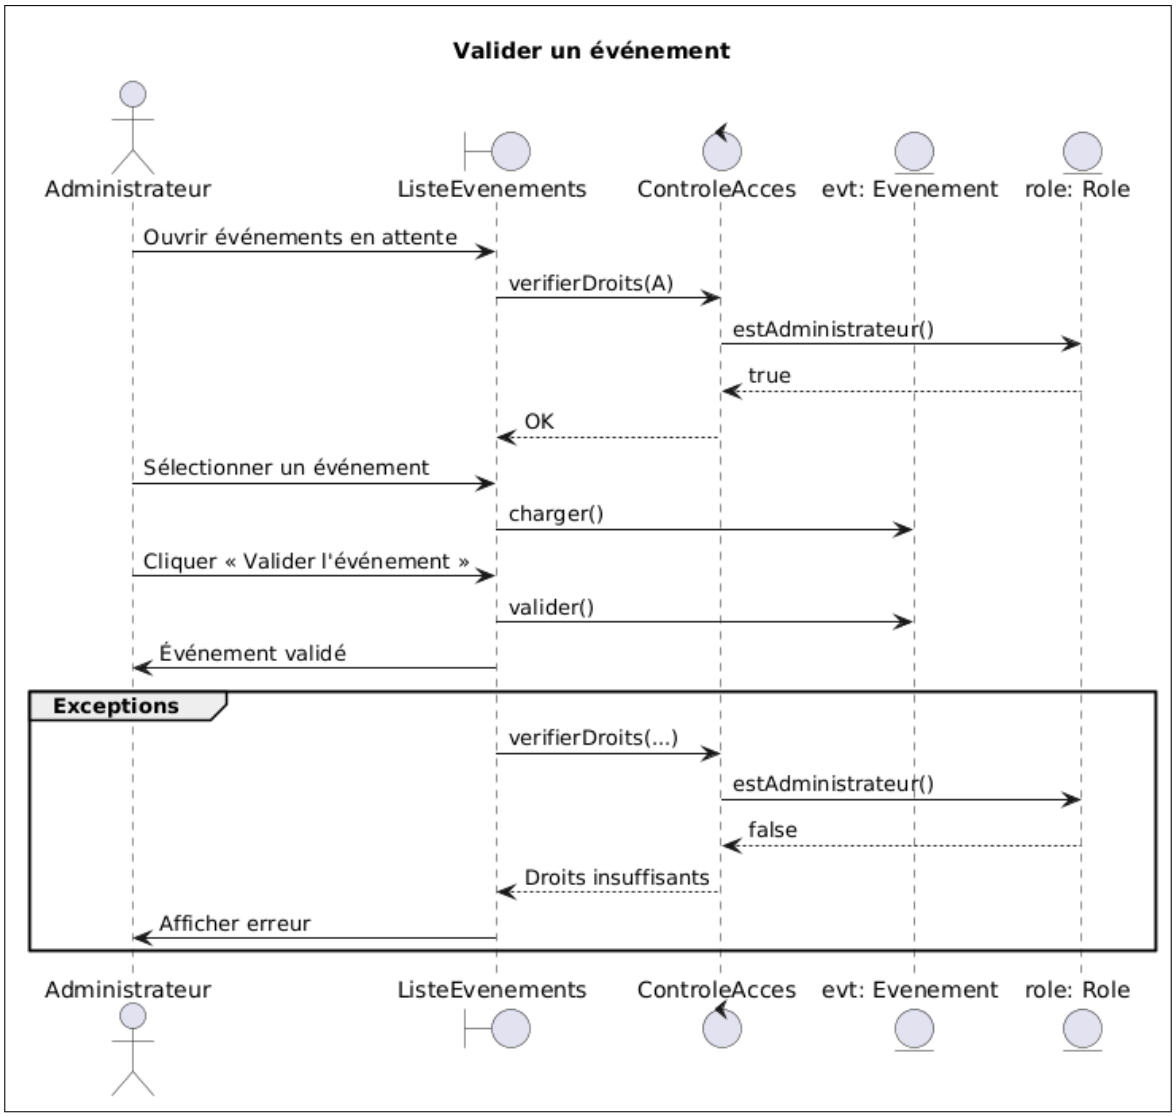



**Figure 75** – Diagramme de Séquence — *Valider un événement*

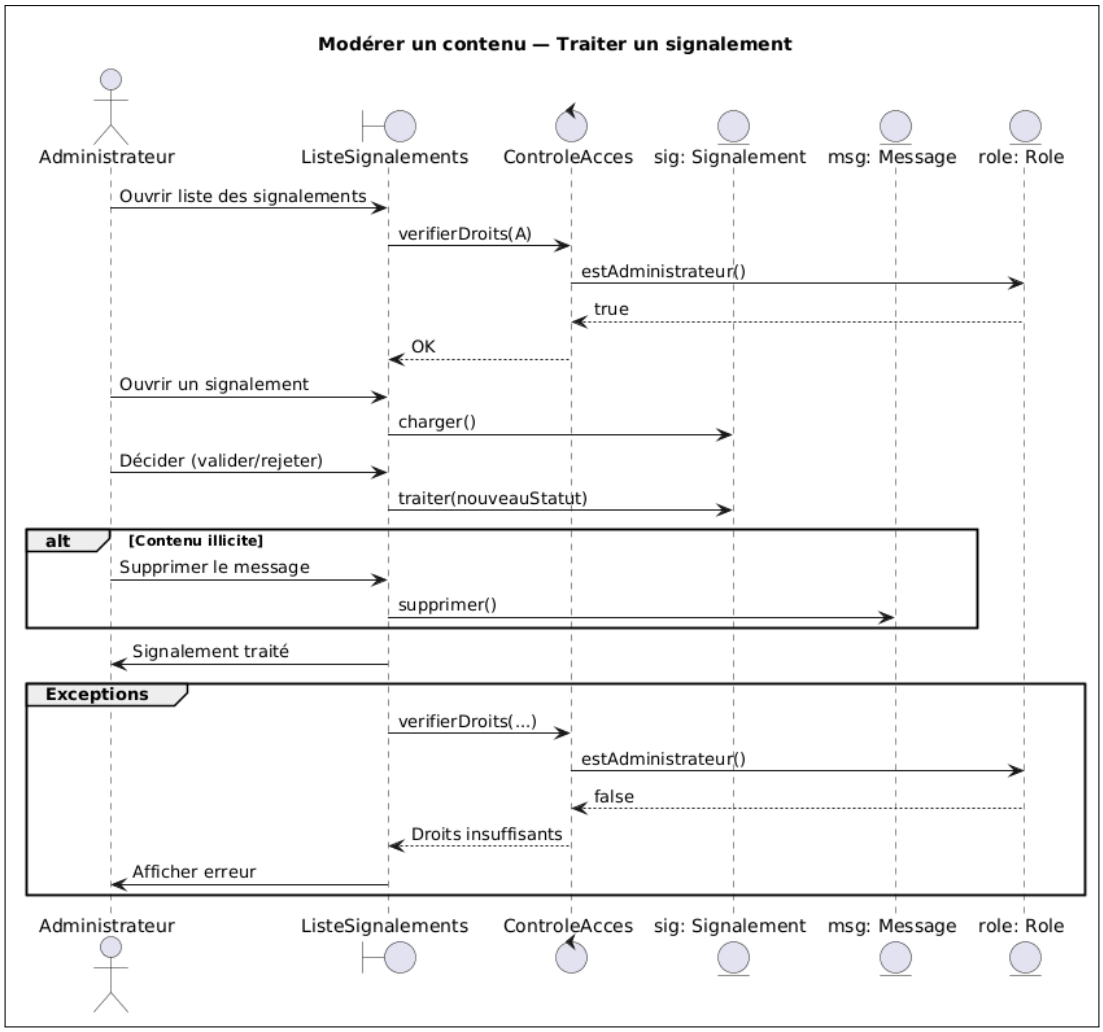



**FIGURE 76** – Diagramme de Séquence — *Modérer un contenu - Traiter un signalement*

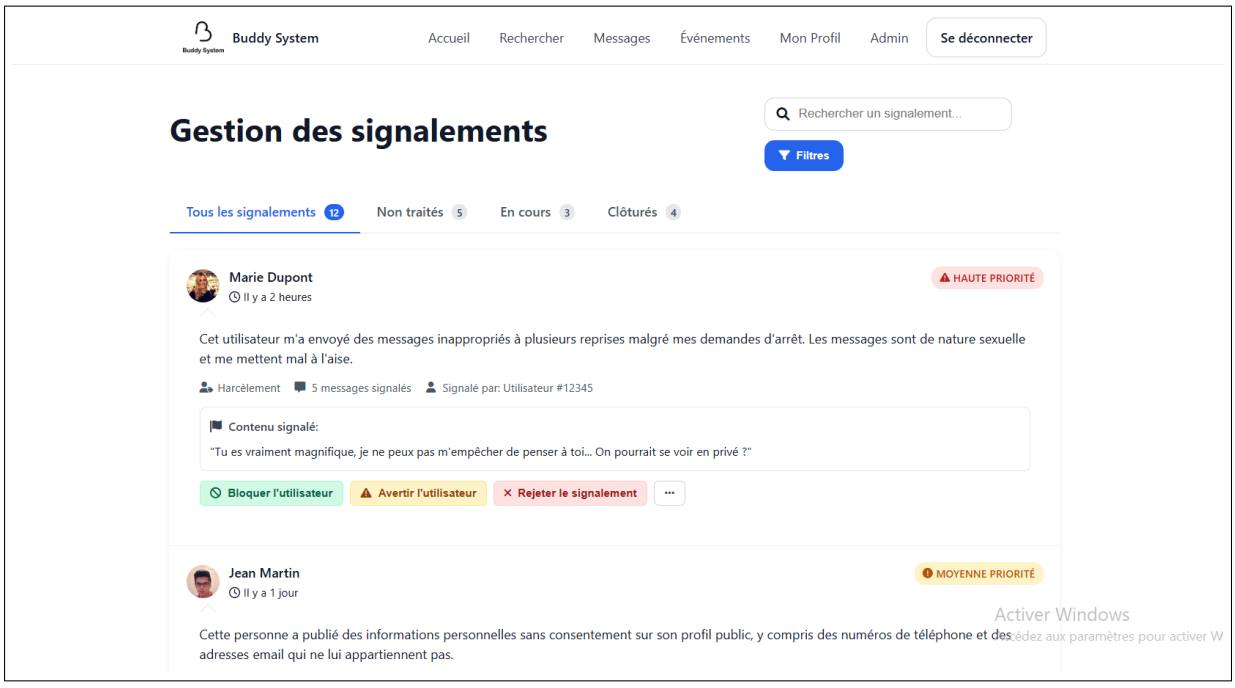



**FIGURE 77** – Maquette — *Page Admin - Liste des signalements*

## Bilan du Sprint 5

**Synthèse :**

Ce cinquième sprint a consolidé la *couche d'administration* : gestion des comptes (utilisateurs et rôles), modération des contenus signalés et validation des événements. Les scénarios et diagrammes de séquence produits décrivent clairement les workflows *suppression/désactivation de compte*, *validation d'événement* et *modération d'un message signalé*, tandis que le diagramme de classes a été ajusté pour refléter ces opérations côté modèle.

**Livrables produits :**

- Diagramme de classes **Sprint 5** (*diag_ classes_ sprint5.png*).
- Scénarios : *Supprimer / Désactiver un compte*, *Valider un événement*, *Modérer un message signalé*.
- Diagrammes de séquence : *Gérer comptes et rôles*, *Valider un événement*, *DSeq_ moderer_ message_*
- Maquettes IHM minimales : *Page Admin - Liste des comptes*, *Page Admin - Liste des signalements*.

**Points à préciser ultérieurement :**

- Politique exacte de *suppression* vs *désactivation* de compte (soft delete, réactivation).
- Règles de modération (niveaux de sanction, justification, traçabilité).
- Critères et états détaillés pour la validation d'événements (statuts, historique).

# Bilan général du projet

**Synthèse globale :**

Ce projet a été conduit en suivant la méthodologie *SCRUM*, organisée en cinq sprints successifs permettant d'étendre progressivement le périmètre fonctionnel du *Buddy System*. L'équipe a adopté un cycle court mêlant planification, mêlées quotidiennes, livrables intermédiaires et réajustements continus du modèle.

Chaque sprint a enrichi la modélisation et consolidé les fondations du système : gestion des comptes, relations, messagerie, événements puis administration avancée. Ce découpage itératif a permis de structurer clairement la progression, d'obtenir des versions stables du MCD/MPD/Diagrammes de classes à chaque étape, et de maintenir une cohérence globale du modèle.

**Organisation et collaboration :**

- Utilisation d'un tableau *MS Planner* pour organiser les tâches, suivre leur avancement et structurer les mêlées.
- Répartition régulière des responsabilités entre les membres afin d'assurer une charge équilibrée.
- Production systématique, à chaque sprint, de scénarios, diagrammes UML (séquences, classes), IHM minimales et validations croisées.
- Ajustements rapides grâce aux mêlées, permettant de résoudre les blocages et de maintenir le rythme.

**Livrables majeurs obtenus :**

- **Modélisation complète du système** : MCD final, MPD final, diagramme de classes consolidé.
- **Cas d'utilisation entièrement couverts** : authentification, relations, messagerie, signalement, événements, administration.
- **Scénarios et diagrammes de séquence** décrivant précisément les workflows critiques du système.
- **Maquettes IHM minimales** pour chaque module (connexion, messagerie, événements, administration).

**Apports de la démarche SCRUM :**

- Construction incrémentale du modèle, évitant les erreurs structurantes et favorisant la cohérence.
- Vision claire de l'avancement grâce aux mêlées et au Kanban.
- Adaptabilité lorsque certains besoins ont évolué.
- Meilleure maîtrise des dépendances fonctionnelles entre modules (relations → messagerie, messagerie → signalement, événements → administration).

**Axes de progression identifiés :**

- Approfondir certaines règles métiers (ex. modération avancée, gestion fine des statuts).

— Définir plus précisément les politiques d'administration (suppression / désactivation, historique des décisions).
— Prévoir un sprint dédié aux tests fonctionnels et aux validations d'interactions complexes.

Le projet se conclut avec une base solide, apte à servir de fondation au développement web et à la future implémentation logicielle.

# Annexes

**Modélisation du système — Version finale**

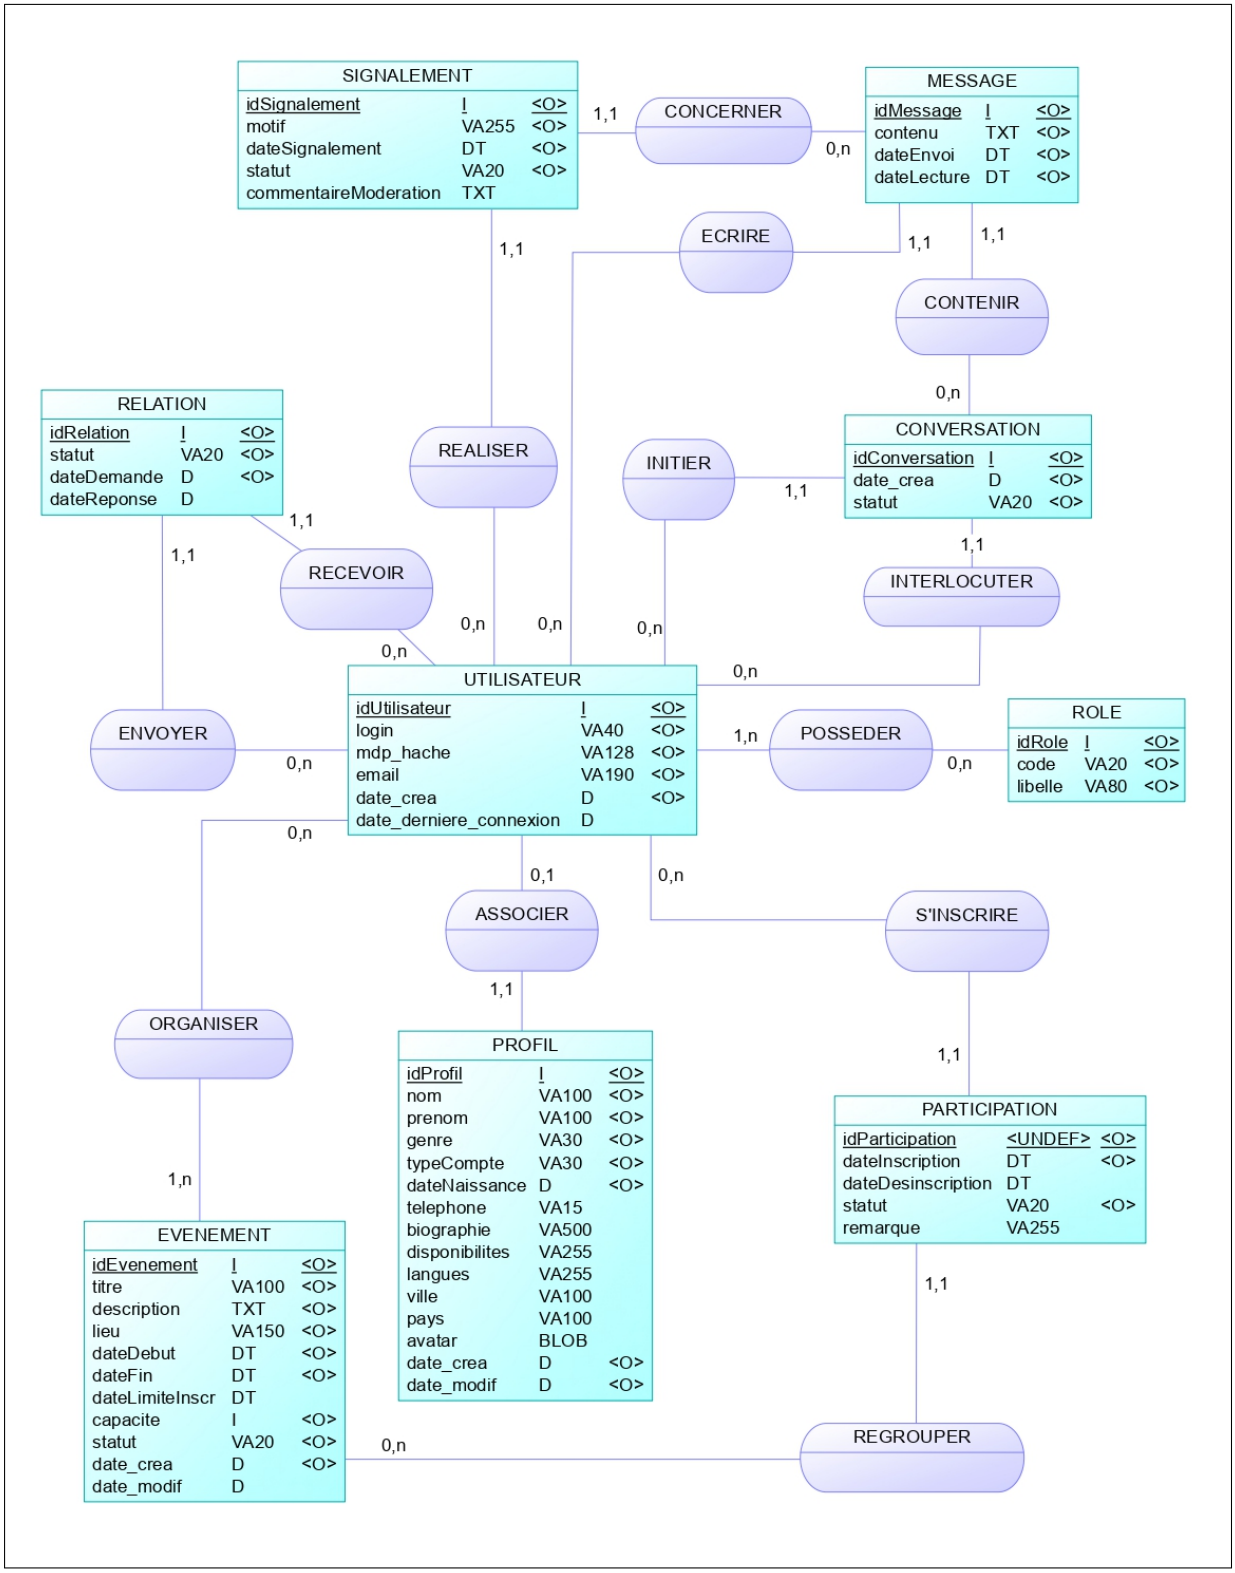



**Figure 78** – Version finale du MCD.

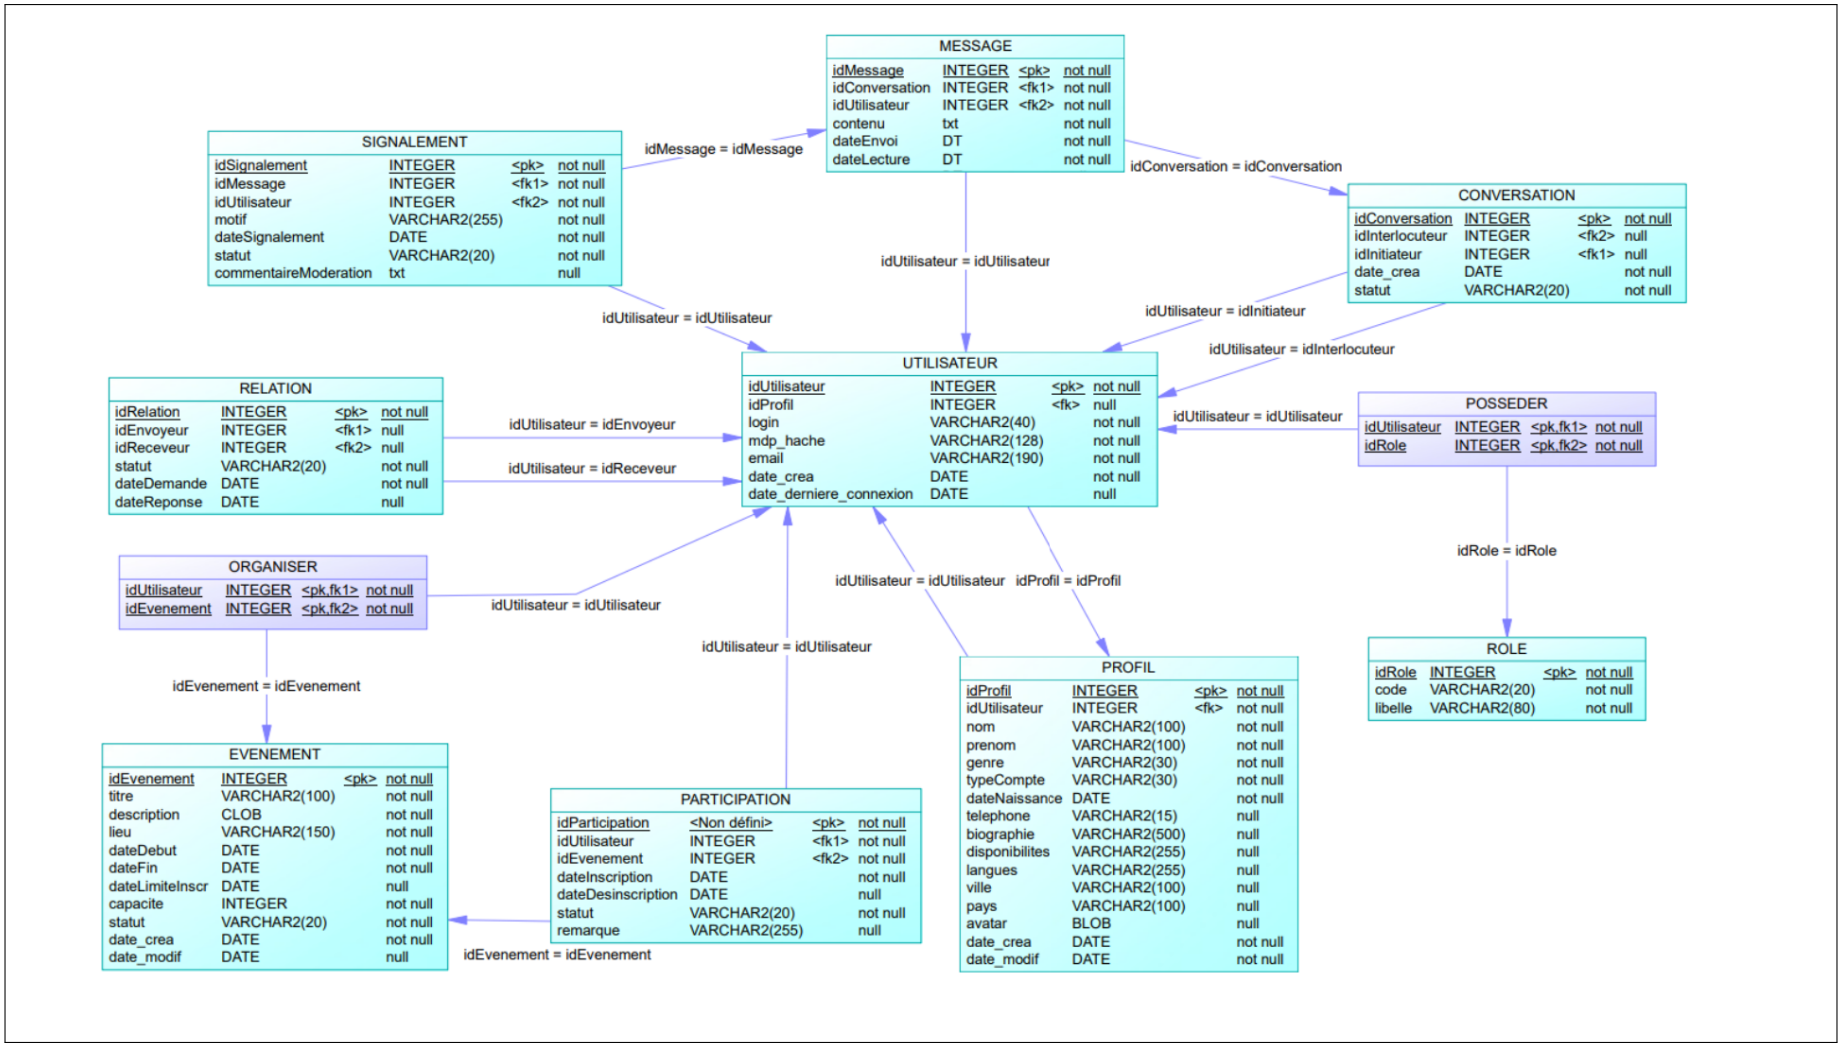



**Figure 79** – Version finale du MPD.

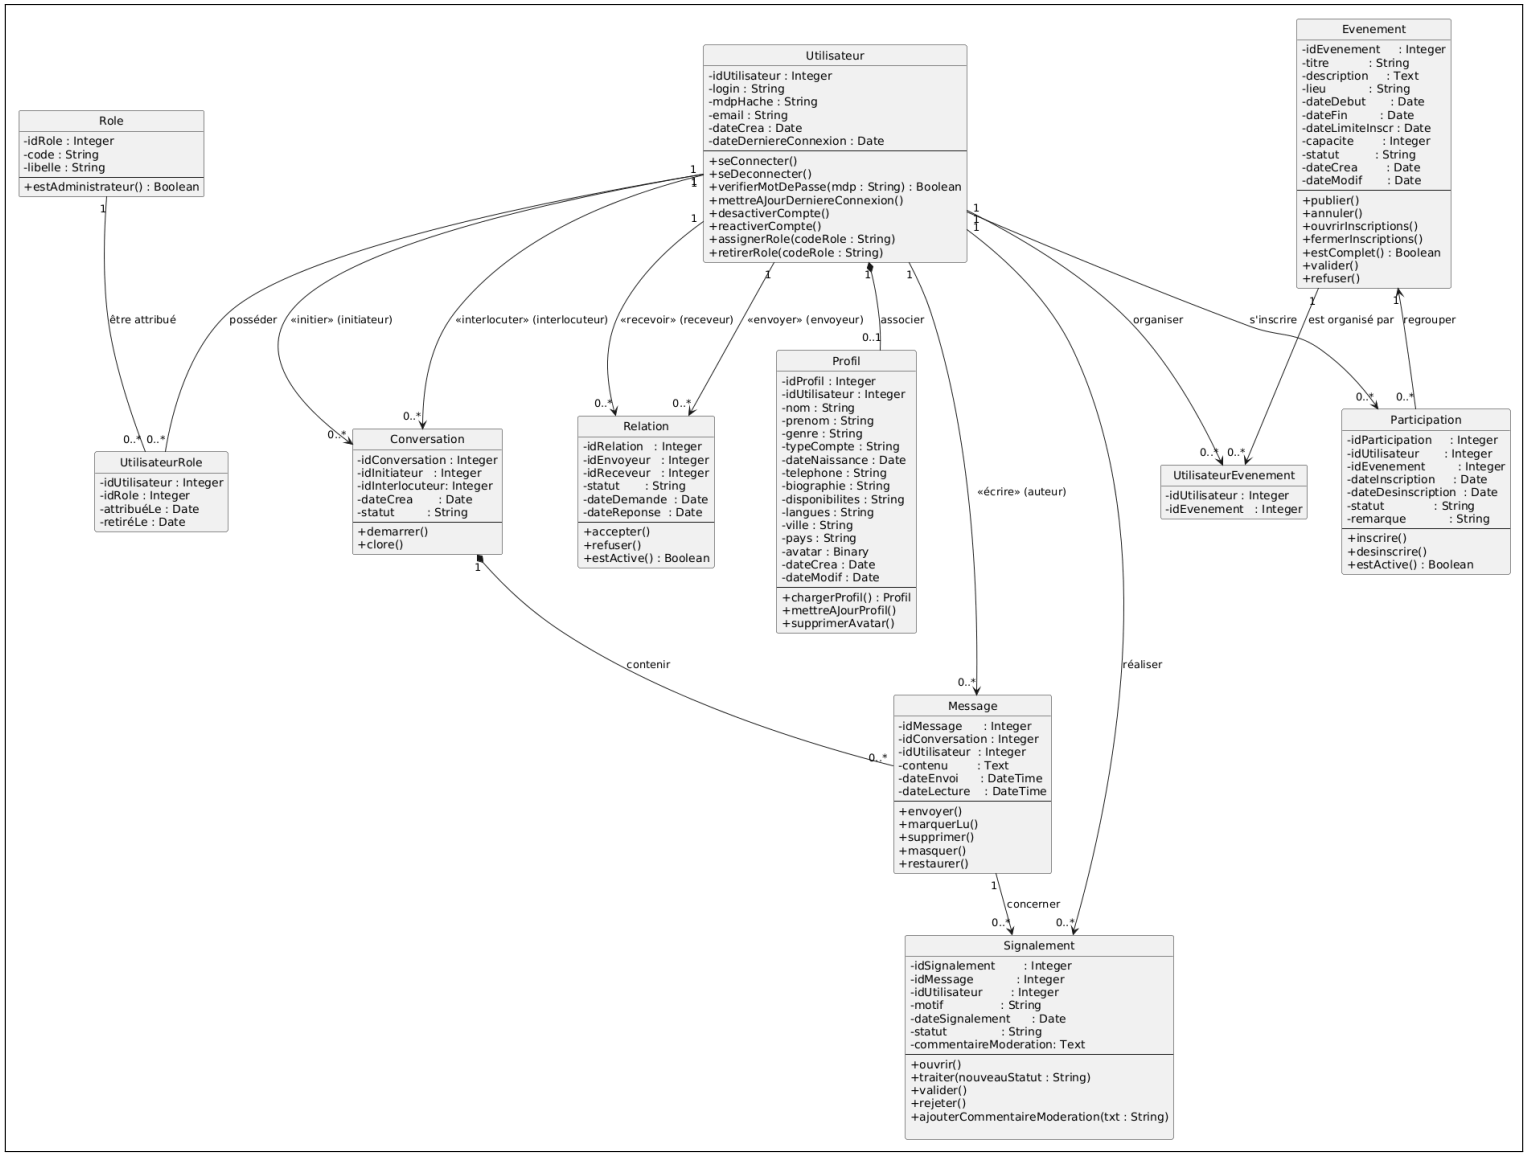



**Figure 80** – Version finale du Diagramme de classes

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

IUT REIMS | CHÂLONS CHARLEVILLE INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

# FIN DU DOCUMENT

## Pour toute question ou modification, veuillez contacter l'équipe de projet.


**AUTEURS :**
MATTEO GODART
AYOUB SEGHIR
SACHA DEUTSCHE
IYED BOUZENADA
YACINE MOUNSI


NOVEMBRE 2025
